



Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

I. Informacje wstępne

PROGRAM OPERACYJNY	Cel: KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar: POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania: 2007-2013
	Numer programu (CCD): 2007PL161PO012
	Nazwa programu: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013
SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Numer sprawozdania: I/2011/RPO/16
	Okres sprawozdawczy: 01.01.2011 – 30.06.2011

SPIS TREŚCI:

I. Informacje wstępne	1
<i>Spis tabel, wykresów i map</i>	<i>4</i>
II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem	7
<i>1. Realizacja i analiza postępów</i>	<i>7</i>
1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	7
1.2 Informacje finansowe	7
1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.....	10
1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów	10
1.5 Analiza jakościowa.....	11
<i>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi.....</i>	<i>88</i>
<i>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym</i>	<i>93</i>
3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu.....	93
3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych).....	95
3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach.....	96
3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	105
3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	105
<i>4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu ...</i>	<i>106</i>
4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych	106
4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej	107
<i>5. Informacja o realizacji dużych projektów.....</i>	<i>110</i>
<i>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.....</i>	<i>110</i>
<i>7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji</i>	<i>112</i>
<i>8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej.....</i>	<i>112</i>

Spis tabel, wykresów i map

- Tabela 1. *Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Załącznik nr I)*
- Tabela 2. *Informacja nt. zaliczek (w PLN)*
- Tabela 3. *Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu*
- Tabela 4. *Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od początku uruchomienia programu*
- Tabela 5. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 6. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu*
- Tabela 7. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu*
- Tabela 8. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 9. *Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w II półroczu 2011 r.*
- Tabela 10. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu*
- Tabela 11. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 12. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu*
- Tabela 13. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 14. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu*
- Tabela 15. *Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 16. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu*
- Tabela 17. *Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje w I półroczu 2011 r. i od uruchomienia Programu*
- Tabela 18. *Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu*
- Tabela 19. *Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 20. *Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 21. *Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 22. *Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 23. *Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym*
- Tabela 24. *Terminy i tematy omawiane podczas spotkań Zespołu Strategicznego RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2011 r.*
- Tabela 25. *Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)*
- Tabela 26. *Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)*

- Wykres 1. *Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2011 – 30.06.2011)*
- Wykres 2. *Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2011 – 30.06.2011)*
- Wykres 3. *Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2011 – 30.06.2011)*
- Wykres 4. *Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne*
- Wykres 5. *Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu*
- Wykres 6. *Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)*
- Wykres 7. *Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)*
- Wykres 8. *Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2011 – 30.06.2011)*
- Wykres 9. *Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2011 – 30.06.2011)*
- Wykres 10. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 11. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 12. *Procentowy udział podstawowych rodzajów działalności gospodarczej (w oparciu o klasyfikację PKD 2007) w wartości zakończonych projektów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1*
- Wykres 13. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 14. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 15. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 16. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 17. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 18. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 19. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 20. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 21. *Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 22. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 23. *Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów*
- Wykres 24. *Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej*
- Wykres 25. *Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny)*

- Mapa 1.* Zestawienie liczby i wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2011 r.
- Mapa 2.* Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2011 r.
- Schemat 1.* Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013

Załącznik I Tabela 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013

Załącznik II Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2011 r.

Tabela 3. Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu (w PLN)

Tabela 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Załącznik III Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji o informacji

Załącznik V Materiały informacyjno-promocyjne (płyta CD)

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki w sprawozdaniu przedstawiono zgodnie z zasadami zawartymi w *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 9 czerwca 2009 r.* Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO 2007-2013 oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013¹, zostały zaprezentowane w *Tabeli 1. Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013 (Załącznik nr I).*

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z Krajowego Systemu Informatycznego [KSI (SIMIK 07-13)]. Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w Lokalnym Systemie Informatycznym – SEZaM 2007-2013.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W związku z powyższym wszystkie wartości wskaźników, zarówno produktu jak i rezultatu, zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) do 30 czerwca 2011 r.² Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Obecnie we wszystkich Osiach priorytetowych rozpoczęła się realizacja wszystkich wskaźników założonych do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013, za wyjątkiem wskaźnika *Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy*, który zgodnie z decyzją IZ RPO WO 2007-2013 nie jest przewidziany do realizacji w bieżącej perspektywie finansowej (w RPO WO 2007-2013, który przekazany został do KE wskaźnik rekomendowany jest do usunięcia).

1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym w okresie sprawozdawczym oraz narastająco zostały zaprezentowane w tabelach finansowych (*Załącznik nr II*).

Dane zawarte w treści sprawozdania przedstawiono w zaokrągleniu do milionów złotych. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z IK RPO, wszelkich zaokrągleń (ogółem dla Programu oraz w ramach poszczególnych osi priorytetowych) dokonano tak, aby prezentowane kwoty były zgodne z tabelami finansowymi zawartymi w *Załączniku nr II* do sprawozdania oraz tabelami wygenerowanymi wg stanu na 30 czerwca 2011 r. z Oracle Discoverer. Innymi słowy, zaokrąglone wartości ogółem dla Programu wynikają bezpośrednio ze wspomnianych tabel finansowych a nie matematycznej sumy zaokrąglonych wartości poszczególnych osi.

Wykresy 1-3 przedstawiają postępowanie finansowe Programu w cyklu miesięcznym. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków po ocenie formalnej, projektów zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów, można zauważyć niewielki 3% wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec grudnia 2010 r.

W zakresie wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, wniosków zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów również można zauważyć niewielki wzrost w stosunku do wartości osiągniętych na koniec 2010 r. w wysokości 4-5%.


W przypadku wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą odnotowano największe przyrosty w stosunku do grudnia 2010 r. (odpowiednio 15% i 13%).

¹ Wersja 27 zatwierdzona *Uchwałą nr 614/2011* Zarządu Województwa Opolskiego z 26 kwietnia 2011 r.

² Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.


Województwo opolskie wg stanu na 30 czerwca 2011 r. zajmuje **pierwsze miejsce w kraju** pod względem poziomu wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, co przedstawia *Wykres 4*.

Wykres 1. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2011 – 30.06.2011)

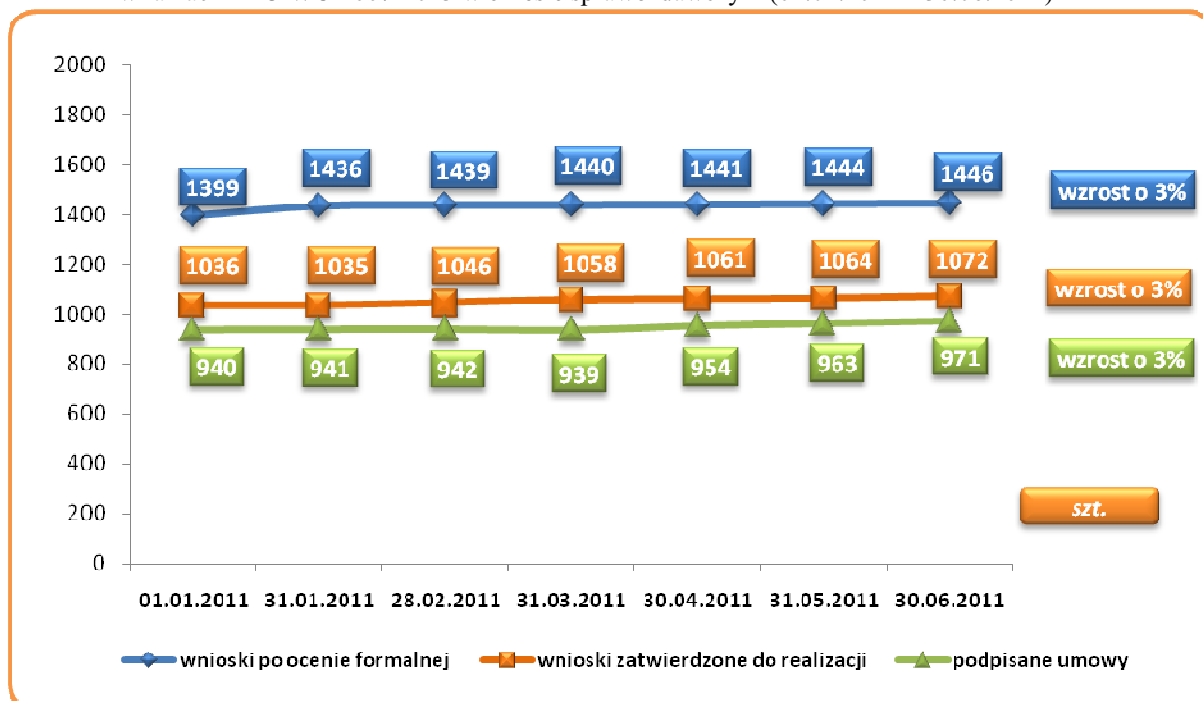


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 2. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01.2011 – 30.06.2011)

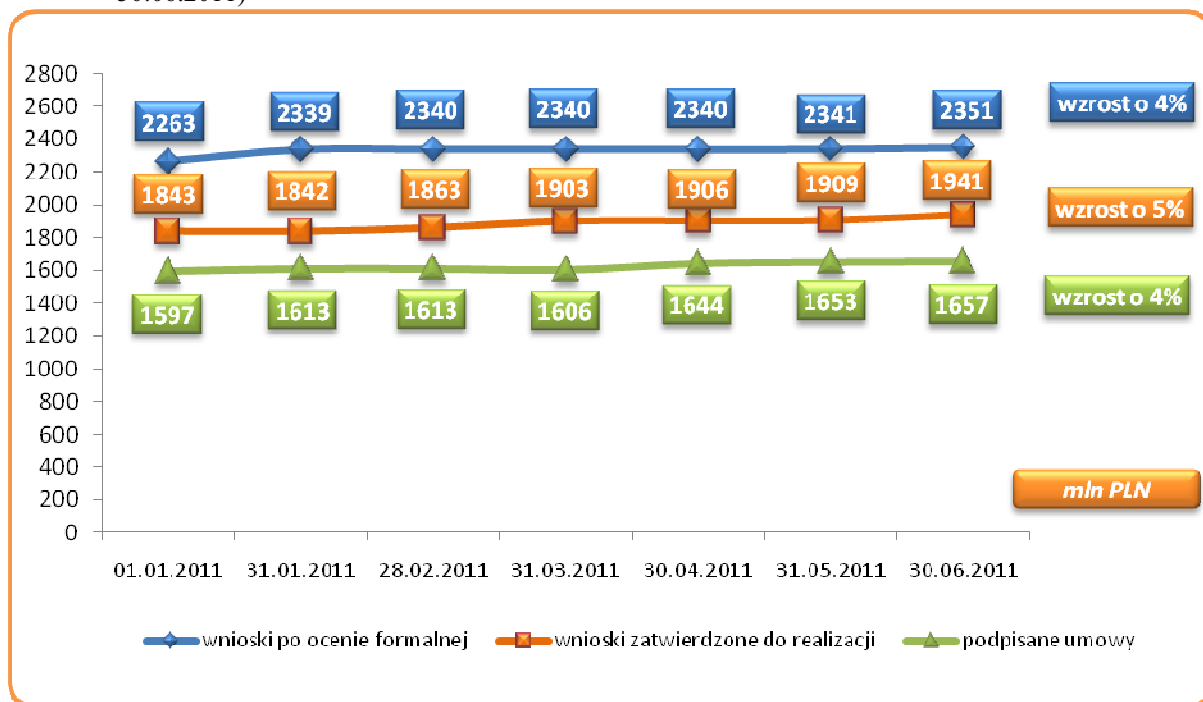


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 3. Wzrost wartości wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność oraz środków zatwierdzonych przez Instytucję Certyfikującą (01.01.2011 – 30.06.2011)

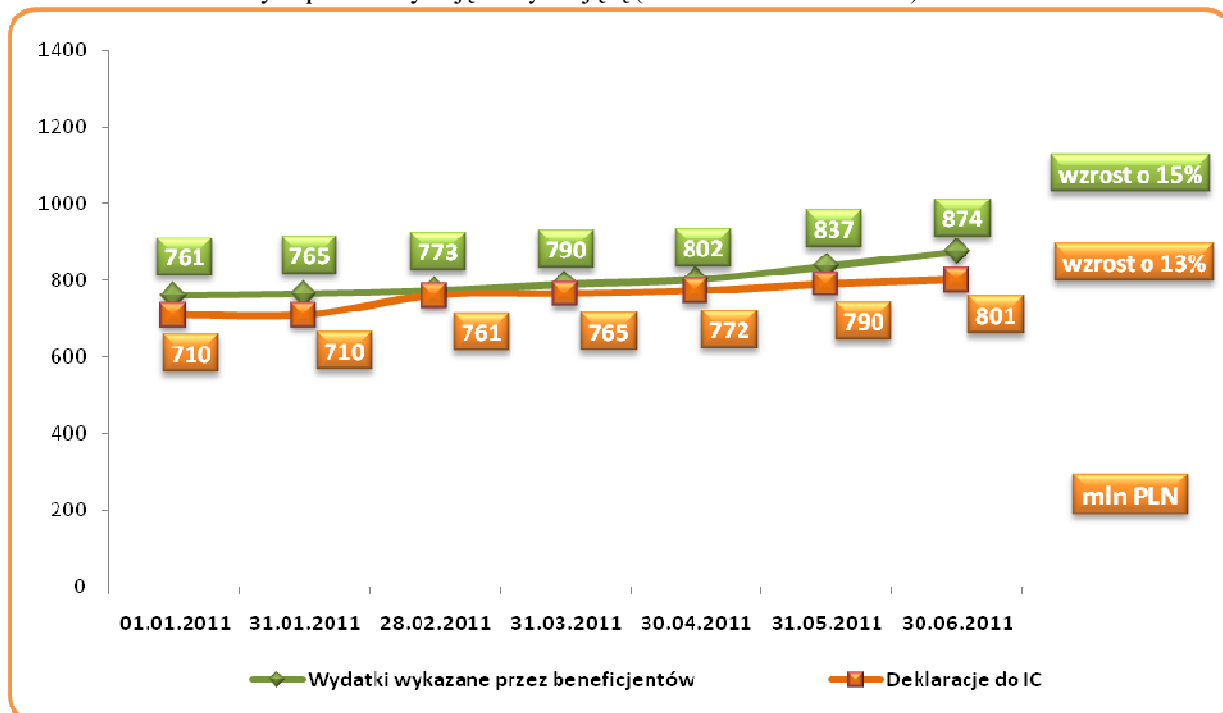

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 4. Poziom certyfikacji wydatków do KE w podziale na poszczególne regionalne programy operacyjne

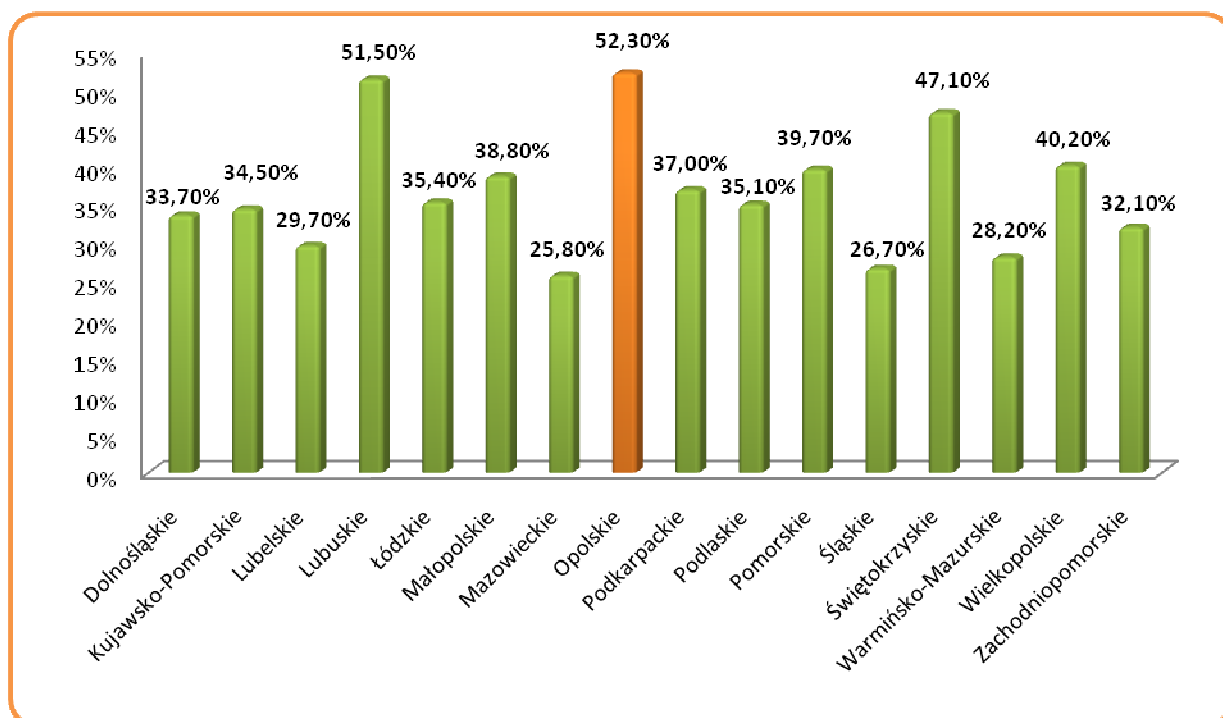

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z raportu MRR „Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na dzień 30.06.2011”.

1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Kwota odsetek narosłych od środków dotacji rozwojowej, przekazanej przez IZ RPO WO 2007-2013 od początku realizacji programu wynosi 401 874,81 PLN, a w okresie sprawozdawczym 0 PLN.

1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Informacje nt. zaliczek przekazanych i rozliczonych przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym i od uruchomienia programu przedstawia *Tabela 2*.

Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w PLN)

Oś Priorytetowa	Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów		Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje	
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Oś Priorytetowa 1	1 730 984,68	16 910 213,10	1 013 672,50	15 179 228,42
Oś Priorytetowa 2	4 076 784,74	9 379 421,74	157 023,76	5 459 660,76
Oś Priorytetowa 3	33 040 846,00	225 519 762,39	14 722 559,28	206 998 625,34
Oś Priorytetowa 4	10 336 383,33	26 745 449,03	6 403 394,28	22 800 406,75
Oś Priorytetowa 5	716 202,71	42 746 476,87	1 185 747,90	42 426 236,46
Oś Priorytetowa 6	272 963,81	5 827 966,03	0,00	5 555 002,22
Oś Priorytetowa 7	0,00	11 974 969,27	1 387 530,24	11 974 969,27
OGÓLEM	50 174 165,27	339 104 258,43	24 869 927,96	310 394 129,22

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz Ewidencji płatności i zwrotów IZ RPO WO 2007-2013.

- 1) Informacja na temat zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów została sporządzona w oparciu o dane zawarte w KSI (SIMIK 07-13) oraz dodatkowo została uzupełniona o dane zarejestrowane w Ewidencji płatności i zwrotów prowadzonej przez IZ RPO WO 2007-2013.
- 2) Kolumna nr 2 i 3 stanowi kwotę przekazanych zaliczek na rzecz beneficjentów, pomniejszoną o zwrot niewykorzystanych środków przez beneficjentów z przekazanej zaliczki (rzeczywista kwota jaką beneficjent wykorzystał w ramach przekazanej płatności zaliczkowej).
- 3) Różnica pomiędzy kolumną 3 i 5 stanowi rzeczywistą kwotę płatności przekazanych w formie zaliczki pozostającą do rozliczenia.

1.5 Analiza jakościowa

I. Informacje nt. wdrażania RPO WO 2007-2013

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

⇒ do końca czerwca 2011 r. przeprowadzono łącznie **60 naborów wniosków**, w tym: **45 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **15 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,

⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła **444,78 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi prawie **99,8%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na osie priorytetowe przedstawiono w *Tabeli 3*. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 3. Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	konkursowe	IPI	konkursowe	IPI
			EFRR + BP	EFRR + BP
Oś Priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	19	5	166,45	14,93
Oś Priorytetowa 2 <i>Spółeczeństwo informacyjne</i>	2	0	27,84	0,00
Oś Priorytetowa 3 <i>Transport</i>	8	5	56,30	53,76
Oś Priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	6	2	37,74	7,15
Oś Priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	7	2	33,41	9,30
Oś Priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	3	1	33,44	4,46
SUMA NABORÓW	45	15	355,18	89,60
	Σ = 60 naborów		Σ = 444,78 mln Euro	

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 24 maja 2011 r.*

Wnioski złożone

⇒ złożono **2 058 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,

⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **5 279,44 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2 866,28 mln PLN**,

⇒ z największym zainteresowaniem beneficjentów spotkał się IV nabór w ramach poddziałania 3.1.1 oraz II w ramach poddziałania 1.4.1 (ponad 5-krotne przekroczenie alokacji),

⇒ z najmniejszym zainteresowaniem beneficjentów spotkał się natomiast I nabór w ramach poddziałania 1.3.1 (wnioskowana wartość dofinansowania w 1/5 wykorzystana dostępną alokacją),

- ⇒ najwięcej wniosków złożono w IV naborze w ramach poddziałania 1.1.2 – **340**; natomiast najmniej w I naborze w ramach działania 1.2 – **1**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 446 wniosków** na kwotę dofinansowania z EFRR **2 351,22 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji **1 072 projektów** o całkowitej wartości **3 525,15 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **1 940,94 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **971 umów** na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła **3 033,57 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **1 657,43 mln PLN**,
- ⇒ **953** umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **18** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
- ⇒ **680 umów** o wartości dofinansowania z EFRR **680,66 mln PLN** realizuje cele prolizbońskie (**96%** środków przeznaczonych na realizację SL),
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł około **97%**,
- ⇒ nadkontraktacja, wynikająca ze zmieniającego się kursu Euro oraz różnic kursowych wystąpiła w ramach Osi 5 (100,45%). Ponadto wysoki poziom zakontraktowania został osiągnięty w Osi 2 (99,8%) oraz Osi 3 (99,77%).

Wnioski o płatność


- ⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność wyniosły **873,95 mln PLN** (EFRR), co stanowi ponad **51%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 5, Osi 3, Osi 7 oraz Osi 1. Wartość przedmiotowych wydatków osiągnęła poziom odpowiednio **74%**, **66%**, **52%** oraz **49%** zobowiązań na lata 2007-2013.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **801,30 mln PLN**, co stanowi około **47%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Poziom wykorzystania alokacji w ramach wniosków poprawnych pod względem formalnym, podpisanych umów o dofinansowanie oraz wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono na *Wykresie 5*.

Wykres 5. Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

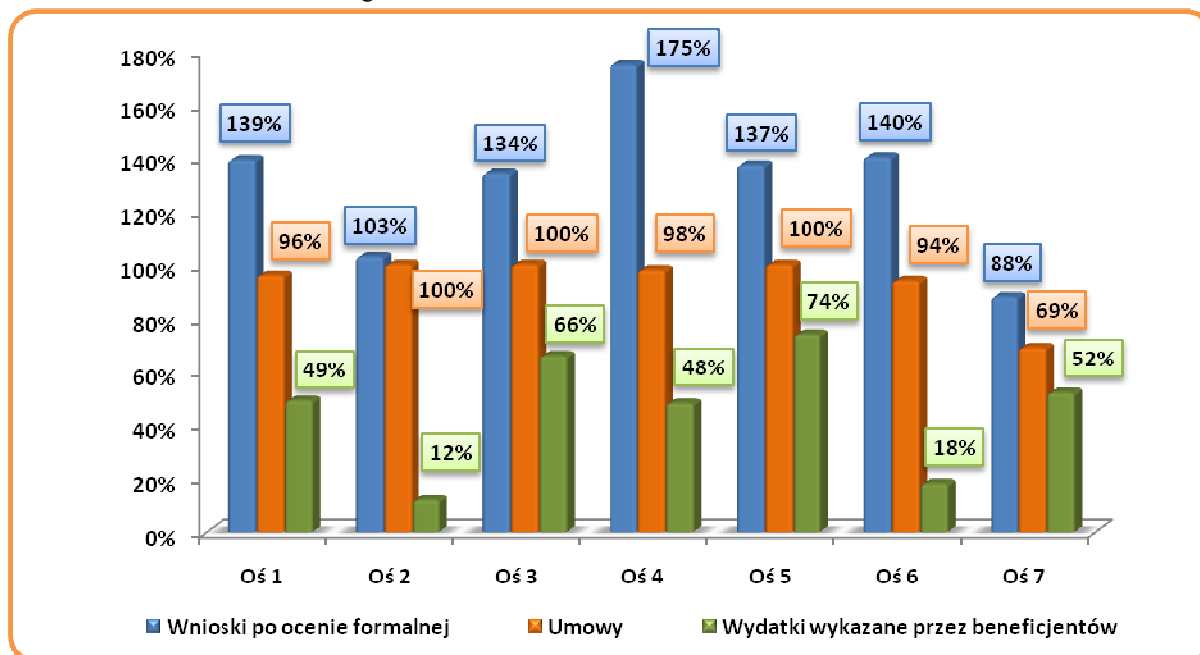

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania jest Oś priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji przekroczył **100%**, zaś poziom płatności wynosi ponad **74%**. Ponadto, w ramach podpisanych **103 umów**, zakończyła się realizacja **70 projektów**.

W najmniejszym stopniu zaawansowane pod względem kontraktacji jest wdrażanie Osi priorytetowej 7, gdzie wartość podpisanych umów stanowi około **69%** alokacji zapisanej w Programie na ww. Oś. Ma to związek przede wszystkim ze specyfiką Osi, w ramach której do końca okresu programowania muszą być zapewnione środki na wsparcie kadrowe IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia oraz wzmocnienie organizacyjno-techniczne procesu wdrażania Programu. W pozostałych osiach pozostały do podpisania pojedyncze umowy.

Pod względem płatności najmniej wniosków zostało zatwierdzonych w ramach Osi priorytetowej 2 (niewiele ponad **12 %** alokacji) oraz Osi priorytetowej 6 (**18%**), co wynika z faktu, że realizacja wielu projektów dopiero się rozpoczyna (większość umów w ramach II naboru do działania 6.1 podpisana była dopiero w okresie sprawozdawczym). W pozostałych osiach poziom płatności oscyluje wokół **50%**, za wyjątkiem Osi 3 i 5, gdzie wynosi odpowiednio **66%** i **74%**.

Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały **samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 501 mln PLN)**, **samorząd województwa (blisko 401 mln PLN)**, **przedsiębiorcy (około 393 mln PLN)** oraz **samorządy powiatowe i ich jednostki organizacyjne (ponad 109 mln PLN)**.


Średnia wartość dofinansowania EFRR w ramach podpisanych umów przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła ponad **1 577 PLN**. Pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu najwyższe wartości uzyskało **Miasto Opole** oraz powiaty: **strzelecki, oleski i kluczborski** (powyżej 1000 PLN na mieszkańca).

Beneficjenci mający siedzibę na terenie 3 gmin: Łambinowic, Skoroszyce i Świerczowa nie realizują żadnych projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: **Opole, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Brzeg, Zawadzkie, Kluczbork, Olesno i Głubczyce**. Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: **nyski, namysłowski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski** oraz **opolski**.

Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 6.

Wykres 6. Procentowy udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych z EFRR (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)

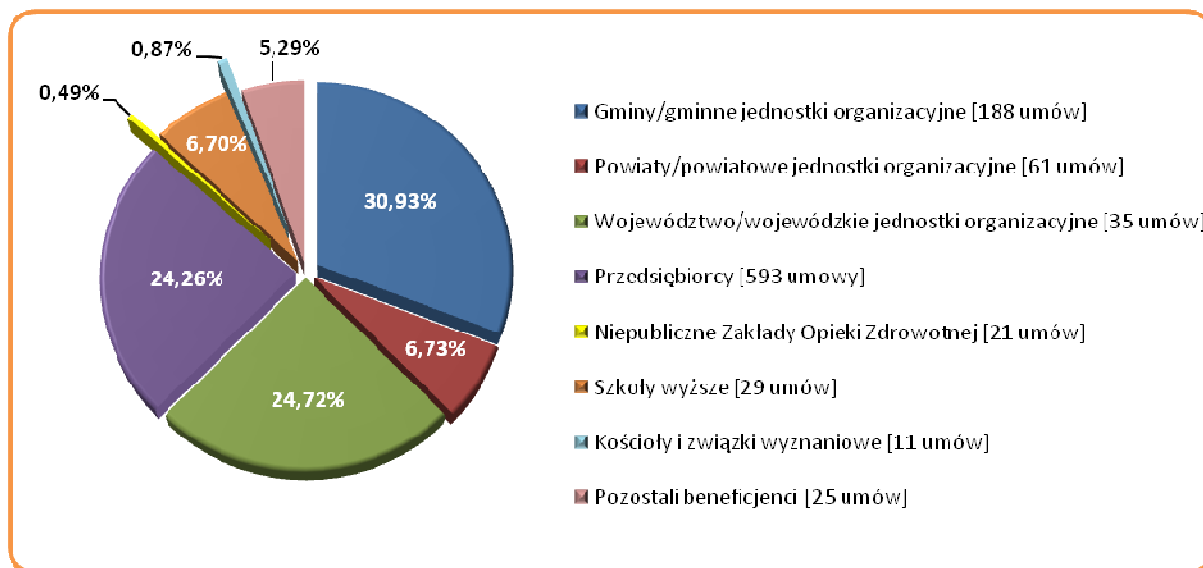


Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Biorąc pod uwagę zakontraktowanie środków RPO WO 2007-2013 w podziale na obszary wsparcia zauważyć można, iż najwięcej środków przeznaczono na **inwestycje z zakresu transportu** (443,05 mln PLN); **turystykę** (219,12 mln PLN), **przedsiębiorczość** (205,48 mln PLN), oraz **innowacje, badania i rozwój technologiczny** (185,04 mln PLN).

Dane dotyczące zakontraktowania środków w podziale na obszary wsparcia przedstawia Wykres 7. Na Mapie 1 i 2 przedstawiono natomiast zestawienie wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego oraz na wybrane obszary wsparcia.


Wykres 7. Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów pomocy technicznej)

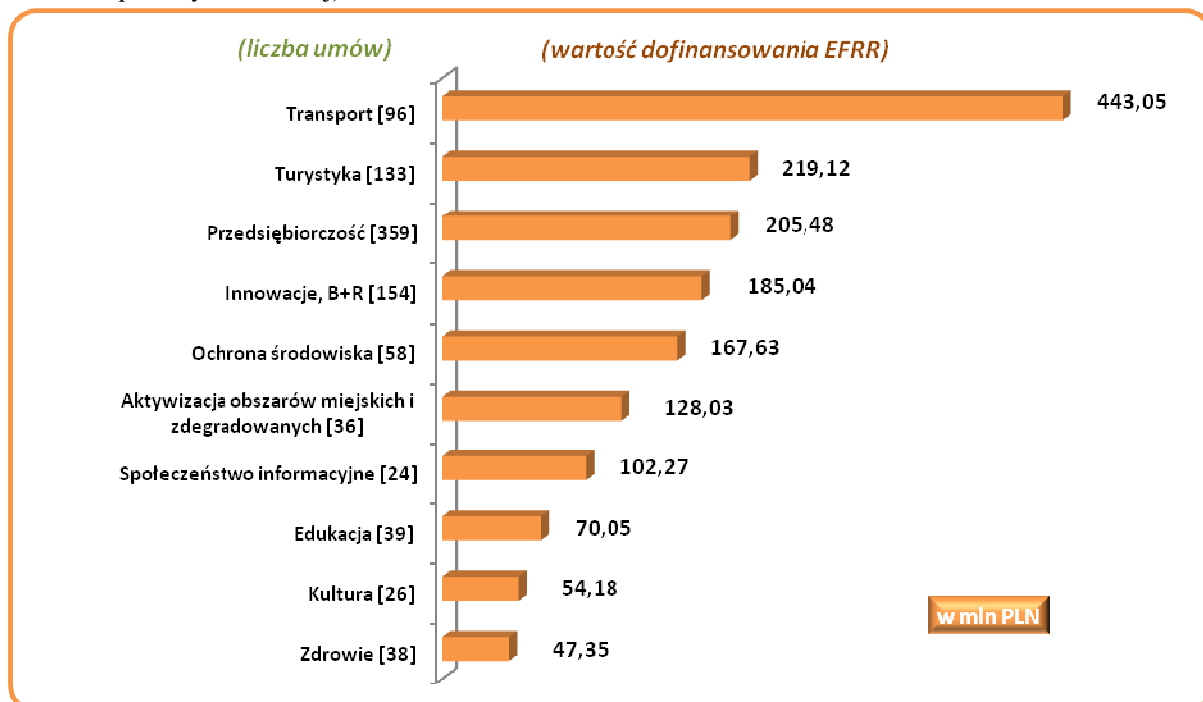

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Szczegółowe informacje na temat wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie II sprawozdania.

Mapa 1. Zestawienie liczby i wartości podpisanych umów (dofinansowanie z EFRR) w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2011 r.

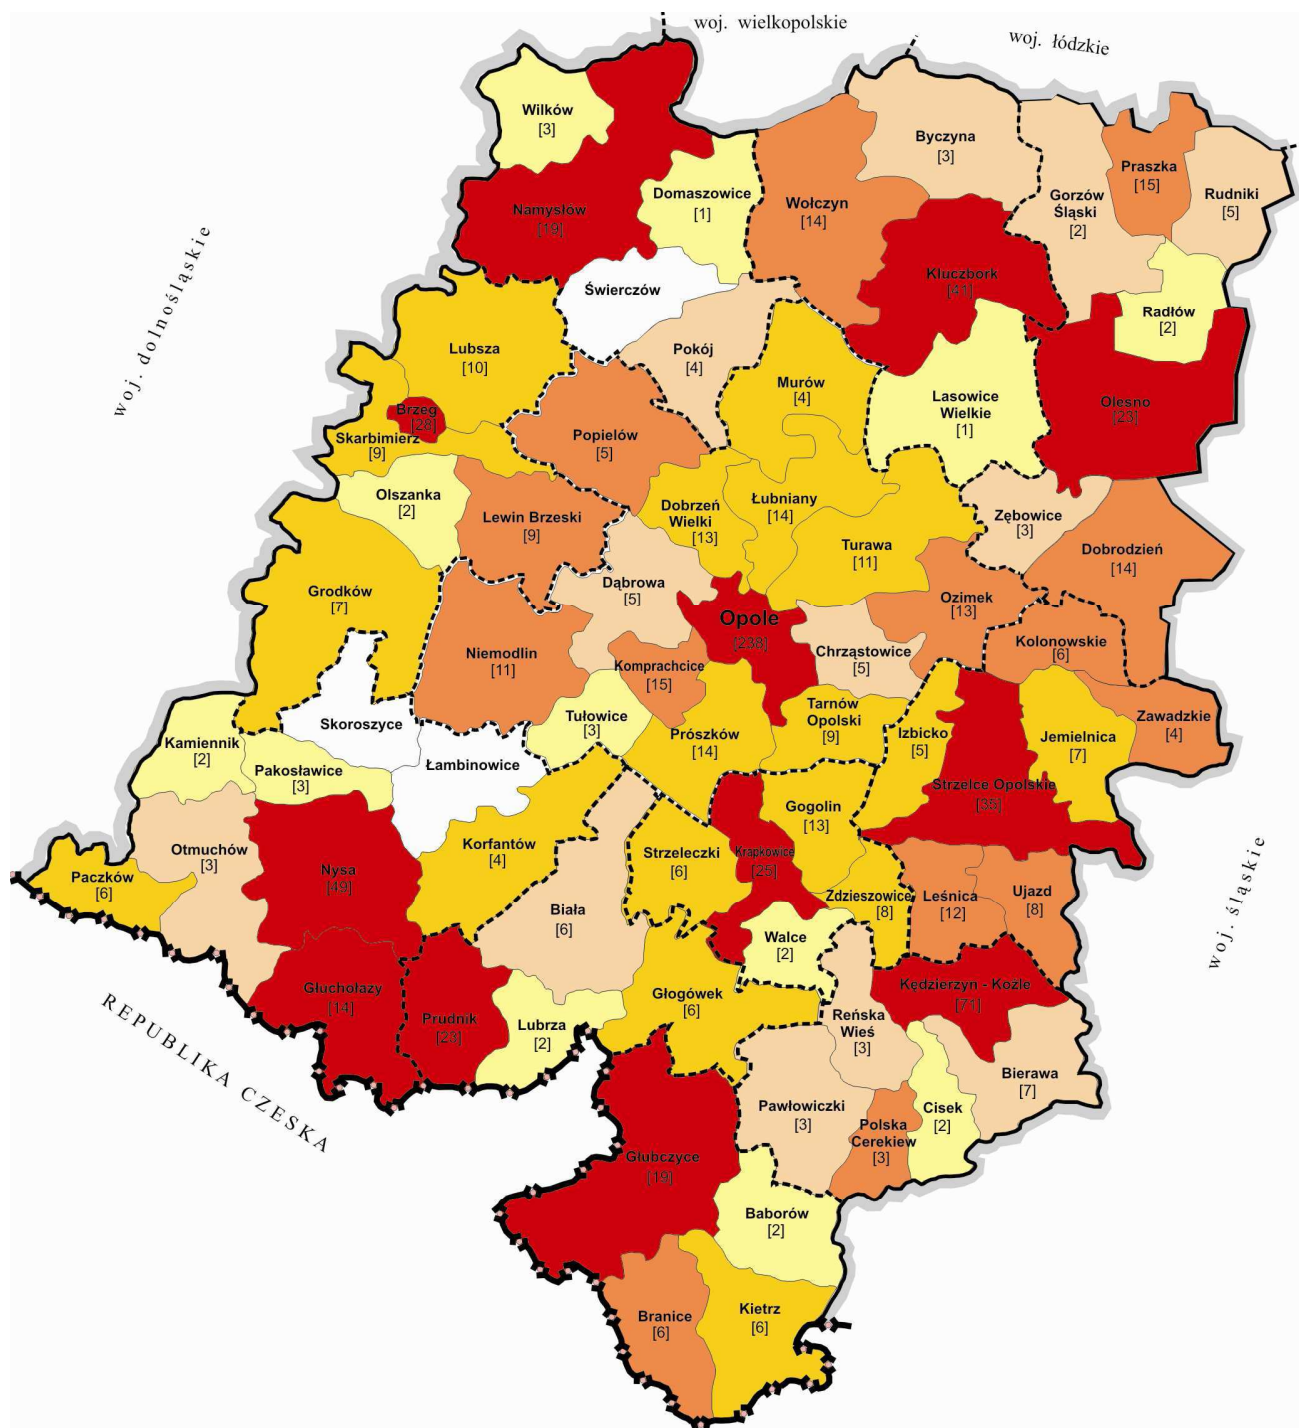

Legenda

- Powyżej 20 mln PLN
- Od 10 mln do 20 mln PLN
- Od 5 mln do 10 mln PLN
- Od 2 mln do 5 mln PLN
- Do 2 mln PLN
- Brak umów o dofinansowanie


SPOZA WOJEWÓDZTWA

LICZBA UMÓW 17

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE 37 822 120,60

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Mapa 2. Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta – stan na 30 czerwca 2011 r.

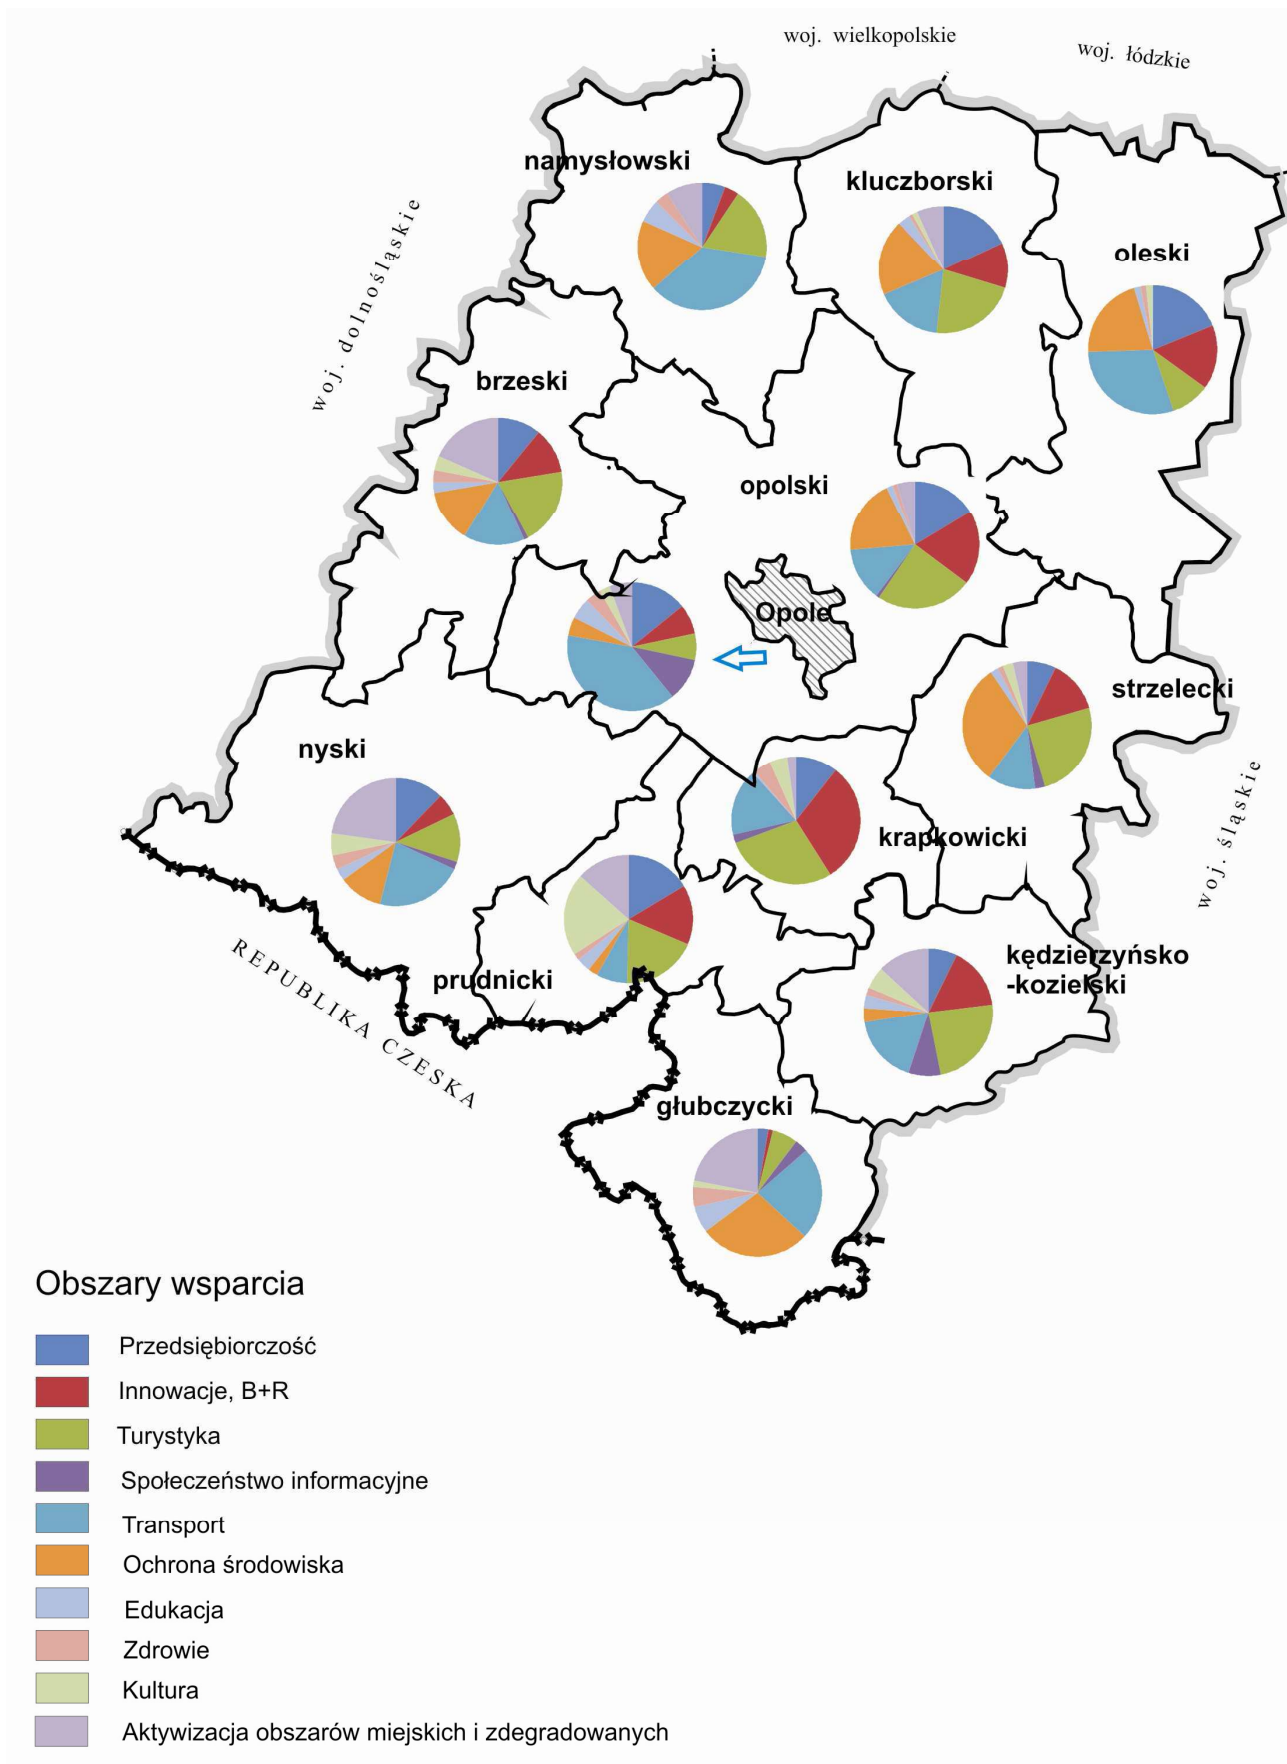

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na nabór wyniosła **0,1 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **3 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **1,01 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **0,78 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **47 wniosków** o całkowitej wartości **135,73 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **88,27 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego zaakceptowanych do realizacji zostało **37 projektów** o całkowitej wartości **156,99 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **98,55 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **44 umowy** o całkowitej wartości **153,44 mln PLN**, w tym kwota dofinansowania z EFRR **82,55 mln PLN**³,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **13 umów** o całkowitej wartości **29,67 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **11,71 mln PLN** w ramach:
 - poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* (1 umowa),
 - poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* (6 umów),
 - poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* (2 umowy),
 - poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* (2 umowy),
 - poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* (1 umowa),
 - działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* (1 umowa).

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **113,04 mln PLN**, co stanowi blisko **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.


Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **91,64 mln PLN**, co stanowi około **5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.

Postęp realizacji Programu w cyklu kwartalnym w I półroczu 2011 r. przedstawiono na *Wykresach 8-9*.


³ W ramach podpisanych umów w okresie sprawozdawczym nie ujęto umowy RPOP.01.01.02-16-240/09-01 (wygenerowała się w raporcie Oracle Discoverer jako podpisana w okresie sprawozdawczym, jednak w rzeczywistości została podpisana w czerwcu 2010 r.)

Wykres 8. Wzrost ilości wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2011 – 30.06.2011)

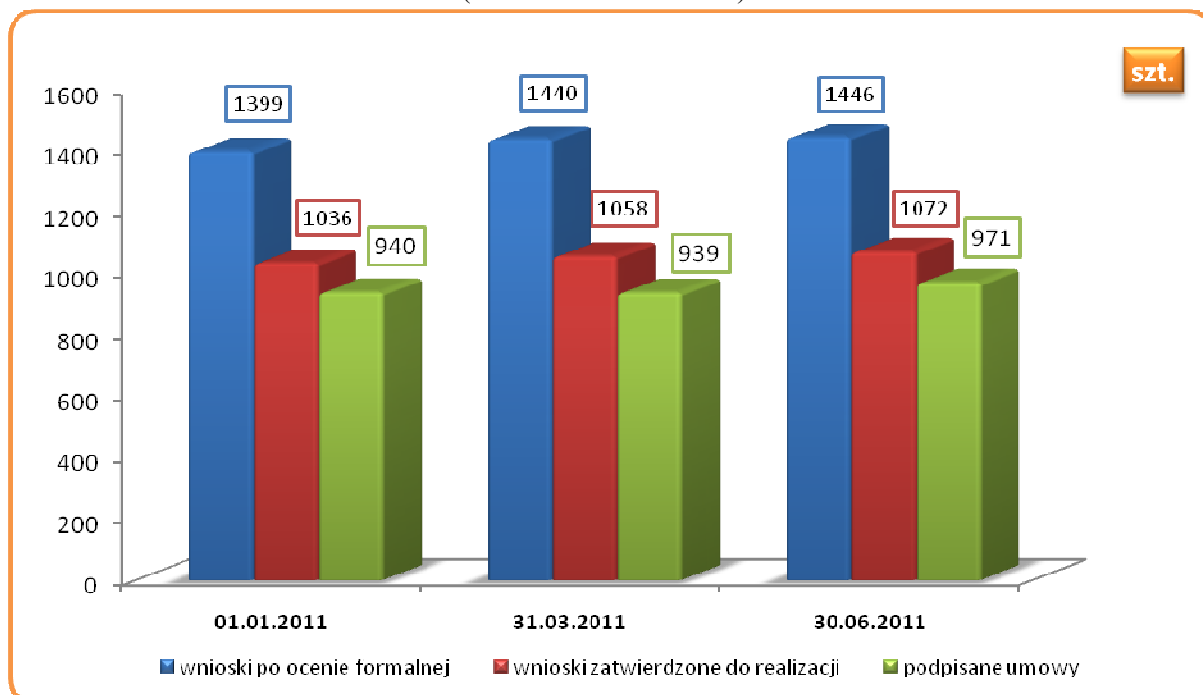

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wykres 9. Wzrost wartości dofinansowania z EFRR wniosków po ocenie formalnej, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 (01.01.2011 – 30.06.2011)

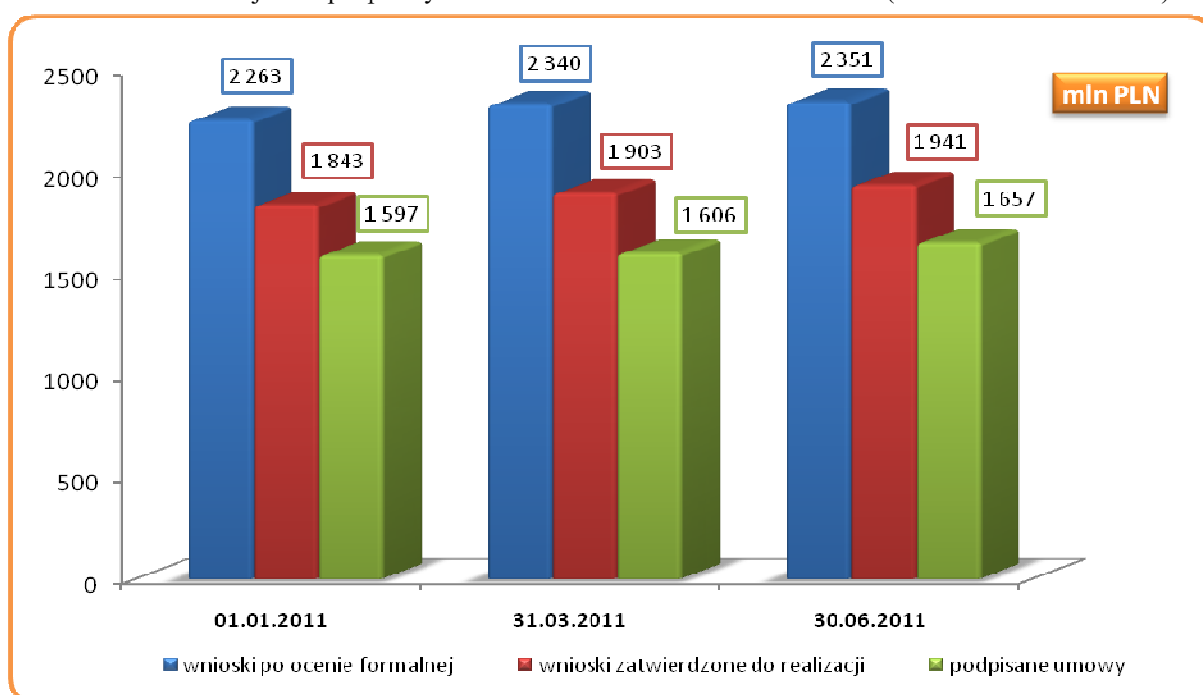

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Indywidualne projekty kluczowe

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.* na realizację **20 projektów** umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013* przeznaczono kwotę **89,08 mln Euro** z EFRR, tj. prawie **21%** alokacji przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.

Od uruchomienia programu podpisano/podjęto **18 umów/decyzji** na realizację projektów kluczowych. Ich całkowita wartość to **565,52 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi **356,83 mln PLN**, co stanowi blisko **22%** wszystkich środków zakontraktowanych w ramach Programu.

Beneficjenci indywidualnych projektów kluczowych wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **245,49 mln PLN**, co stanowi ponad **28%** wartości wszystkich wniosków o płatność.

W okresie sprawozdawczym podjęto **decyzję o dofinansowaniu** projektu kluczowego *Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* o łącznej wartości **43,14 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **15,12 mln PLN**.

Tabela 4. Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od początku uruchomienia programu

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu	11,56
2.		Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich	4,92
3.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	9,12
4.		Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi	9,74
5.		Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	15,12
6.	3.1.1 Drogi regionalne	Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul.Reymonta w Opolu	35,83
7.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – Smolarnia	8,40
8.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	32,45
9.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia – Krobusz w km 24+565 – 35+760	27,90
10.		Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17	37,41
11.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap II	21,67
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakosławice Etap I	28,04
13.	3.2 Transport publiczny	Zakup pojazdów szynowych	31,21
14.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie	19,0
15.		Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7	9,50
16.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48	10,61

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
17.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	26,15
18.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF	18,20
RAZEM			356,83

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 24 maja 2011 r.

W kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowano złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla projektu kluczowego pt. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików* realizowanego w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*.

II. Opis postępów w realizacji poszczególnych Osi priorytetowych

OŚ PRIORYTETOWA 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy,
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości,
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia. Od początku uruchomienia Programu IP II stopnia wdrażała Oś 1 z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W lipcu 2009 r.⁴ wdrażanie dwóch poddziałań tj. 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* zostało przekazane z IP II stopnia do Instytucji Zarządzającej Programem.

Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono **158 043 580,81 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **37%** alokacji na Program z EFRR.

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową), działalność okołobiznesową oraz podmioty sektora B+R.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 1.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **19 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **5 projektów kluczowych** w ramach poddziałań 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **181,38 mln Euro**, w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej **166,45 mln Euro**, na nabory w ramach procedury pozakonkursowej **14,93 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **1 592 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **3 023,75 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR **1 282,51 mln PLN**,

⁴ zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*, z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, IP II stopnia wdraża Oś priorytetową 1, z wyłączeniem poddziałań 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2.

⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 016 wniosków** na całkowitą wartość **2 155,16 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **881,09 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **735 projektów**, na całkowitą wartość **1 703,3 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **685,77 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **646 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **1 512,77 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **609,65 mln PLN**,

⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **96%**.

Wnioski o płatność


⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **309,13 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi około **49%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **283,99 mln PLN**, co stanowi około **45%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 10-11*.

Wykres 10. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

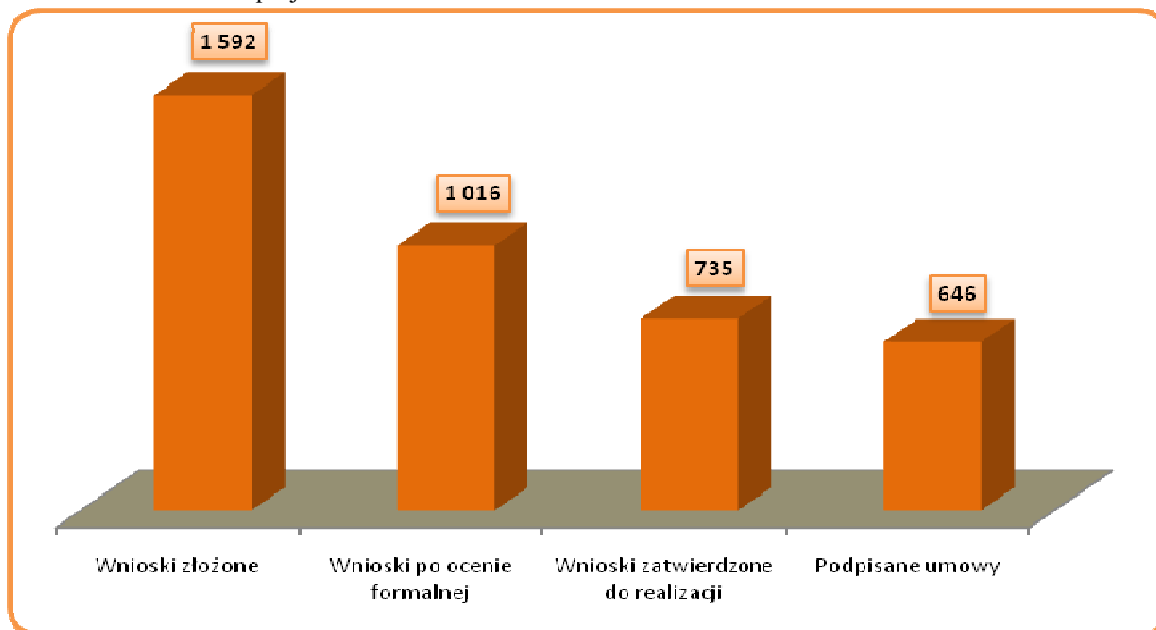

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 11. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

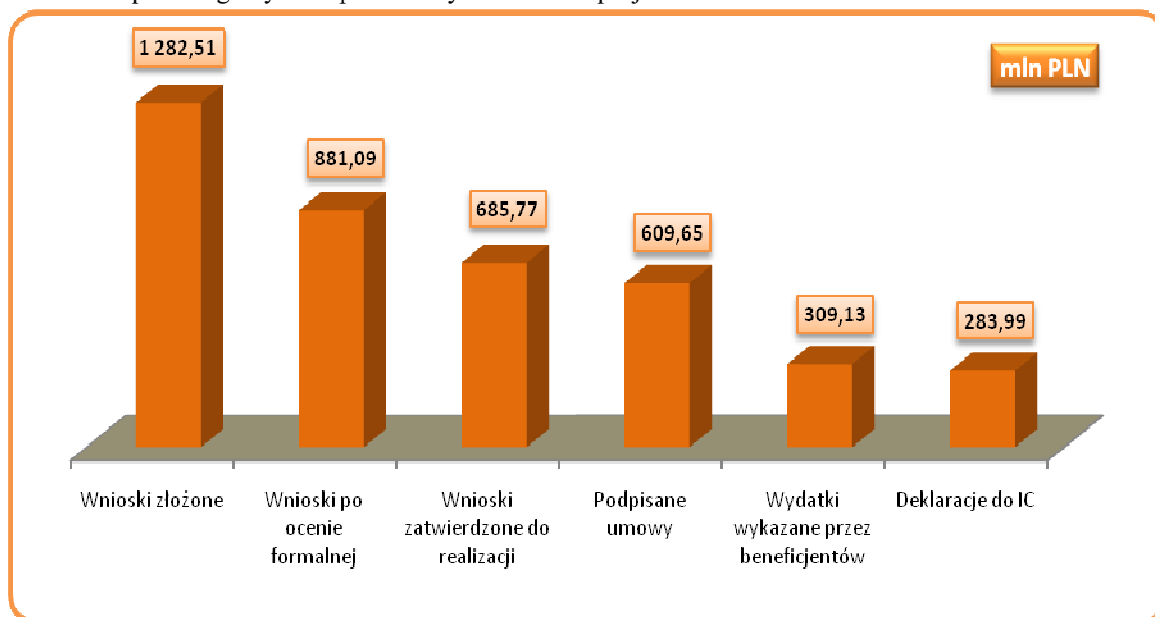

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków w ramach Osi priorytetowej 1.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym po procedurze odwoławczej pozytywną ocenę formalną otrzymało **12 wniosków** złożonych w ramach poddziałań 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* oraz 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*. Ich całkowita wartość wynosi **9,88 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **4,12 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **7 projektów** (5 projektów w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1 projekt w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz 1 projekt w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*). Całkowita wartość projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła **14,19 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **6,18 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **20 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **68,74 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **25,31 mln PLN**. Wśród ww. znalazł się projekt kluczowy *Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*,

⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym rozwiązano **12 umów** o dofinansowanie (1 projekt w ramach poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 6 projektów w ramach poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 2 projekty w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 2 projekty w ramach poddziałania 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* oraz 1 projekt w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe*

świadczone przez sektor publiczny). Łączna całkowita wartość rozwiązanych umów to **26,73 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **9,83 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **47,66 mln PLN** w ramach następujących działań/poddziałań:

- 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – **0,84 mln PLN**,
- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – **11,78 mln PLN**,
- 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* – **2,64 mln PLN**,
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – **14,64 mln PLN**,
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – **12,46 mln PLN**,
- 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – **5,3 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią około **7,5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **41,85 mln PLN**, co stanowi około **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w *Tabeli 5*.

Tabela 5. Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach						
II nabór (20.04-04.05.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		1	0,1
IV nabór (15-31.03.2010 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		3	1,64	7	3,06
V nabór (14-31.05.2010 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		2	0,13	7	0,4
Razem 1.1	-		5	1,77	15	3,56
1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach						
II nabór (17-30.11.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		1	0,93
III nabór (7-18.06.2010 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		1	2,29	1	2,97
Razem 1.3	-		1	2,29	2	3,91
1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa						
I nabór (1-15.04.2008 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono wniosków</i>		1	0,63

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
II nabór (31.08-15.09.2009 r.)	nie złożono wniosków		1	2,12	1	2,09
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny						
IPI (29.10-12.11.2010 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		1	15,12
Razem 1.4	-		1	2,12	3	17,84
OGÓLEM	0	0,00	7	6,18	20	25,31

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 1.

Jednakże w związku ze śródkresowym przeglądem Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji oraz przeprowadzić dodatkowe nabory wniosków w ramach wybranych działań/ poddziałań Osi priorytetowej 1. Termin przeprowadzenia naborów uzależniony będzie od momentu zakończenia renegotjacji Programu z Komisją Europejską. Ponadto, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 1.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest **646** projektów, w tym **355** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **4** projekty z zakresu inżynierii finansowej, **154** projekty z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego oraz **133** projekty z zakresu turystyki.

Do końca I półrocza 2011 r. zakończyła się realizacja **367** projektów, w tym **252** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **70** projektów innowacyjnych oraz **45** projektów z zakresu turystyki.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu. Obecnie realizowanych jest 13 z nich. Dla pozostałych 2 wskaźników w okresie sprawozdawczym zostały podpisane pierwsze umowy z beneficjentami, na koniec czerwca br. trwała realizacja 7 umów. Poziom realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje *Tabela 6*. Wartości wskaźników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozdań merytorycznych składanych w trybie miesięcznym przez beneficjentów do IP II stopnia.

Tabela 6. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
1.1	Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	30	6	20
a	w MŚP	10	2	2
1.2	Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi [szt.]	20	19	61
1.3	Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa [szt.]	1309	353	591
a	mikro	1020	282	443
b	małe	240	47	100
c	średnie	49	24	48
d	innowacyjne przedsięwzięcia	140	60	110
e	przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	22	8	27
f	firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania	130	89	165
1.4	Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [szt.]	36	0	7
a	w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	29	0	7
1.5	Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji [mln Euro]	10	19,01	19,01
1.6	Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu [szt.]	174	45	133
1.7	Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie [mln Euro]	1,8	0,51	17,11
Wskaźniki rezultatu				
1.8	Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu) [szt.(EPC*)]:	68	5	10
a	kobiety	34	2	2
b	mężczyźni	34	3	8
1.9	Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [szt. (EPC*)]:	3080	1285,5	2776
a	kobiety	1540	258,5	561
b	mężczyźni	1540	1027	2215
c	obszary wiejskie	1482	516	1251
1.10	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [szt. (EPC*)]:	420	216	862
a	kobiety	210	93	264
b	mężczyźni	210	123	598
c	obszary wiejskie	250	92	447
1.11	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [szt.]	170	0	77
1.12	Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro]	171,2	37,75	129,58

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

W ramach Osi priorytetowej 1 do podpisania pozostały umowy w ramach V naboru w poddziałaniu 1.1.2. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację, 15 wskaźników nie osiągnięte założonej na etapie programowania wartości docelowej. Nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźników wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych, niskiego zainteresowania beneficjentów niektórymi kategoriami interwencji, a także zmniejszeniem alokacji na niektóre poddziałania. 10 wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na niektóre działania/poddziałania a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym 3 wskaźniki założone dla Osi Priorytetowej 1 nie zostały osiągnięte, dlatego w *Załączniku I* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 2 wskaźniki produktu oraz 1 wskaźnik rezultatu:

– *Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia;*

– *w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu;*

realizację powyższych wskaźników założono w poddziałaniu 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* w ramach naboru na projekty dotyczące zakładania działalności gospodarczej (Startup). Wg stanu na 30 czerwca 2011 r. trwa podpisywanie umów. Oszacowanie realizacji ww. wskaźników będzie możliwe po podpisaniu wszystkich umów o dofinansowanie.

– *Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach* – realizację wskaźnika założono w poddziałaniu 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, w którym nie zakończono jeszcze realizacji żadnego z projektów. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 77, co stanowić będzie 45% wartości docelowej założonej na etapie programowania. Szacowana realizacja wskaźnika na niższym, niż zakładano poziomie wynika m.in. z przesunięć finansowych dokonywanych przez IZ RPO WO 2007-2013. Przewiduje się, iż wskaźnik osiągnie wyższą wartość w związku z planowanym zwiększeniem alokacji na poddziałanie z dodatkowych środków otrzymanych na realizację RPO WO 2007-2013.

Analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Osi priorytetowej 1:

– *Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:*

– *w MSP,*

– *Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu):*

– *kobiety,*

– *mężczyźni.*

Realizacja wskaźników w odniesieniu do wartości docelowej określonej dla roku 2015 jest na niższym poziomie niż zakładano na etapie programowania. Niższa wartość wskaźników wynika m.in. z przesunięcia pierwszego naboru wniosków z 2009 r. na 2010 r., a także z niższego zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Powyższe wpływa także na niskie wartości wskaźników dot. tworzenia miejsc pracy w B+R. IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że dzięki realizacji inwestycji wspartych z dodatkowych środków dla Programu, wartości wskaźników założone na etapie programowania zostaną osiągnięte.

– *Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw*

Z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 45% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane nieosiągnięcie wartości docelowej spowodowane jest zawyżeniem wartości docelowej określonej na etapie programowania, co wynikało z przyjęcia innych założeń w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, iż średnia wartość dofinansowania projektu jest 3-krotnie wyższa niż przyjęto na etapie szacowania wskaźników. W trakcie przeglądu śródk okresowego RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 planuje dokonać korekty wartości wskaźników, dla których przyjęto błędne założenia metodologiczne.

- *Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji*

Wartość wskaźnika przekroczyła zakładaną na etapie programowania wartość docelową dla roku 2015, co jest spowodowane decyzją IZ RPO WO 2007-2013 o zwiększeniu w 2010 r. alokacji na działania dotyczące wsparcia instrumentów inżynierii finansowej. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi środkami także tego obszaru interwencji RPO WO 2007-2013, w trakcie przeglądu śródkresowego Programu IZ RPO WO 2007-2013 odpowiednio skoryguje wartość docelową wskaźnika w roku 2015.

- *Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu*

Z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 76% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane nieosiągnięcie wartości docelowej spowodowane jest zawyżeniem wartości docelowej określonej na etapie programowania, co wynikało z przyjęcia innych założeń w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, iż średnia wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż przyjęto na etapie szacowania wskaźników.

- *Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie*

Z szacowanej realizacji wskaźnika dla roku 2015 wynika, iż wartość docelowa założona na etapie programowania zostanie przekroczona ponad 8-krotnie. Zwiększenie wartości wskaźnika wynika z innych założeń na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika przyjęto wartość środków przeznaczonych do realizacji kategorii interwencji 06, natomiast w trakcie realizacji Programu zwiększono kwotę alokacji na przedmiotową kategorię interwencji, a ponadto wskaźnik jest realizowany także przez przedsiębiorców których projekty dofinansowano w kategorii 07. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi środkami także tego obszaru interwencji RPO WO 2007-2013, w trakcie przeglądu śródkresowego Programu IZ RPO WO 2007-2013 odpowiednio skoryguje wartość docelową wskaźnika w roku 2015.

- *Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:*

- *kobiety,*
- *mężczyźni,*
- *obszary wiejskie.*

Realizacja wskaźnika głównego przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 90 % wartości docelowej określonej dla roku 2015. Dysproporcje w realizacji wskaźników w podziale na płeć wynikają z tego, że na etapie programowania IZ RPO WO 2007-2013 założyła, iż miejsca pracy tworzone będą w połowie dla kobiet i w połowie dla mężczyzn.

- *Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:*

- *kobiety,*
- *mężczyźni,*
- *obszary wiejskie.*

Z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 205 % wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane przekroczenie wartości docelowej wynika także z innych założeń na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika przyjęto założenie, iż w ramach jednego projektu z zakresu turystyki stworzonych będzie średnio mniej miejsc pracy, niż wynika to z realizacji Programu.

Dysproporcje w realizacji wskaźników w podziale na płeć wynikają z tego, że na etapie programowania IZ RPO WO 2007-2013 założyła, iż miejsca pracy tworzone będą w połowie dla kobiet i w połowie dla mężczyzn.

– *Dodatkowo wprowadzone inwestycje*

Wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego została osiągnięta na poziomie 75,7 % wartości docelowej założonej na etapie programowania określonej dla 2015 r., co jest spowodowane m.in. innymi założeniami na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika założono, iż większość projektów dofinansowanych w ramach Osi 1 będzie objętych pomocą publiczną, a tym samym zgodnie z metodologią prezentowania wskaźnika, jego wartość zostanie osiągnięta na wyższym poziomie. Z dotychczasowej realizacji Programu wynika, iż część projektów dofinansowanych w Osi 1 nie jest objętych regulami pomocy publicznej. Jednocześnie, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie alokacji w Osi 1 z dodatkowych środków, IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że wartość wskaźnika zostanie zwiększona.

Na poziomie Osi priorytetowej 1 w ramach podpisanych umów nie zidentyfikowano wskaźników, których realizacja wskazywałaby na zbyt niski poziom ich planowanego wykonania w stosunku do założonych wartości docelowych. Natomiast obserwując rozbieżności pomiędzy wartościami osiągniętymi oraz planowanymi do osiągnięcia, a założonymi na etapie programowania wartościami docelowymi, w ramach śródkresowego przeglądu Programu dokonane zostaną zmiany we wskaźnikach na poziomie RPO WO 2007-2013. Zmiany te odnosić się będą do wprowadzenia zmian wartości, nazw oraz jednostek miar wskaźników.

Obszar: *Rozwój przedsiębiorczości*

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie nowych instytucji wspierających innowacyjność oraz pośredniczących między sektorem B+R a gospodarką uznane zostało w *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013* za działanie priorytetowe dla budowy sprawnego i efektywnego systemu innowacji.

Od początku uruchomienia programu realizowanych jest **13 projektów** w tym obszarze, z których żaden jeszcze się nie zakończył. Przedsięwzięcia realizowane są przez samorządy gminne i powiatowe, prywatne firmy, uczelnie wyższe oraz stowarzyszenie. Przewiduje się, że w wyniku realizacji wszystkich projektów, dla których podpisano umowy:

- powstanie **6** nowych inkubatorów przedsiębiorczości, kolejne **2** zostaną rozbudowane;
- powstaną **3** centra/sfery biznesu oraz **2** centra transferu technologii i zaawansowanych technologii;
- utworzonych zostanie **51** miejsc pracy, w tym **1** etat badawczy;
- instytucje otoczenia biznesu udzielą wsparcia **2 135** przedsiębiorstwom, m.in. z branży budowlanej, meblarskiej, rolnej, turystycznej, ochrony środowiska, technologii IT;
- przy wsparciu IOB powstanie **71** nowych przedsiębiorstw;
- **77** przedsiębiorstw zostanie ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach.

Najwięcej projektów realizowanych jest w Opolu (**6** projektów), natomiast **7** poza stolicą regionu (3 projekty w powiecie oleskim oraz po 1 projekcie na terenie powiatów: strzeleckiego, kluczborskiego, nyskiego i prudnickiego).

Spośród realizowanych projektów najwięcej przedsiębiorstw planuje wesprzeć Izba Rzemieślnicza w Opolu w porozumieniu z 10 podmiotami branży budowlanej. W ramach tworzonego Branżowego Centrum Biznesu w roku 2012 wsparcie otrzyma ponad 800 przedsiębiorstw z branży budowlanej. Dzięki zapewnieniu kompleksowej oferty usług wspierających sektor budowlany beneficjent przewiduje, iż powstanie 25 nowych przedsiębiorstw, tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności branży budowlanej w województwie opolskim.

W Nysie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej powstaje Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych, którego celem jest wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, tak aby zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstw województwa opolskiego. Dzięki wykwalifikowanej i różnorodnej kadrze PWSZ w Nysie, Regionalne Centrum będzie wspierać firmy m.in. poprzez doradztwo, szkolenia, warsztaty, konsultacje, aranżację spotkań biznesowych. Zadaniem tych działań jest

popudzenie przedsiębiorców do wdrażania innowacji procesowych i produktowych, jak również uzupełnianie wiedzy koniecznej do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób sprawny, nowoczesny i konkurencyjny. Ponadto beneficjent przewiduje utworzenie największej liczby miejsc pracy spośród wszystkich dofinansowanych w ramach poddziałania 1.1.1 projektów: 11 nowych etatów, w tym 6 dla kobiet.

Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Od uruchomienia Programu do końca I półrocza 2011 r. w ramach poddziałania 1.1.2 zrealizowane zostały **252** projekty, z czego w okresie sprawozdawczym **31 projektów**.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzonych zostanie **698,5 miejsc pracy** w przedsiębiorstwach, (**115,5** dla kobiet, **583** dla mężczyzn), w tym **286** na obszarach wiejskich.

Pośród projektów zakończonych największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy z **branży budowlanej** (stanowią **30 %** całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). Najwięcej zakończonych projektów z tej branży dotyczy wykonywania specjalistycznych robót budowlanych m.in. usług w zakresie robót ziemnych podstawowych, instalacyjnych i wykończeniowych. Zastosowanie kosztownego specjalistycznego sprzętu umożliwia przedsiębiorcom wykonywanie prac o dużym stopniu trudności i pozwala konkurować z najlepszymi przedsiębiorstwami w branży budowlanej w regionie Opolszczyzny, jak i na poziomie ponadregionalnym.

W odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się wsparcie dla producentów z **branży drzewnej** (**14 %** całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). Najlicniejszą grupę stanowią producenci wyrobów ciesielskich i stolarskich dla budownictwa (tj. okien, drzwi, schodów, więźby dachowej, ogrodzeń). W oparciu o najlepsze standardy europejskie rozwija się przedsiębiorstwo produkujące wysokiej jakości schody drewniane. W ramach zakończonego w okresie sprawozdawczym projektu przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie na budowę obiektu produkcyjnego oraz zakup nowoczesnego oprogramowania pozwalającego zwiększyć liczbę zleceń w analogicznym do obecnego okresie czasu oraz rozszerzyć działalność o nowe zlecenia dotychczas niemożliwe do wykonania. Ponadto nowe oprogramowanie umożliwi wizualizowanie schodów w ramach wnętrz domów. Istotne znaczenie ma fakt, iż wdrażane przez przedsiębiorstwo *Piotr Wieczorek Wieczorek Schody Drewniane* nowoczesne technologie produkcyjne wytworzone zostały w ramach niemieckiego zrzeczenia Treppen Meister grupującego najważniejsze przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji schodów drewnianych (beneficjent posiada wyłączność na technologie Treppen Meister na obszarze 3 województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego). Schody wytworzone w ramach grupy producentów spełniają najwyższe światowe wymagania jakościowe oraz konstrukcyjne.

Bez zmian na trzeciej pozycji zaklasyfikowała się **branża medyczna** (**12 %** całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). Wsparcie uzyskały prywatne gabinety specjalistyczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie w województwie opolskim. W okresie sprawozdawczym w powiecie krapkowickim powstała Poradnia Kardiologiczna i Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej. Analiza regionalnego rynku usług medycznych dokonana przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach wskazała na zapotrzebowanie i ograniczony dostęp do ambulatoryjnych świadczeń kardiologicznych. Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób układu krążenia ma istotne znaczenie ze względu na to, iż choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce i Europie.

Wysoki poziom wsparcia otrzymali również przedsiębiorcy działający w **branży samochodowej** (**9 %** całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). W I półroczu 2011 r. zakończyła się realizacja projektu firmy *PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWEJ HYDROMOT* działającej w przemyśle motoryzacyjnym. Dzięki wsparciu ze środków unijnych przedsiębiorca zakupił wysokiej jakości maszyny i urządzenia do produkcji podzespołów do hydrauliki siłowej. Przed realizacją projektu przedsiębiorca zajmował się montowaniem importowanych podzespołów do hydrauliki siłowej w samochodach ciężarowych. Ze względu na bardzo szybkie zużywanie się danych podzespołów przedsiębiorca samodzielnie opracował nowe rozwiązania technologiczne, dzięki którym produkowane elementy będą znacznie wyższej jakości, lepszej precyzji i dokładności wykonania, a przede wszystkim będą znacznie trwalsze.

Na szczególną uwagę zasługują zakończone projekty z **dziedziny informatycznej**. Świadczone przez firmy usługi IT zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym przyczyniają się pośrednio do rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Opolszczyźnie.

Pierwszy z projektów zrealizowała spółka *netkoncept.com* specjalizująca się w planowaniu, opracowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Wsparcie ze środków unijnych umożliwiło przedsiębiorcy zakup nieruchomości zabudowanej oraz oprogramowania i serwerów pozwalających na wdrażanie, m.in. systemów rejestracji czasu pracy wykorzystujących czynniki biometryczne, systemów do obsługi programów lojalnościowych, systemów kontroli jakości i rejestracji reklamacji, systemu informacji turystycznej, systemu CMS. Firma będzie mogła konkurować z najlepszymi firmami z branży w zakresie przygotowywania profesjonalnych prezentacji multimedialnych, tworzenia interaktywnych map i planów miast, tworzenia dedykowanych stron www sklepów internetowych. Ponadto w ramach projektu beneficjent utworzył 4 miejsca pracy.

Głównym celem drugiego z projektów jest wdrożenie innowacyjnego systemu *QUAN.PL* w publicznych i prywatnych jednostkach służby zdrowia. System oparty jest na unitach multimedialnych i ich zdalnej obsłudze. Ekrany systemu QUAN-MED montowane będą przy gabinetach lekarskich, zastępując tabliczki informacyjne zawierające, m.in. numer lub godzinę aktualnie przyjmowanego pacjenta zmieniane przez lekarza z gabinetu. Z punktu widzenia zakładów opieki zdrowotnej system upraszcza proces przyjmowania pacjentów przez lekarzy, natomiast pacjentom umiła i wypełnia czas oczekiwania na wizyty lekarskie. Dodatkowo pacjenci poprzez stronę internetową będą mogli sprawdzić godziny dyżurów poszczególnych lekarzy i dokonać wyboru placówki medycznej.

Ponadto w ramach projektów zakończonych dofinansowanie uzyskali przedsiębiorcy z branż: **poligraficznej, spożywczej, obróbki metali, kamienia, firmy świadczące usługi m.in. fryzjerskie, kosmetyczne, telekomunikacyjne, księgowo, geodezyjne i pocztowe.**

Obszar: instrumenty inżynierii finansowej

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 zasilone zostały 3 instrumenty inżynierii finansowej kwotą 76 mln PLN. Dwa z realizowanych projektów polegają na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzeci projekt dotyczy wsparcia regionalnego funduszu poręczeniowego.

W ramach ww. wsparcia beneficjenci działania 1.2 podpisali umowy o wsparcie 365 przedsiębiorców (326 pożyczek i 39 poręczeń), co zaangażowało w sumie 58,05 mln PLN ze środków EFRR, czyli 76 % środków, którymi zasilono fundusze.

Obszar: innowacje, badania, rozwój technologiczny

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny* zakończyła się realizacja 70 projektów przedsiębiorstw, z czego 22 w okresie sprawozdawczym.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzonych zostanie 397 miejsc pracy w przedsiębiorstwach (57 dla kobiet, 340 dla mężczyzn), w tym 144 na obszarach wiejskich. Ponadto, zostanie utworzonych 5 etatów badawczych w zakresie B+R. Powstanie 121 nowych produktów/usług oraz wdrożonych zostanie 31 wyników prac B+R.

Projekty z zakresu B+R

Projekty dotyczące wsparcia sfery badawczo-rozwojowej wpisują się w *Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013* oraz *Regionalny Foresight Województwa Opolskiego*.

W ramach poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* realizowanych jest 18 projektów z zakresu B+R. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 4 projektów. Na terenie Uniwersytetu Opolskiego powstało laboratorium nowoczesnych technologii IT oraz wyposażono w sprzęt badawczy laboratoria Chemii Przemysłowej. W Kędzierzynie-Koźlu przy wsparciu środków unijnych Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” utworzył Laboratorium Procesów Syntezy Nowoczesnych i Ekologicznych Środków

Pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu oraz rozbudował Regionalne Laboratorium Chemii Przemysłowej.

W ramach zakończonych projektów:

- w 2 ośrodkach badawczych objętych wsparciem powstały 2 laboratoria badawcze,
- zakupiono 15 sztuk aparatury badawczo-rozwojowej,
- zostanie zrealizowanych 19 projektów współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi,
- utworzono 1 etat badawczy dla kobiety.

Celem nadrzędnym 2 zakończonych projektów jest rozwój przemysłu chemicznego uznawanego za kluczowy dla regionu. Należy podkreślić, iż Opolszczyzna ma potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej w tym sektorze wobec innych województw, dlatego dla utrzymania jej korzystnej pozycji niezbędne są dodatkowe nakłady na badania i rozwój.

Przedmiotem projektu ICSO „Blachownia” była przebudowa i adaptacja pomieszczenia na Regionalne Laboratorium Chemii Przemysłowej, które będzie prowadziło na szeroką skalę badania substancji i preparatów chemicznych. Odbiorcami usług będą, m.in. regionalni partnerzy z sektora chemii przemysłowej, partnerzy spoza województwa opolskiego a także wyższe uczelnie naszego regionu. W związku z nowymi możliwościami badawczymi Instytut podpisał wstępne porozumienia o współpracy z 5 firmami/zakładami przemysłowymi zainteresowanymi podjęciem współpracy w obszarze badań z wykorzystaniem nowej aparatury.

Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w nowoczesną aparaturę badawczą zwiększy potencjał uczelni w zakresie prowadzenia innowacyjnych badań, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi jakość prowadzonych badań naukowych oraz umożliwi stworzenie wysokich standardów kształcenia młodej kadry, co przyczyni się do podniesienia poziomu opolskiego środowiska naukowego, zwiększając jego atrakcyjność jako partnera we współpracy z innymi podmiotami. Zakres projektu objął wyposażenie laboratoriów badawczych w aparaturę badawczą, która znacznie rozszerzy możliwości analityczne Wydziału Chemii w zakresie badania różnych materiałów, w tym materiałów polimerowych oraz kompozytów polimerowych z różnorodnymi napełniaczami.

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* 2 przedsiębiorstwa zrealizowały projekty z zakresu B+R. W ich ramach zostanie utworzonych 15 miejsc pracy (1 dla kobiet) oraz 1 etat badawczy. Wprowadzono 2 nowe usługi/produkty oraz wdrożono wyniki prac B+R.

Projekty innowacyjne

W ramach poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja 66 projektów innowacyjnych w ramach kategorii interwencji 07 *Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)*. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 18 projektów.

Najczęściej wprowadzaną innowacją jest innowacja produktowa, najrzadziej zaś w ramach projektów przeprowadzane są zmiany w obszarze systemu zarządzania firmą.

W wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych 397 miejsc pracy, w tym 57 dla kobiet, natomiast 144 na obszarach wiejskich. Utworzone zostaną 4 etaty badawcze. Powstanie 121 nowych produktów/usług, wdrożonych zostanie 31 wyników prac B+R.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na zakupie innowacyjnej maszyny do cięcia szkła strumieniem wodno-ściernym pod wysokim ciśnieniem. Wdrożenie innowacji w firmie wpisuje się w realizowany od wielu lat plan rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu ze środków PHARE 2001, PHARE 2002 i SPO WKP 2004-2006 przedsiębiorstwo "ANGRA" jest prężnie rozwijającą się firmą stosującą najnowsze trendy w zakresie wzornictwa. Przedsiębiorca stał się liczącym eksporterem swoich wyrobów do odbiorców w Niemczech, Francji,

Czechach, Belgii, Austrii, Szwajcarii i na Białorusi. Największa inwestycja dofinansowana ze środków SPO WKP 2004-2006 polegała na zakupie hartowni – pierwszej w Polsce najnowocześniejszej japońskiej linii do produkcji szkła hartowanego umożliwiającej produkcję szkła giętego hartowanego. Zastosowanie nowej, wysokiej technologii w ramach RPO WO 2007-2013 ma na celu zagwarantowanie wyższej jakości usług i poszerzenie oferty. Przedsiębiorca wprowadził na rynek wyroby wykonane ze szkła połączonego z metalem oraz kamieniem, m.in. okapów stosowanych w branży AGD oraz drzwi, balustrad i poręczy stosowanych w budownictwie o unikalnym wzornictwie. Nowe urządzenie przyczyni się jednocześnie do obniżenia kosztów produkcji i oszczędności czasu produkcji. Ponadto zakup nowoczesnego urządzenia przyczyni się do rozwoju działu B+R funkcjonującego w przedsiębiorstwie. Poprzez zatrudnienie w nim dodatkowej osoby dział B+R pogłębi i rozwinie prace w dziedzinie projektowania oryginalnego, niespotykanego dotąd wzornictwa i tym samym spełni oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Przyczyni się w ten sposób nie tylko do rozwoju firmy, ale także funkcjonujących na rynku trendów w dziedzinie wzornictwa, m. in. w branży meblarskiej czy AGD.

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało dzięki realizacji projektu polegającego na wdrożeniu nowych specjalistycznych usług inżynierskich świadczonych w oparciu o innowacyjne technologie. Świadczenie nowych specjalistycznych usług możliwe jest dzięki zatrudnieniu 40 pracowników. Firma Sobet S.A. jako jedna z niewielu firm w Polsce wdrożyła najnowsze wersje technologii mikrotunelingu. Zastosowanie najnowocześniejszej metody budowy podziemnej infrastruktury daje możliwość budowy, odnowy, remontu i udrażniania starych podziemnych sieci, bez względu na to z jakich materiałów są wykonane oraz pozwala ominąć utrudnienia towarzyszące budowie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych sposobem tradycyjnym.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* do końca I półrocza 2011 r. zakończyła się realizacja **4** projektów pro środowiskowych i ekoinnowacyjnych.

W wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych **19** miejsc pracy (**5** dla kobiet), w tym **9** na obszarach wiejskich. Wdrożone zostaną **3** **wyniki prac B+R**. Zmniejszy się ilość wytwarzanych odpadów o ponad **8 000 ton/rok**.

Do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz całkowitej likwidacji odpadów poprodukcyjnych przyczyniła się inwestycja zrealizowana przez *Brzeskie Centrum Budowlane*. W ramach projektu beneficjent zakupił wysokospecjalistyczną wytwórnię betonu, która umożliwia produkcję mas betonu za pomocą innowacyjnych technologii. Zastosowana technologia pozwala na odbiór odpadów produkcyjnych z elektrociepłowni i ich wykorzystanie w procesie produkcji mas betonowych. Układ recyklingu pozostałości poprodukcyjnych spowoduje, że produkcja betonu stanie się bezodpadowa (urządzenie do recyklingu przetworzy 15 m³ odpadu na godzinę). Ponadto z punktu widzenia ochrony przed pyleniem do otoczenia, istotne znaczenie ma, m.in. zastosowanie samoczyszczących się filtrów odpylających powietrze z silosów cementu.

Obszar: turystyka

Do końca I półrocza 2011 r. zakończonych zostało **45** projektów, w tym **35** zrealizowanych przez przedsiębiorstwa oraz **10** przez podmioty publiczne.

W wyniku realizacji zakończonych projektów planowane jest utworzenie **216** miejsc pracy w turystyce, w tym **93** dla kobiet i **123** dla mężczyzn.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.4.1 zakończyła się realizacja **35** projektów.

W wyniku ich realizacji podniesiono jakość bazy gastronomicznej (zmodernizowano, rozbudowano i unowocześniono **12** restauracji oraz utworzono **4** nowe restauracje). Na terenie województwa opolskiego powstało **7** nowych hoteli, kolejne **3** hotele zostały rozbudowane. Część z nowo powstałych hoteli i restauracji powstała dzięki zaadaptowaniu na ten cel posiadanych wcześniej przez przedsiębiorców nieruchomości, budynków gospodarczych, budynków przyzamkowych czy pałacu. Rozszerzono zakres usług turystyczno-rekreacyjnych oraz zmodernizowano zaplecze gastronomiczne i

bazę noclegową w 4 ośrodkach wypoczynkowych. Na Opolszczyźnie powstało rancho, 2 centra sportowo rekreacyjne a także utworzono obiekt turystyczno-rekreacyjny na terenie odkryć paleontologicznych w Krasiejowie. Łącznie powstało 7 nowych a przebudowano 17 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. W wyniku realizacji projektów turystom udostępniono 333 miejsca noclegowe na terenie województwa opolskiego.

Wśród obiektów, które powstały/zostały zmodernizowane (hoteli, ośrodków wypoczynkowych, restauracji, centrów turystyki) aż 8 zostało przystosowanych pod względem infrastrukturalnym dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi tym osobom swobodne korzystanie ze wszystkich dostępnych usług. W nowo powstałym hotelu Domino w Niemodlinie część z pokoi hotelowych przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W nowoczesnym Centrum Sportu i Rozrywki ZORZA w Namysłowie dla osób niepełnosprawnych przystosowano sanitariaty oraz zamontowano szyb dźwigowy w obiekcie. W ośrodku wypoczynkowym MAX w Jarnołtówku do programu turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych zostanie wprowadzona rehabilitacja wodna.

Dzięki realizacji projektów zlokalizowanych w obrębie Jezior Turawskich wzrośnie ich atrakcyjność turystyczna. Jest to rejon o najwyższych walorach turystycznych w województwie, przy jeziorach biegną trasy rowerowe, konne i piesze. Na jeziorach można uprawiać sporty wodne, odbywają się tutaj m.in. regaty żeglarskie, zawody wędkarskie.

Do końca I półrocza 2011 r. unowocześniono bazę gastronomiczną *Ośrodka Wypoczynkowego „Peters”* położonego nad Jeziorem Turawskim. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pomieszczeń kuchennych oraz przeprowadzono roboty ogólnobudowlane. Inwestycja skróci czas oczekiwania na usługi oraz pozwoli zwiększyć ilość wykonywanych usług.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się przebudowa *Ośrodka Wypoczynkowego „Zacisze”* znajdującego się także nad Dużym Jeziorem Turawskim. W ramach inwestycji wybudowano restaurację i kawiarnię oraz zakupiono odpowiednie wyposażenie gastronomiczne. Wybudowanie i wyposażenie Centrum SPA pozwoli na oferowanie pobytów odchudzających i pobytów z programem odnowy biologicznej. Dzięki zainstalowaniu systemu grzewczego można będzie korzystać z usług ośrodka przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Zakup rowerów i sprzętu do nordic walking pozwoli na spędzanie w aktywny sposób wolnego czasu oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu.

Zakończony w okresie sprawozdawczym projekt *Stowarzyszenia Delta* pn. *Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie* realizuje jeden z głównych celów *Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013* tj. udostępnienie w większym zakresie obiektów archeologicznych i paleontologicznych dla celów turystycznych. W oparciu o stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie, gdzie został odkryty najstarszy dinozaur świata, podjęte zostały działania związane z zagospodarowaniem terenu wykopalisk paleontologicznych oraz terenów przyległych dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych. Przedmiotem projektu było zagospodarowanie Jura Parku w Krasiejowie tj.: stworzenie ścieżki edukacyjnej prezentującej dzieje Ziemi i dinozaurów oraz zakup i posadowienie 59 modeli dinozaurów wykonanych z żywicy epoksydowej. Ścieżka zlokalizowana jest po obu stronach projektowanego ogrodzenia tak, by uwydatnić poszczególne epoki w rozwoju Ziemi i zapewnić komfort zwiedzającym. Ponadto wybudowano ziemną platformę widokową i zlokalizowano na niej obiekt obejmujący m.in. kasy, punkt informacji, punkt sprzedaży pamiątek. Dzięki realizacji projektu zostało utworzonych 20 nowych miejsc pracy w turystyce.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez sektor publiczny

Efektom projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 1.4.2 jest przede wszystkim rozszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej w regionie. 9 spośród 10 zakończonych projektów związanych było z budową/ przebudową/ rozbudową centrów i kompleksów sportowo-rekreacyjnych (m.in. basenów, boisk, sal widowiskowych i sportowo-rekreacyjnych). Ww. inwestycje stanowią odpowiedź na słabą i niedostatecznie rozwiniętą bazę sportowo-rekreacyjną oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych obiektów tego typu. Dzięki realizacji przedsięwzięć na terenie gmin: **Lubsza, Namysłów, Niemodlin, Brzeg, Tarnów Opolski, Kluczbork, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle oraz Olesno** zapewniony został swobodny dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej (która może być

wykorzystywana przez cały rok), umożliwiającej organizację zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego w Oleśnie. W skład kompleksu wchodzi: hala basenowa (w tym basen pływacki, basen do nauki pływania, brodzik), zespół odnowy biologicznej (solaria, sauna fińska i turecka, grotta solna i śnieżna), zespół hydroterapii (bicz szkocki, masaż płaszczowy, wanna motylkowa, wirówki rąk i nóg), zaplecze szatniowo-sanitarne, cafe bar oraz sklepik sportowy. Zarówno na terenie gminy Olesno, jak i powiatu oleskiego nie ma żadnego obiektu o podobnym charakterze. Wybudowany obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych: dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w obiekcie zainstalowano windę łączącą obie kondygnacje. Oprócz tego przystosowano wymiarami i wyposażeniem toalety i przebieralnię, a na parkingu przy kompleksie wydzielono i specjalnie oznakowano miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.


Łącznie ze zrealizowanych w poddziałaniu 1.4.1 i 1.4.2 projektów skorzysta ponad **505 tys. osób**.

Podsumowanie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw

W ramach działań skierowanych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (tj. poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*) od uruchomienia Programu do 30 czerwca 2011 r. zrealizowane zostały łącznie **353 projekty**.

Wykres 12 przedstawia podział projektów na sektory gospodarki w oparciu o klasyfikację PKD 2007 dokonany na podstawie danych uzyskanych z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Pomimo tego, iż wiele przedsiębiorstw prowadzi różnicowaną działalność (np. przemysłowo – usługową) dla potrzeb sprawozdania każdemu beneficjentowi przyporządkowano jeden, przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykres 12. Procentowy udział podstawowych rodzajów działalności gospodarczej (w oparciu o klasyfikację PKD 2007) w wartości zakończonych projektów w ramach poddziałań 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1

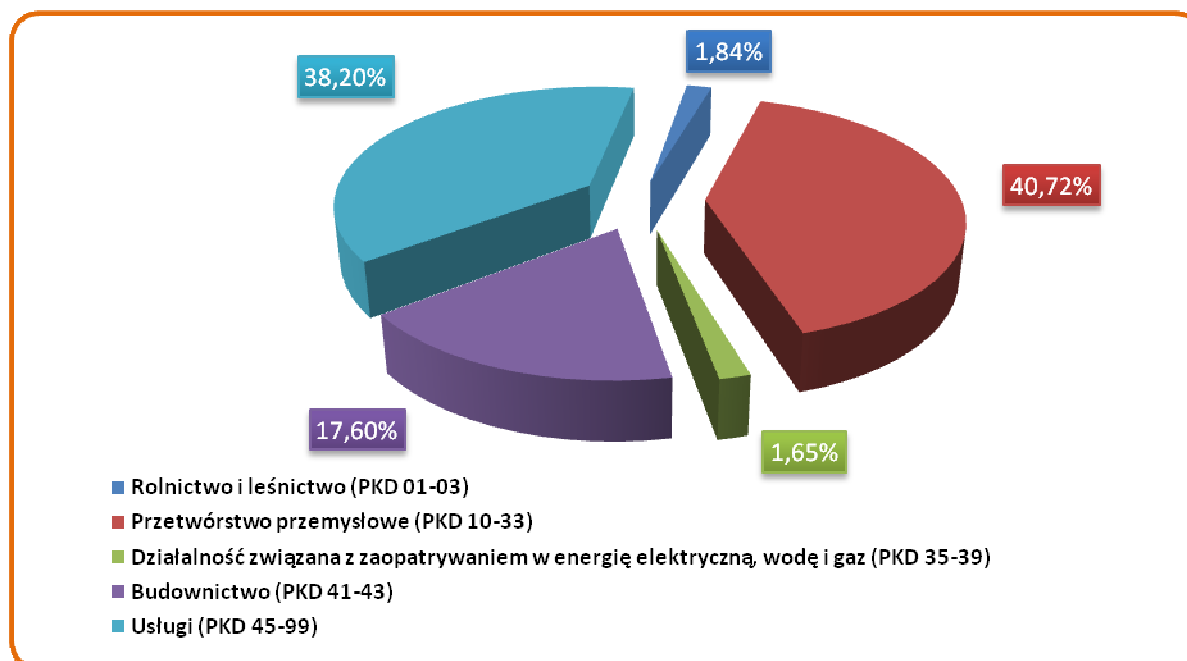

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KSI (SIMIK 07 – 13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007 - 2013).

Spośród zakończonych projektów największe dofinansowanie z EFRR otrzymali beneficjenci działający w **sektorze przetwórstwa przemysłowego**. W ramach tego sektora zrealizowano **102 projekty** na kwotę wsparcia z UE ok. **49,49 mln PLN**.

Z punktu widzenia zaawansowania technologicznego największy w tej grupie udział stanowią wyroby *przemysłu średnioniskiej i niskiej technologii* (86 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR

43,54 mln PLN, co stanowi ok. 88 % sektora przetwórstwa przemysłowego). W grupie tej znajdują się m.in. wyroby przemysłu drzewno – papierniczego, przemysłu spożywczego, przemysłu mineralnego, przemysłu metalurgicznego i metalowego.

Na poziomie 11 % w sektorze przetwórstwa przemysłowego utrzymuje się *przemysł średniej technologii* (13 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 5,31 mln PLN). W ramach tej dziedziny przemysłu wyróżniamy produkcję chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz produkcję maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu transportowego i urządzeń elektrycznych.

W stosunku do całości przetwórstwa przemysłowego najmniej zakończonych projektów zostało zrealizowanych w *przemysle wysokiej technologii* (3 projekty na kwotę dofinansowania z EFRR 0,64 mln PLN, co stanowi 1 % sektora). W ww. grupie znajdują się firmy specjalizujące się w produkcji komputerów.

Nieco mniej środków przeznaczono na **sektor usług**. Do końca I półrocza 2011 r. zakończyła się realizacja **174** projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **46,43 mln PLN**.

W sektorze usług przeważają *usługi w mniejszym stopniu oparte na wiedzy* (101 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 34,17 mln PLN, co stanowi ok. 74 % sektora). W tej grupie największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy zajmujący się handlem oraz usługami hotelarskimi i gastronomicznymi.

Wysoki wynik osiągnął sektor *pozostałe usługi oparte na wiedzy*. Przedsiębiorcy z tej dziedziny otrzymali dofinansowanie na realizację 67 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 10,90 mln PLN. Najczęściej są to usługi z zakresu zdrowia oraz działalności profesjonalnej i technicznej.

W strukturze sektora najmniej projektów zrealizowano w zakresie *usług wysokiej technologii* (6 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 1,36 mln PLN, co stanowi ok. 2,9 % sektora). Firmy funkcjonujące w tej branży prowadzą działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność związaną z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Również bardzo dobry wynik uzyskał **sektor budownictwa** (**67** projektów na kwotę dofinansowania z EFRR **21,34 mln PLN**). Na dalszych miejscach uplasowały się sektory: **rolnictwo i leśnictwo** oraz **działalność związana z zaopatrzeniem w energię elektryczną, wodę i gaz**.

OŚ PRIORYTETOWA 2 *Spółeczeństwo informacyjne*

Celami Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* są:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT,
- promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 2 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Na jej realizację przeznaczono **25 628 688,78 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **6%** środków Programu.

W ramach Osi podejmowane są działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejętności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie. Cele Osi priorytetowej 2 w całości realizują założenia Strategii Lizbońskiej.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony zdrowia.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 2.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** – odpowiednio po jednym naborze w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* oraz 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **27,84 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **33 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **156,78 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **133,07 mln PLN**. Zarówno w jednym, jak i w drugim działaniu, złożone wnioski zdecydowanie przewyższyły kwotę dostępnej alokacji,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **25 wniosków** na całkowitą wartość **124,96 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **105,99 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **24 projekty**, na całkowitą wartość **123,76 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **104,98 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **24 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **123,54 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **102,27 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł prawie **100 %**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **12,19 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi prawie **12%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **8,90 mln PLN**, co stanowi około **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 13-14*.

Wykres 13. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

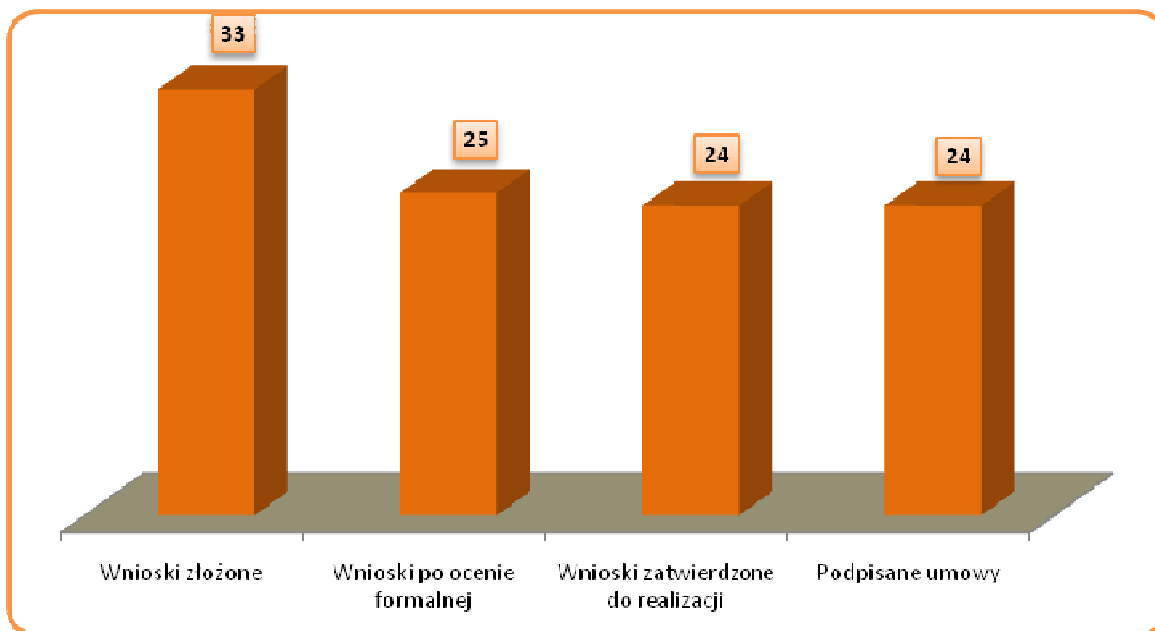

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 14. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

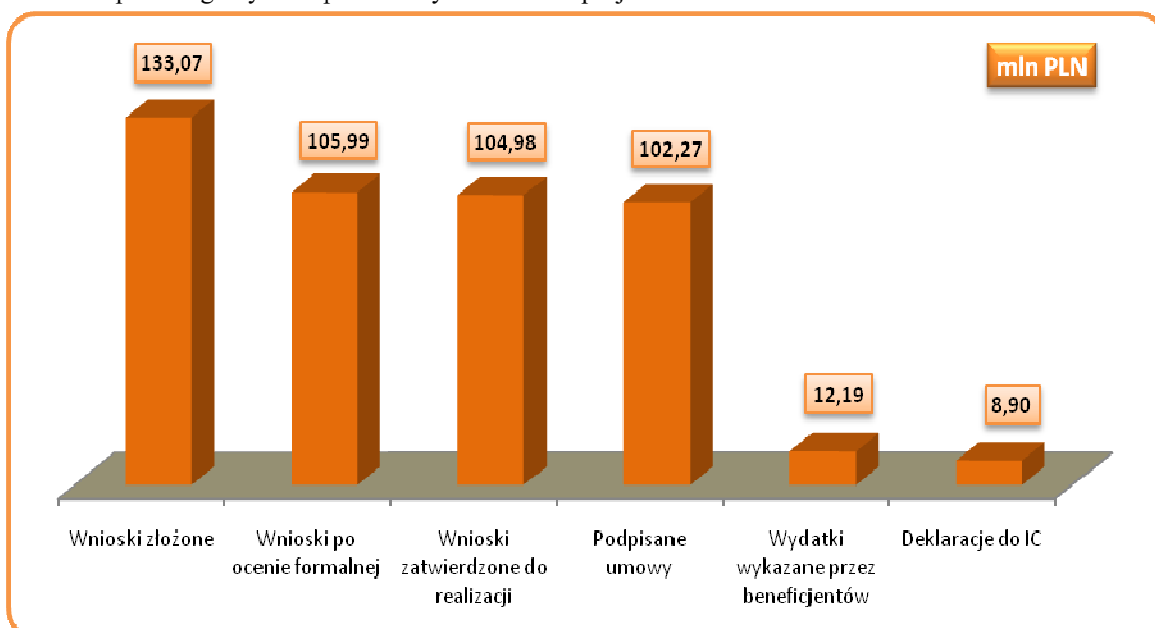

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków, wnioski złożone, zaakceptowane oraz podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków oraz nie dokonano oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2.
- ⇒ ponadto w okresie sprawozdawczym nie zaakceptowano do realizacji oraz nie podpisano umowy o dofinansowanie dla żadnego projektu w ramach Osi priorytetowej 2.

Wnioski o płatność

- ⇒ w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali wydatki w ramach Osi priorytetowej 2 na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **3,98 mln PLN**, co stanowi około **4%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **2,11 mln PLN**, co stanowi ponad **2%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2.

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.* na II półrocze 2011 r. nie planuje się kolejnych naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 2.

Jednakże w związku ze śródkresowym przeglądem Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji oraz przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych* Osi priorytetowej 2. Termin przeprowadzenia naboru uzależniony będzie od momentu zakończenia renegocjacji Programu z Komisją Europejską. Ponadto, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 2.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są **24 projekty** z zakresu społeczeństwa informacyjnego:

- **4 projekty** w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*,
- **20 projektów** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów, dlatego nie zmienił się poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do końca 2010 roku. Spośród zaprogramowanych 10 wskaźników na poziomie Osi priorytetowej 2, obecnie realizowane są 2:

- *Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego* – **2**,
- *Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów*, którego wartość wyniosła **4** (zmiana wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta).

Poziom realizacji wskaźników, wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 2, zaprezentowany został w *Tabeli 7*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (szacowana realizacja).

Tabela 7. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
2.1	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego [szt.]	5	2	24
2.2	Długość sieci Internetu szerokopasmowego [km]	300	0	21*
Wskaźniki rezultatu				
2.3	Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów [szt.]	nieszacowana	4	49 047*
2.4	Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym [osoby]	349 000	0	100 000*
a	- na obszarach wiejskich	150 070	0	0*
2.5	Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: [szt.]	nieszacowana	0	144
a	- gospodarstwach domowych	nieszacowana	0	0
b	- MSP	nieszacowana	0	0
c	- szkołach	nieszacowana	0	144
d	- w tym na obszarach wiejskich	nieszacowana	0	40

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

*w związku z błędną interpretacją wskaźników przez beneficjentów, w przypadku kilku projektów ich wartość jest przeszacowywana przez beneficjentów, zatem po podpisaniu aneksów wartość wskaźników ulegnie modyfikacji.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację oraz fakt zakontraktowania całości środków w ramach Osi, większość wskaźników nie osiągnie założonej na etapie programowania wartości docelowej. Nieosiągnięcie wartości docelowych wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości wskaźników, m.in. z faktu, że na etapie programowania wartości docelowe szacowane były przy uwzględnieniu projektu kluczowego, który zakładał powstanie w regionie nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej. W związku z rezygnacją z ww. projektu kluczowego, w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r. planowane jest przeszacowanie założonych na etapie programowania wartości docelowych wskaźników.

Do końca czerwca 2011 roku, 8 wskaźników założonych dla Osi Priorytetowej 2 nie zostało osiągniętych. Realizację ww. wskaźników założono w działaniu 2.1, w którym dotychczas nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów. Na wskaźniki te składa się 1 wskaźnik produktu oraz 7 wskaźników rezultatu, tj.:

- *Długość sieci Internetu szerokopasmowego* – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **21**, co stanowi **7%** w stosunku do wartości docelowej w 2015 r. Szacowana wartość wskaźnika przedstawiona w Tabeli 7 została znacznie zaniżona, co wynika z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;
- *Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego* – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **100 000**, co stanowi **28,65%** w stosunku do wartości docelowej w 2015 r. Szacowana wartość wskaźnika przedstawiona w Tabeli 7 została znacznie zaniżona, co wynika z błędnego prezentowania wartości przez

beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;

- *Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich* - na podstawie podpisanych umów wskaźnik osiągnie wartość **0**. Szacowana zerowa wartość wskaźnika przedstawiona w Tabeli 7 wynika z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;
- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego oraz Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w szkołach* - na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie **144**. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej, na obecnym etapie wdrażania nie ma możliwości zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Wartość ta zostanie oszacowana w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r.;
- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich* – na podstawie podpisanych umów wskaźnik osiągnie wartość **40**. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej, na obecnym etapie wdrażania nie ma możliwości zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Wartość ta zostanie oszacowana w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r.;
- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w gospodarstwach domowych oraz Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w MSP* – na podstawie podpisanych umów wskaźniki osiągną wartość **0**, ponieważ nie zostały wybrane do realizacji.

Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W ramach ww. działania nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów Samorządu Województwa Opolskiego, Miasta Opola, Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Efekty tych projektów, dzięki szerokiemu spectrum podejmowanych w ich ramach działań, będą odczuwalne dla mieszkańców całego województwa. Przykładowo, w wyniku realizacji projektu *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości – etap II*, powstanie nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna umożliwiająca świadczenie e-usług edukacyjnych w **111 placówkach oświatowych** na terenie wszystkich powiatów Opolszczyzny.

Projekt Miasta Opola pozwoli natomiast na postawienie kolejnego kroku w tworzeniu globalnego społeczeństwa informacyjnego, jakim jest budowa miejskich szerokopasmowych sieci światłowodowych, łączących obiekty użyteczności publicznej. Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana przez liczne instytucje oświatowe i edukacyjne, instytucje sfery kulturalnej, sportu i turystyki, urzędy administracji samorządowej i rządowej, służby porządkowe i ratownicze czy placówki służby zdrowia, z których usług korzysta na co dzień wielu mieszkańców województwa.

Działania dofinansowane w ramach ww. projektów przyczyniają się zatem do rozwoju w województwie opolskim infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejętności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie dla mieszkańców regionu.

Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

W ramach ww. działania realizowanych jest **20 projektów**. W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się realizacja żadnego projektu, dlatego nie zmienił się poziom realizacji postępu rzeczowego. Analogicznie jak na koniec 2010 r.:

- utworzono **23** aplikacje i usługi teleinformatyczne,
- *potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów* wyniosła **4**.

Jednym z projektów realizowanych w tym obszarze jest projekt gminy Kędzierzyn-Koźle *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania*. Ma on na celu wdrożenie systemu zapewniającego sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych ze względu na potencjalne istnienie zagrożeń: powodziowego, pożarowego czy skażenia chemicznego. Dodatkowo, celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa publicznego w mieście.

Uruchomienie Portalu Reagowania Kryzysowego umożliwi prezentację lokalizacji na mapie cyfrowej jednostek miejskich biorących udział w akcjach ratowniczych oraz czynnych dróg ewakuacji. Przedmiotowy portal będzie także umożliwiał wprowadzanie na mapę informacji w trakcie trwania akcji ratowniczych, tak aby były one dostępne niezwłocznie dla wszystkich jednostek biorących udział w działaniach.

Projekt dotyczący poprawy bezpieczeństwa mieszkańców realizuje także Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. W ramach projektu *Krok ku bezpieczeństwu – wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w województwie opolskim*, powstanie wojewódzka sieć teleinformatyczna, stanowiąca platformę komunikacyjną Straży z funkcją e-usług dla mieszkańców województwa opolskiego, dostarczającą szerokiego spektrum informacji tematycznych mieszkańcom województwa oraz mediom.

Planowane jest uruchomienie serwisu informującego on-line o sytuacji pożarowej całego województwa. Ponadto uruchomiona zostanie platforma e-learningowa skierowana do szerokiego grona członków ochotniczych straży pożarnych z całego województwa opolskiego. Platforma ta umożliwi stały dostęp do szkoleń on-line dla osób będących członkami OSP lub zainteresowanych przystąpieniem, jak również do pozostałych mieszkańców chcących polepszyć swoją świadomość w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego itp. Niezwykle ważnym efektem projektu będzie także budowa bezprzewodowej sieci teleinformatycznej WLAN łączącej wszystkie jednostki PSP województwa opolskiego.

Elementem projektu zasługującym na wyróżnienie, wpisującym się w realizację **zasadę równości szans**, jest uruchomienie systemu umożliwiającego zgłaszanie pożarów lub wypadków przez osoby z upośledzeniem słuchowym za pomocą SMS-ów. Informacja taka w połączeniu z bazą danych osób głuchoniemych umożliwi identyfikację osoby zgłaszającej.

OSŃ PRIORYTETOWA 3 *Transport*

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* s:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych ukłádów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeŃstwa użytkowników dróg,
- zwiększenie mobilnoŃci mieszkaŃców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

OŃ priorytetowa 3 wdrażana jest w całoŃci przez Instytucję Zarządzając RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadaŃ z zakresu transportu przeznaczono **111 057 651,38 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **26%** Ńródków Programu.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane s głównie roboty budowlane dotyczce dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny Ńrodowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej.

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorzdu terytorialnego.

Na realizację celów Strategii LizboŃskiej przeznaczono ponad **4%** alokacji w ramach całej Osi priorytetowej 3.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzając RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 3.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **8 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **5 naborów w ramach procedury pozakonkursowej** (beneficjenci 8 projektów kluczowych złożyli pełn dokumentację projektow),
- ⇒ całkowita kwota alokacji na przeprowadzone nabory wyniosła **110,06 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **56,3 mln Euro**; natomiast na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmujcej indywidualne projekty kluczowe przeznaczono **53,76 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **118 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartoŃc złożonych wniosków wyniosła **760,46 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze Ńródków EFRR **612,78 mln PLN**,
- ⇒ pozytywn ocenę formaln otrzymało **116 wniosków** o całkowitej wartoŃci **761,32 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **594,64 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzj Zarzdu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **98 projektów**, na całkowit wartoŃc **706,14 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **551,19 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **96 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartoŃci **572,77 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **443,05 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **100%**.

Wnioski o płatność


⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **294,05 mln PLN** dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **66%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **268,79 mln PLN**, co stanowi ponad **60%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 15-16*.

Wykres 15. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

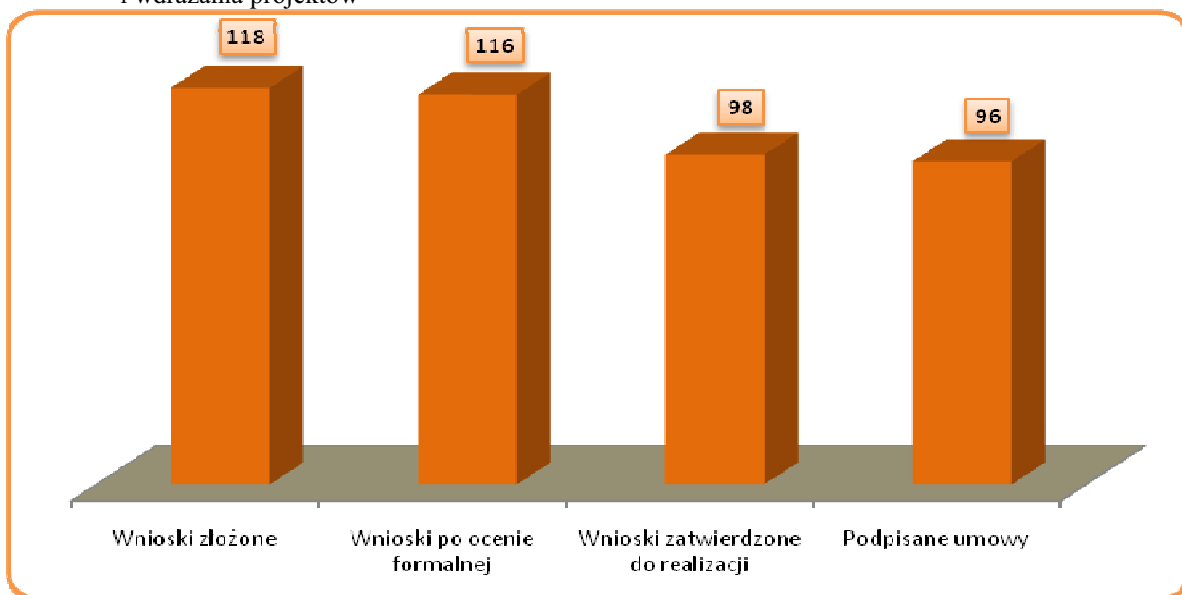

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 16. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

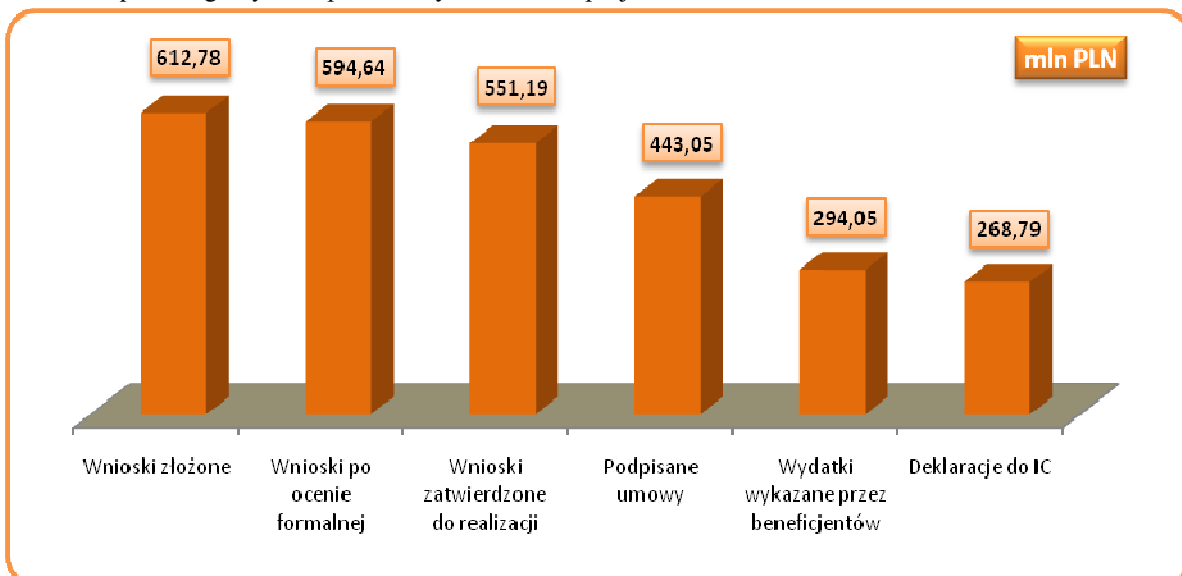

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków, wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnego naboru wniosków oraz nie dokonano oceny formalnej wniosków w ramach Osi priorytetowej 3.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji został zaakceptowany **1 projekt** na całkowitą wartość **36,0 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **27,6 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ w okresie sprawozdawczym zawarta została **1 umowa** o dofinansowanie o całkowitej wartości **2,02 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **1,69 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **29,65 mln PLN**, co stanowi około **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi. Płatności wykazano w ramach następujących poddziałań:

- 3.1.1 Drogi regionalne – **11,77 mln PLN**,
- 3.1.2 Drogi lokalne – **4,41 mln PLN**,
- 3.2 Transport publiczny – **13,48 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **18,02 mln PLN**, co stanowi ponad **4%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 8.

Tabela 8. Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
3.1.1 Drogi regionalne						
IV nabór (01-15.10.2010 r.)	nie złożono wniosków		1	27,6	nie podpisano umowy	
3.1.2 Drogi lokalne						
III nabór (08-22.10.2010 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		1	1,69
OGÓŁEM	0	0,00	1	27,6	1	1,69

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym zaplanowane zostało przeprowadzenie w trybie procedury pozakonkursowej **1 naboru** wniosków dla projektu kluczowego „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz-Dzików” w ramach Poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne Osi priorytetowej 3.

Tabela 9. Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w II półroczu 2011 r.

mln Euro

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	3.1.1 Drogi regionalne Procedura IPI	17-31.07.2011 r.	0,5	0,00
SUMA			0,5	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 24 maja 2011 r.

Ponadto, w związku ze śródkresowym przeglądem Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji oraz przeprowadzić dodatkowe nabory wniosków w ramach działania 3.1 *Infrastruktura drogowa* Osi priorytetowej 3. Termin przeprowadzenia naborów uzależniony będzie od momentu zakończenia renegotjacji Programu z Komisją Europejską. Jednocześnie, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 3.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest 96 projektów z zakresu transportu: 25 dotyczących budowy/przebudowy dróg regionalnych, 65 dotyczących dróg lokalnych i 6 projektów z zakresu transportu publicznego. Według stanu na 30 czerwca 2011 r. zakończyła się realizacja 48 projektów, w tym 9 z zakresu regionalnej, a 35 - lokalnej infrastruktury drogowej oraz 4 z zakresu transportu publicznego.

W ramach Osi priorytetowej 3 założono realizację 8 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowanych jest 10 z nich. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 3 prezentuje Tabela 10. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 10. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
<i>Wskaźniki produktu</i>				
3.1	Liczba projektów z zakresu transportu [szt.]	60	48	96
3.2	Długość nowych dróg w tym: [km]	11	3,89	23,4
a	regionalne (wojewódzkie)	6	0	6,50
b	lokalne (powiatowe i gminne)	5	3,89	16,9
3.3	Długość zrekonstruowanych dróg w tym: [km]	93	70,55	173,98
a	regionalne (wojewódzkie)	30	18,37	66,05
b	lokalne (powiatowe i gminne)	63	52,18	107,93
3.4	Liczba zakupionych środków transportu publicznego [szt.]	12	25	38

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki rezultatu				
3.5	<i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych [euro/rok]</i>	nioszacowana	10 955 032,49	18 784 681,64
3.6	<i>Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu [szt.]</i>	1300	2 445	3 545
3.7	<i>Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu [osoby/rok]</i>	1 533 000	776 585	1 217 321
3.8	<i>Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy [szt.]</i>	200 000	0	0

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na poddziałanie 3.1.1 oraz ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych m.in. w poddziałaniu 3.1.2 oraz działaniu 3.2. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 2 wskaźniki założone dla Osi priorytetowej 3 nie zostały osiągnięte, dlatego w Załączniku I w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 1 wskaźnik produktu oraz 1 wskaźnik rezultatu:

- wskaźnik produktu *długość nowych dróg regionalnych (wojewódzkich)* wykazał wartość zerową z uwagi na to, iż według stanu na 30 czerwca 2011 r. nie zakończyła się realizacja projektów z zakresu budowy nowych dróg w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Z analizy podpisanych umów wynika, iż beneficjenci realizują projekty w tym obszarze, zatem wartość wskaźnika zwiększy się i zostanie osiągnięta na poziomie 108% w stosunku do założonej wartości docelowej;
- wskaźnik rezultatu *liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy* został przewidziany do realizacji w ramach działania 3.2 *Transport publiczny*. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o nierealizowaniu projektu dot. budowy lotniska w Kamieniu Śląskim w obecnej perspektywie finansowej, w związku z tym w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r. planuje się usunięcie ww. wskaźnika.

Obszar: Infrastruktura drogowa

Według stanu na 30 czerwca 2011 r. zakończyła się realizacja **44** projektów: w tym **9** z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz **35** dotyczących dróg lokalnych.

Od uruchomienia Programu wskaźnik rezultatu *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnął wartość **10 955 032,49 Euro/rok**. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej, nie ma możliwości na obecnym etapie wdrażania zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej.

Regionalna infrastruktura drogowa

W wyniku zakończonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano **18,37 km** dróg w województwie opolskim, co stanowi **61%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej. Przewiduje się, że realizacja wskaźnika po zakończeniu trwających inwestycji wzrośnie do wartości **66,05 km**. Ponadto wybudowanych zostanie **6,5 km** nowych dróg. Obie wartości przekroczą zakładaną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowych wynika z podjętej przez IZ RPO WO 2007-2013 decyzji o nierealizowaniu projektu dot. budowy lotniska w Kamieniu Śl. w ramach RPO WO 2007-2013 i wsparciu go ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. Przesunięcie środków na regionalną infrastrukturę drogową pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów w tym obszarze, a tym samym przełoży się na wsparcie większej liczby inwestycji z zakresu modernizacji lub budowy dróg wojewódzkich.

Do końca czerwca br. w celu ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych w powiecie kluczborskim i gminie Krapkowice zakupiono specjalistyczny sprzęt i środki transportu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku zakupiła samochód lekki ratowniczo-rozpoznawczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem ratowniczym do udzielania pomocy poszkodowanym i prowadzenia akcji ratowniczych z zakresu ratownictwa drogowego. Nowy środek transportu obejmie ochroną 105,5 km szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez powiat kluczborski (drogi krajowe i wojewódzkie). Udzielone wsparcie przełoży się na szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia drogowe, sprawne likwidowanie skutków zdarzeń drogowych, szczególnie tych związanych z kolizjami, wypadkami i wypadnięciem pojazdów z drogi. Większe możliwości operacyjne jednostki pozwolą na neutralizowanie zagrożeń chemicznych na drogach i zapobieganie ich przedostawaniu się do gleby i wody oraz szybsze przywracanie bezpiecznego ruchu na szlaku. Ponadto skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia ma bezpośredni wpływ na ratowanie zdrowia i życia poszkodowanych.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Gminy Krapkowice polegającego na zakupie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Opolskim wozu pożarniczo-ratowniczego. Zakupiony pojazd wyposażony jest w sprzęt umożliwiający akcje ratownicze w zakresie m.in. gaszenia pożarów oraz zabezpieczenia miejsc zdarzeń drogowych. Długofalowym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez gminę Krapkowice i powiat. Należy podkreślić, iż łącznie ochroną objętych zostanie 368,1 km szlaków komunikacyjnych. Przez powiat krapkowicki przebiega autostrada A4 – ważny międzynarodowy szlak komunikacyjny prowadzący do granicy z Niemcami. OSP w Rogowie Opolskim znajduje się 2,8 km od węzła Dąbrówka Górna przy autostradzie A4 i jednocześnie w odległości 0,9 km od drogi krajowej nr 45 oraz 0,5 km od drogi wojewódzkiej nr 415.

Lokalna infrastruktura drogowa

Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest dążenie do podniesienia jakości infrastruktury transportowej na poziomie lokalnym. W wyniku zakończonych projektów z zakresu *lokalnej infrastruktury drogowej* zrekonstruowano **52,18 km** dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano **25,09 km** dróg powiatowych oraz **27,09 km** dróg gminnych, co stanowi prawie **83%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *długość zrekonstruowanych dróg, w tym lokalne*. Ponadto wybudowano **3,89 km** dróg gminnych, co stanowi prawie **78 %** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg, w tym lokalne*.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie około **108 km**, a długość nowych dróg **16,9 km**.

Po dokonaniu wewnętrznych analiz, IZ RPO WO 2007-2013 przewiduje, iż około 80% projektów dotyczących budowy/przebudowy dróg lokalnych, poprawi **dostępność do terenów inwestycyjnych, terenów produkcyjno-usługowych** m.in. Strefy Aktywności Gospodarczej Ujazd, Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kluczborku czy Skarbimierzu, Lewińskiej Strefy Biznesu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwickiej, Podstrefy

Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szacuje się, iż na terenach inwestycyjnych w wyniku planowanych inwestycji zatrudnionych zostanie około 10 tys. osób (generalny przelicznik stosowany przez SSE to około 20 miejsc pracy na 1 ha terenu strefowego).

➤ *Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice - Podstrefa Tułowice*

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Gminy Tułowice pn. *Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic - ul. Przemysłowa i ul. Porcelitowa*. Projekt dotyczył przebudowy 0,88 km ul. Przemysłowej i ul. Porcelitowej wraz ze skrzyżowaniem ul. Porcelitowej z ul. Świerczewskiego. Celem projektu było zapewnienie dostępu komunikacyjnego do nowych terenów inwestycyjnych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania o powierzchni przekraczającej 60 ha oraz dojazd do hal i magazynów zajmowanych przez podmioty gospodarcze o powierzchni przekraczającej 18 ha, w skład której wchodzi specjalna strefa ekonomiczna - podstrefa SSE Starachowice. Modernizacja złego stanu nawierzchni dróg wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem umożliwi powiązanie części usługowej Tułowic z drogą wojewódzką nr 405, następnie poprzez drogę krajową z autostradą A4.

Do końca roku 2010 zakończyła się realizacja projektu Powiatu Opolskiego pn. *Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice-Jaczwowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km 2+200 do km 7+200 - II i III etap*. Poprzez przebudowę 4,41 km drogi powiatowej stworzony został alternatywny dojazd do podstrefy SSE Starachowice w Tułowicach. Ponadto droga utworzyła dodatkowy dojazd do lotniska w Polskiej Nowej Wsi, na terenie którego znajduje się Opolski Aeroklub, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej z terenu województwa opolskiego. Wszystkie działania przyczyniają się do poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice położonej na terenie gminy Tułowice. Podstrefa składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 16 ha.

Ponadto w roku 2011 realizowany jest projekt pn. *Przebudowa ul. Różanej w Tułowicach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – etap III*, którego beneficjentem jest Gmina Tułowice. Jego realizacja również przyczyni się do poprawy dostępu do obszarów inwestycyjnych oraz polepszenia warunków inwestycyjnych.

Wszystkie ww. działania przyczyniają się do poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice położonej na terenie gminy Tułowice. Na terenie podstrefy znajdują się takie firmy jak: *Neo Plus Technology Sp. z o.o.* (producent wyrobów z tworzyw sztucznych i metalowych) i *Kaye Aluminium Opole Sp. z o.o.* (producent profili aluminiowych dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i motoryzacyjnego). W roku 2011 zezwolenie na prowadzenie działalności w podstrefie w Tułowicach otrzymał przedsiębiorca z kapitałem holenderskim: *Greenagro S.A.* Firma planuje uruchomić produkcję granulatu wysokoenergetycznego na bazie odpadów organicznych stanowiącego źródło odnawialnej energii w energetyce.

➤ *Tereny inwestycyjne w Gminie Walce*

Na terenie Gminy Walce znajdują się tereny inwestycyjne w miejscowościach Walce (o powierzchni 21 ha) oraz Stradunia (o powierzchni 34 ha). Miejscowość Walce jest już w pełni zwodociągowana, wyposażona w bardzo nowoczesną stację uzdatniania wody. Odległość terenu inwestycyjnego od autostrady A4 wynosi ok. 20 km. Konieczne jest zatem przygotowanie terenu również pod kątem dostępności komunikacyjnej.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Powiatu Krapkowickiego pn. *Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ulica Opolska w Walcach*, który ułatwi dojazd do terenu inwestycyjnego znajdującego się w miejscowości Walce. Przebudowa ul. Opolskiej o długości 0,51 km w Walcach przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogami krajowymi nr 45 i 40, stanowiącymi ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do autostrady A4 i Republiki Czeskiej.

Powiat Krapkowicki w 2009 zrealizował ze środków RPO WO 2007-2013 inwestycję pn. *Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach*. Przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Mickiewicza w Walcach przyczyni się do wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej powiatu krapkowickiego i stworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy. W wyniku realizacji zadania nastąpiła poprawa dostępności do terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w miejscowości Walce. Nastąpi upłynnienie ruchu pojazdów, co w rezultacie

wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie drogi, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie czasu oczekiwania na włączenie do ruchu.

Celem umożliwienia komunikacji w kierunku terenu inwestycyjnego w Walcach do końca 2010 r. zakończyła się realizacja projektu Gminy Walce pn. *Przebudowa ul. Zamkowej w Walcach*. W ramach projektu przebudowano 1,54 km drogi gminnej. Projekt jest komplementarny z działaniami podejmowanymi przez Powiat Krapkowicki, jak również z kolejnym projektem Gminy Walce realizowanym w 2011 r. pn. *Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach*.

Dzięki realizacji ww. projektów drogowych powstanie sieć dobrej jakości dróg lokalnych umożliwiających swobodny dojazd do terenu inwestycyjnego z różnych stron. W strefie inwestycyjnej w miejscowości Walce już teraz działalność gospodarczą prowadzi przedsiębiorstwo *B+K Polska Sp. z o.o.* należące do grupy *Bischof + Klein* zajmującej się kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie opakowań giętkich i folii technicznych. Dobra lokalizacja zakładu dała początek rozwojowi grupy na rynkach Europy Wschodniej. W roku 2010 firma zdobyła statuetkę Gazele Biznesu przyznawaną przedsiębiorstwom, które na przestrzeni trzech ostatnich lat były stabilne i szybko się rozwijały. Ponadto w Walcach na obszarach inwestycyjnych swoje siedziby mają m.in. firma *Apis Polska Produkty Naturalne Sp. z o.o.* zajmująca się zakupem, standaryzacją i dostarczaniem miodu dla największych odbiorców na świecie oraz przedsiębiorstwo konstrukcji budowlanych *STAHLBAU STIEBLICH Sp. z o.o.*

Obszar: Transport publiczny

Łącznie od uruchomienia Programu zakończyła się realizacja **4** projektów z zakresu transportu publicznego. W ramach tych projektów zakupiono **25** sztuk środków transportu publicznego, co stanowi **208 %** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych środków transportu publicznego*. Projekty zapewniły **2 445 miejsc** w środkach komunikacji, co stanowi **188 %** w stosunku do założonej wartości docelowej wskaźnika *potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu*.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3** projektów z zakresu transportu publicznego. W ramach tych projektów zakupiono **20** sztuk taboru autobusowego w Nysie, Kędzierzynie-Koźlu i Opolu, co pozwoliło na zwiększenie o **1 765** liczby miejsc w środkach komunikacji publicznej w ww. miejscowościach. Zakupione autobusy spełniają aktualne normy techniczne i ekologiczne, a także są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W gminie Nysa 7 zakupionych autobusów niskopodwoziowych zastąpiło 7 starych pojazdów, z których większość miała ponad 20 lat. Nowe autobusy są tańsze w eksploatacji, emitują mniej spalin, hałasu i wibracji, co wpłynie na ekonomikę, komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zwiększy się także komfort życia mieszkańców, którzy mieli dotąd utrudniony dostęp do komunikacji zbiorowej, w szczególności osób niepełnosprawnych, niedołączonych i starszych. W wyniku realizacji projektu wzrośnie mobilność mieszkańców gminy a podniesienie atrakcyjności komunikacji miejskiej przełoży się na podniesienie stopnia wykorzystania przez pasażerów transportu publicznego.

OŚ PRIORYTETOWA 4 *Ochrona środowiska*

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego,
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów,
- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 4 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono kwotę **42 714 481,30 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** środków w ramach Programu.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urządzeń i wyposażenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróżnorodności.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych czy parków krajobrazowych.

Na realizację Strategii Lizbońskiej przeznaczono środki EFRR stanowiące **25%** alokacji w ramach całej Osi 4. Środki na realizację strategii stanowią całkowitą alokację EFRR zaplanowaną w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 4.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **6 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **2 projektów kluczowych**: *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7,*
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **44,89 mln Euro**, w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **37,74 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **7,15 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **118 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **579,46 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR stanowiło **347,45 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **99 wniosków** na całkowitą wartość **521,01 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **299,41 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **62 projekty**, na całkowitą wartość **389,5 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **213,47 mln PLN**,

- ⇒ wśród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły się dwa projekty kluczowe *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka”* zadanie 1, 6, 7.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **58 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **316,27 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **167,63 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **98%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w ramach wszystkich działań Osi priorytetowej 4. Kwota dofinansowania z EFRR ww. wniosków o płatność wynosi **81,13 mln PLN**, co stanowi około **48%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **72,73 mln PLN**, co stanowi ponad **42%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 17-18*.

Wykres 17. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

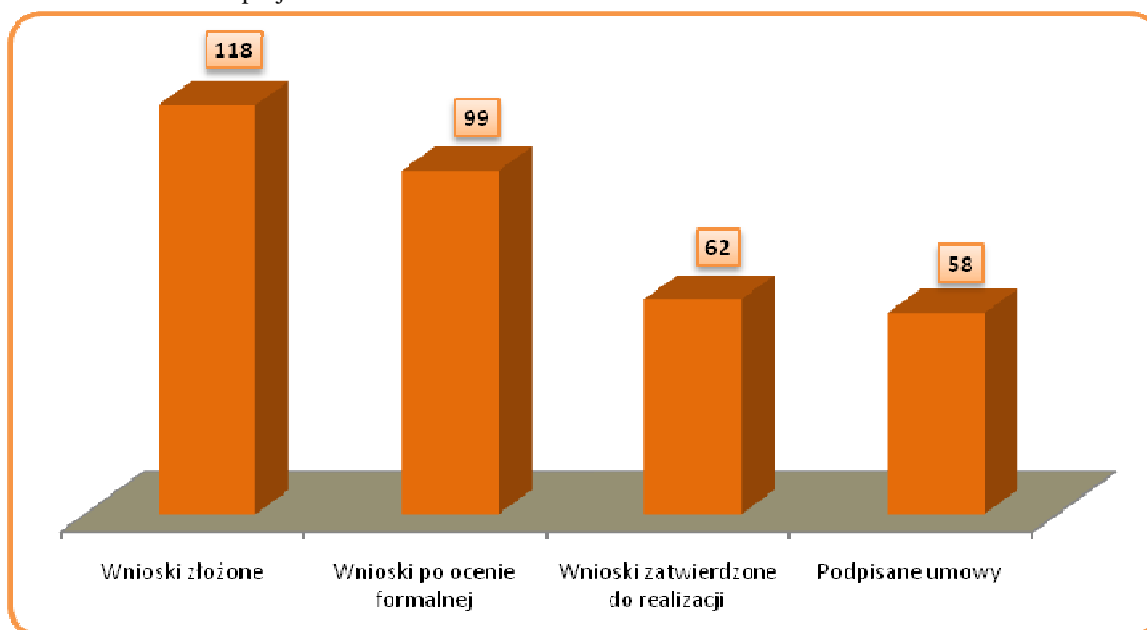

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 18. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

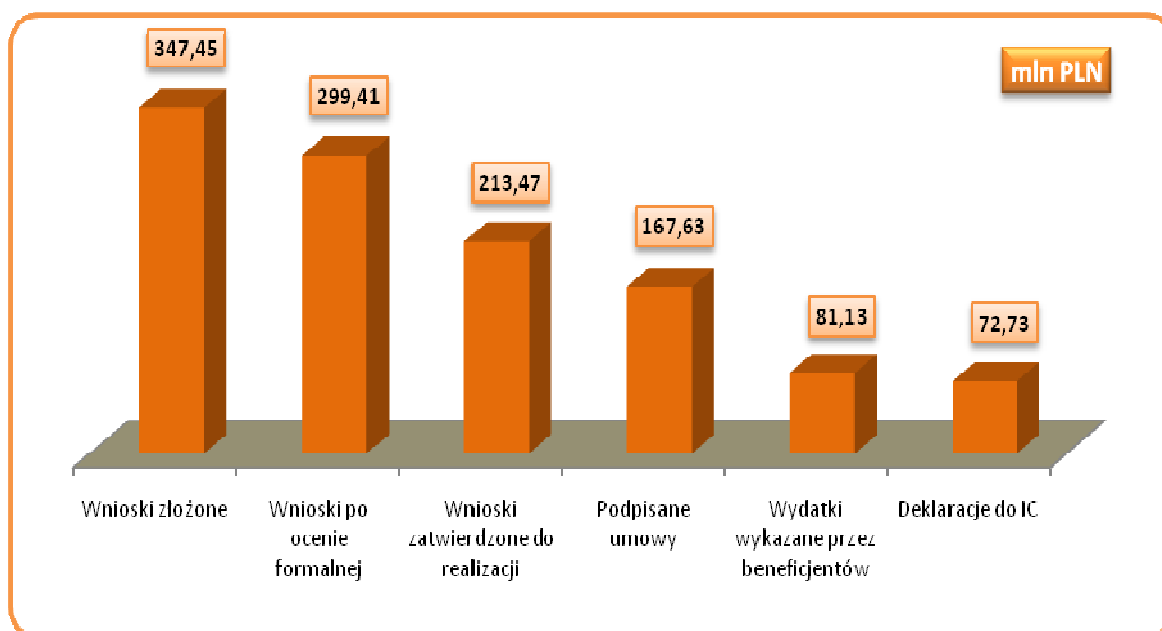

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ został przeprowadzony **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** – w ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na ww. nabór wyniosła **0,1 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **3 wnioski** o dofinansowanie na całkowitą wartość **1,01 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **0,78 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **3 wnioski** na całkowitą wartość **0,96 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **0,68 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zaakceptowano **2 projekty**. Ich całkowita wartość to **0,47 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **0,39 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ w obecnym okresie sprawozdawczym nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie,
- ⇒ ponadto, w okresie sprawozdawczym rozwiązano **1 umowę** o dofinansowanie w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Całkowita wartość rozwiązanej umowy wynosi **2,94 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **1,88 mln PLN**.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **14,84 mln PLN** w ramach następujących poddziałań:
 - 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* – **7,13 mln PLN**,

- 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – **4,65 mln PLN**,
- 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii – **2,88 mln PLN**,
- 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny – **0,17 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią około **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **10,84 mln PLN**, co stanowi ponad **6%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w *Tabeli 11*.

Tabela 11. Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

mln PLN

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny						
II nabór (17-31.03.2011 r.)	3	0,78	2	0,39	nie podpisano umowy	
OGÓLEM	3	0,78	2	0,39	0	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 4.

Jednakże w związku ze śródk okresowym przeglądem Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji oraz przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* Osi priorytetowej 4. Termin przeprowadzenia naboru uzależniony będzie od momentu zakończenia renegocjacji Programu z Komisją Europejską. Ponadto, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 4.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowanych jest **58** projektów, w tym **27** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, **2** projekty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, **25** projektów z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii oraz **4** projekty z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **11** projektów, w tym **6** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, **4** z zakresu ochrony powietrza oraz **1** z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu.

W ramach Osi priorytetowej 4 założono realizację 5 wskaźników produktu i 5 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowane są 2 wskaźniki produktu i 2 rezultatu. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 4 prezentuje *Tabela 12*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 12. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
4.1	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej [szt.]	9	6	21
4.2	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami [szt.]	3	0	6
4.3	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza [szt.]	2	4	25
4.4	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej [szt.]	8	0	1
4.5	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń [szt.]	2	0	2
Wskaźniki rezultatu				
4.6	Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów [km ²]	0,01	0	0,15
4.7	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów [osoby]	31 000	0	40 827
4.8	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów [osoby]	nieszacowana	0	48 713
4.9	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów [osoby]	14 000	8 453	28 350
4.10	Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych [MW]	4,25	0,02	362,07

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na działanie 4.1 oraz ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych w działaniu 4.1 oraz działaniu 4.3. Na obecnym etapie szacuje się, iż jeden wskaźnik osiągnie założoną na etapie programowania wartość docelową tj. *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* w ramach działania 4.2. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 6 wskaźników założonych dla Osi Priorytetowej 4 nie zostało osiągniętych, dlatego w Załączniku I w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 3 wskaźniki produktu oraz 3 wskaźniki rezultatu:

- *liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami* – realizację wskaźnika produktu założono w działaniu 4.1. Realizacja wskaźnika jeszcze się nie rozpoczęła, gdyż nie zostało zakończone żadne z przedsięwzięć realizowanych w obszarze gospodarki odpadami. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **6**, co spowoduje dwukrotne przekroczenie wartości docelowej. Przekroczenie wynika z tego, iż na etapie programowania założono, że wsparcie zostanie skierowane na utworzenie 3 składowisk odpadów. Z przeprowadzonego naboru wynika, iż beneficjenci wykazali zainteresowanie realizacją projektów w zakresie rekultywacji istniejących składowisk, w związku z czym dofinansowanych zostało więcej projektów;
- *liczba projektów z zakresu energii odnawialnej* – wskaźnik produktu założono do realizacji w działaniu 4.3. Na etapie programowania założono, iż wskaźnik będzie liczony jako liczba podpisanych umów, w ramach wniosków dla których beneficjent założył realizację jednej

z kategorii interwencji: 39-42. W wyniku przeprowadzonego w 2010 r. naboru wniosków w działaniu 4.3 w zakresie kategorii interwencji 39-42 (odnawialne źródła energii) podpisano 1 umowę, zatem wartość wskaźnika wyniesie 1, co stanowi będzie 13% w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Należy jednak podkreślić, że do dofinansowania wybrano projekty „łączone” tj. takie, które obejmują swym zakresem zarówno wydatki dot. efektywności energetycznej, jak i energii odnawialnej. Spośród 25 projektów, dla których podpisano umowy 15 projektów stanowią projekty łączone. Zgodnie z zasadami określonymi przez IZ RPO WO 2007-2013 beneficjent przy składaniu wniosku o dofinansowanie ma możliwość wyboru wyłącznie jednej, dominującej kategorii interwencji. W przypadku 15 projektów łączonych, wszyscy beneficjenci określili jako dominującą kategorię interwencji 43, gdyż zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WO 2007-2013 udział odnawialnych źródeł energii w kosztach kwalifikowanych był mniejszy niż 50%.

- *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* – wskaźnik produktu został przewidziany do realizacji w działaniu 4.2, w ramach którego podpisano umowy na realizację dwóch projektów kluczowych, co przyczyni się do skutecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa opolskiego. Szacuje się, iż wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w **100%**;
- *powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów oraz liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów* – wskaźniki rezultatu założono do realizacji w działaniu 4.1 w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami. Zerowe wartości obu wskaźników wynikają z tego, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt w zakresie przedmiotowego obszaru. W przypadku pierwszego wskaźnika na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż w ramach 6 podpisanych projektów wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **0,15 km²**, co stanowi będzie **1 500%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przekroczenie wynika z dofinansowania większej liczby projektów z zakresu gospodarki odpadami, niż założono na etapie programowania. W odniesieniu do wskaźnika *liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów* szacuje się, iż w ramach podpisanych umów selektywną zbiórką odpadów objętych będzie **40 827 osób**, co stanowi będzie **132%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przekroczenie wynika z dofinansowania większej liczby projektów z zakresu gospodarki odpadami, niż założono na etapie programowania;
- *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* – wskaźnik rezultatu został przewidziany do realizacji w działaniu 4.2. Zerowa wartość wskaźnika wynika z tego, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt w zakresie przedmiotowego obszaru. Z analizy podpisanych umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **48 713 osób**.

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **27** projektów, z czego **21** projektów ukierunkowanych jest na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej.

Celem działania 4.1 jest poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych. Realizowane inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych, budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez zwiększenie jakości wody pitnej i użytkowej czy poprawę warunków higieniczno-sanitarnych w gospodarstwach domowych, wpłyną niewątpliwie na poprawę jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Opolszczyzny. Tym samym realizacja projektów w sposób bezpośredni i pośredni zapewni bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Spośród 21 umów z zakresu **gospodarki wodno-ściekowej**, do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **6** projektów na terenie gmin: **Ujazd, Lubsza, Branice, Leśnica, Kolonowskie i Wolczyn**.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

- wybudowano **59,57 km** sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi **55,7%** założonej wartości docelowej;
- zmodernizowano **0,2 km** istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, co stanowi niespełna 1% założonej wartości docelowej;

- do sieci kanalizacyjnej zostało przyłączonych **8 453 osoby**, co stanowi ponad 60% założonej wartości docelowej;
- wybudowano **1** oczyszczalnię ścieków.

Zrealizowane projekty wpłyną na poprawę jakości głównych zbiorników wód podziemnych, w tym na: Triasowy GZWP nr 333 *Zbiornik Opole - Zawadzkie*, GZWP nr 332 *Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka*, GZWP nr 323 *Subzbiornik rzeki Stobrawy*, GZWP nr 335 *Krapkowice-Strzelce Opolskie*), GZWP nr 328 *Dolina Kopalna Małej Panwi*, GZWP 327 *Lubliniec – Myszków*, oraz GZWP 324 *Dolina Kopalna Kluczborka* co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia zaopatrzenia ludności w wodę.

W I połowie 2011 r. zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Kolonowskie i Wołczyn. Przeprowadzone inwestycje są uzupełnieniem wcześniejszych działań podejmowanych przez ww. gminy w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

➤ *Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie – etap III i IV*

Budowę III i IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kolonowskie, Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie zrealizowała jednostka organizacyjna gminy Kolonowskie: spółka *Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”*. Zakończony projekt jest w pełni komplementarny z inwestycją zrealizowaną na terenie gminy Kolonowskie ze środków programu PHARE 2002 SSG. W latach 2004 - 2005 wykonano I i II etap porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy. W Staniszczech Małych powstała gminna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 600 m³/dobę, oprócz tego na terenie gminy wybudowano 23,4 km kanalizacji sanitarnej, do której zostało podłączonych ok. 2,6 tys. osób, co stanowiło ok. 41 % mieszkańców gminy.

Skanalizowanie gminy ma istotne znaczenie z punktu ochrony przed zanieczyszczeniami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 333 Opole – Zawadzkie znajdującego się na obszarze gminy. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zapewnienia lepszej klasy czystości w parametrach biologicznych i fizyko-chemicznych rzeki Mała Panew, Jeziora Turawskiego oraz licznych potoków. W ramach projektu wybudowano 24,19 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 3 175 osób. Ścieki z terenów skanalizowanych w ramach projektu dofinansowanego z programu regionalnego są dostarczane do oczyszczalni ścieków wybudowanej z programu PHARE 2002 SSG.

Ponadto na terenie gminy od roku 2010 firma *Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Sp. z o.o.* w ramach programu PROW 2007-2013 realizuje kolejny komplementarny projekt pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spórok oraz w części wsi Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie*. W ramach przedmiotowej inwestycji powstanie 1,22 km kanalizacji sanitarnej, z której ścieki również będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Staniszczech Małych.

➤ *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II Etap i w Gieralcicach*

Dzięki wsparciu ze środków RPO WO 2007-2013 w gminie Wołczyn zakończyła się budowa 8,71 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzbica Górna i Gieralcice. Do kanalizacji podłączonych zostanie 1 149 osób z terenu miejscowości objętych projektem. Ukończona inwestycja jest kontynuacją I etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wierzbica Górna zrealizowanego w ramach programu SAPARD. Dzięki wsparciu z funduszu przedakcesyjnego w roku 2004 udało się skanalizować ok. 50 % gospodarstw domowych we wsi Wierzbica Górna. Sprawny system kanalizacji zniweluje zjawisko nielegalnego odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych do rowów melioracyjnych, na pola lub bezpośrednio do różnych zbiorników wodnych. Oprócz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców, zrealizowane projekty przyczynią się także do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy. W miejscowościach objętych inwestycjami istnieje możliwość lokalizacji podmiotów gospodarczych, jednakże do tej pory brak uzbrojenia terenu powodował brak zainteresowania potencjalnych inwestorów.

Ścieki odprowadzane są bezpośrednio do miejsca ich utylizacji, tj. oczyszczalni ścieków w Wołczynie. Należy jednak zauważyć, iż zły stan techniczny oczyszczalni nie pozwala na podłączanie do niej kolejnych użytkowników, w związku z czym Gmina Wołczyn zamierza dokonać rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków. Na realizację ww. przedsięwzięcia beneficjent otrzymał

dofinansowanie z programu regionalnego w ramach II naboru w działaniu 4.1. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2012-2013.

Obszar: *Gospodarka odpadami*

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **6 projektów dotyczących gospodarki odpadami**. Do końca czerwca br. nie zakończyła się realizacja żadnego z nich.

Przedmiotowe projekty realizowane są na terenach gmin: **Łubniany, Dobrzeń Wielki, Strzelce Opolskie, Turawa, Glucholazy** oraz **Dobrodzień**. Przewiduje się, że w ramach działania 4.1 zrehabilitowanych zostanie **5** składowisk odpadów.

Wśród słabych stron regionu wymienia się brak powszechnego i w pełni funkcjonującego systemu wykorzystywania odpadów. Realizowane projekty ukierunkowane są na redukcję ilości składowanych odpadów i zwiększenie stopnia segregacji i ich wtórnego wykorzystania, m.in. poprzez zamykanie i rekultywację składowisk odpadów, wdrożenie systemów segregacji, recyklingu, organizację i budowę systemów zbiórki odpadów.

Obszar: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*

W celu zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu oraz ograniczania negatywnych skutków ewentualnej powodzi, w ramach działania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe* realizowane są dwa projekty kluczowe. Pierwszy z nich dotyczy budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i stanowi jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim. Natomiast drugi z projektów dotyczy budowy lewostronnego wału rzeki Odry i ma na celu zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych oraz uporządkowanie funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych na terenie gmin przyległych do wału, w tym: Cisek, Kędzierzyn-Koźle oraz Reńska Wieś.

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpił znaczący postęp w realizacji wskaźników. Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono realizacji żadnego z ww. projektów. Planuje się, że łącznie w wyniku zakończenia realizacji projektów kluczowych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przed powodzią zostanie zabezpieczonych blisko **49 tys. osób**, a obszar powierzchni chronionej wyniesie ponad **3 ha**.

Ponadto w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego wybudowany zostanie **1 zbiornik małej retencji, 3,61 km** wałów przeciwpowodziowych, a przed powodzią zabezpieczonych zostanie **10 miejscowości**.

Obszar: *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*

W ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* realizowanych jest **25** umów na dofinansowanie projektów, mających na celu poprawę jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej. Projekty te przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza na Opolszczyźnie.

Większość z realizowanych projektów ukierunkowana jest na termomodernizację obiektów publicznych wraz z wymianą/ uzupełnieniem tradycyjnych źródeł energii na nowoczesne, wykorzystujące energię odnawialną (instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła). Spośród wszystkich jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystujących energię odnawialną projektodawcy zdecydowanie najczęściej wybierali te pozyskujące energię słoneczną. W ramach **13** takich projektów, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego wyniesie **323**.

Ponadto, niektóre z realizowanych inwestycji związane są z uruchomieniem instalacji mającej na celu wytwarzanie, a w konsekwencji sprzedaż energii odnawialnej, w tym również na zasadzie kogeneracji (w skojarzeniu). Efektem realizacji tych projektów będzie redukcja emisji zanieczyszczeń w województwie opolskim, a także podniesienie jakości infrastruktury związanej z wytwarzaniem energii, która pozwoli na bezawaryjne, bezpieczne oraz ekologiczne zaopatrzenie odbiorców w energię cieplną i elektryczną.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 4 projektów, co pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika rezultatu *dotatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych* na poziomie 0,02 MW, co stanowi 0,5% założonej wartości docelowej. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z braku zainteresowania obszarem energia odnawialna wiatrowa podczas przeprowadzonego naboru wniosków dla działania 4.3, dlatego szacuje się, iż wskaźnik nie osiągnie założonej wartości docelowej w ramach podpisanych umów⁵. W Tabeli 12 została przedstawiona znacznie przekroczona szacowana wartość wskaźnika. Wynika to jednak z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Ponadto w wyniku 4 zakończonych projektów ramach działania 4.3:

- powstała 1 jednostka wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (instalacja solarna); termomodernizacją zostało objętych 6 obiektów,
- ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji tych projektów wynosi 5,3 tys. MWh/rok.

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja projektu Powiatu Prudnickiego pn. *Zwiększenie efektywności energetycznej w Domu Dziecka w Głogówku*. Projekt obejmował kompleksowo wszystkie zagadnienia termomodernizacyjne: docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego polegającego na zmianie źródła ciepła z węglowego na gazowy, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Głogówku pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej o ponad 500 MWh/rok, tj. o ok. 66 % mniej w stosunku do stanu istniejącego. Zainstalowane kolektory słoneczne będą wspomagać prace tradycyjnego źródła ciepła. Ponadto znacznie zmniejszy się emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, dwutlenku węgla, pyłów i sadzy. Oprócz wymiaru ekologicznego również z punktu widzenia ekonomicznego realizacja projektu przyniesie pozytywne efekty. Termomodernizacja budynku przyczyni się do ograniczenia kosztów ogrzewania budynku o ok. 32 tys. PLN na rok, tj. ok. 61 % mniej w stosunku do stanu istniejącego. W aspekcie społecznym poprawie ulegną warunki pobytu dzieci i młodzieży w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Obszar: Ochrona bioróżnorodności

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 1 projektu, w dalszym ciągu trwa realizacja 3 projektów z zakresu zachowania bioróżnorodności Opolszczyzny. Realizacja projektów pozwoli na utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa opolskiego oraz wpłynie pozytywnie na zapewnienie ciągłości istnienia gatunków oraz stabilności ekosystemów. Łącznie w wyniku realizacji projektów przewiduje się przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemu na powierzchni ponad 6 ha.

W ramach działania 4.4 zakończyła się realizacja projektu Gminy Byczyna pt. *Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna*. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie różnorodności biologicznej ptaków drapieżnych zagrożonych wyginieciem i objętych ochroną gatunkową na Opolszczyźnie. Ochroną objęto 9 zagrożonych gatunków ptaków drapieżnych, są to: bielik, kania ruda i czarna, trzmiełojad, błotniak stawowy, rybołów, pustułka, myszołów i jastrząb. Nastąpi to poprzez odbudowanie łańcucha pokarmowego, na szczycie którego znajdują się poszczególne gatunki ptaków drapieżnych, utworzenie „remiz i alei śródpolnych” dających schronienie ptactwu drapieżnemu, a także stworzenie optymalnych warunków dla jego bezpiecznej migracji. W wyniku realizacji projektu zreintrodukowanych zostało 18 gatunków drzew i krzewów oraz 4 gatunki zwierząt: po 400 sztuk bażantów, kuropatw, zajęcy i dzikich królików.

W I półroczu 2011 r. miał miejsce II nabór w ramach działania 4.4. W wyniku przeprowadzonej oceny projektów Zarząd Województwa Opolskiego wybrał do dofinansowania 2 projekty. W II półroczu 2011 r. planowane jest podpisywanie umów z beneficjentami projektów zatwierdzonych do realizacji.

⁵ Na etapie programowania założono powstanie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW.

OSŃ PRIORYTETOWA 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie,
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy,
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym,
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 5 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Jest to najbardziej zróżnicowana pod względem obszarów wsparcia oś obejmująca inwestycje w edukację, zdrowie i kulturę. Na realizację ww. zadań przeznaczono **42 714 481,30 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** alokacji na Program z EFRR.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m.in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

Pod względem wdrażania osi najbardziej zaawansowaną w ramach całego Programu jest Oś priorytetowa 5. Według stanu na 30.06.2011 r. poziom kontraktacji wyniósł ponad **100%**, natomiast poziom płatności blisko **74%** zobowiązań na lata 2007-2013. Ponadto, spośród **103** podpisanych umów zakończyła się realizacja **70** projektów.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie napotkała na problemy związane z wdrażaniem Osi priorytetowej 5.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **7 naborów wniosków w trybie konkursowym** oraz złożono pełną dokumentację konkursową dla **2 projektów kluczowych**: *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* oraz *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,71 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **33,41 mln Euro**, na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **9,3 mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **137 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **441,38 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **282,20 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **124 wnioski** na całkowitą wartość **367,44 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **233,81 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **104 projekty**, na całkowitą wartość **319,99 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **199,17 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **103 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **276,85 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **171,58 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **100%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **126,21 mln PLN**, co stanowi około **74%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **117,83 mln PLN**, co stanowi około **69%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 19-20*.

Wykres 19. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

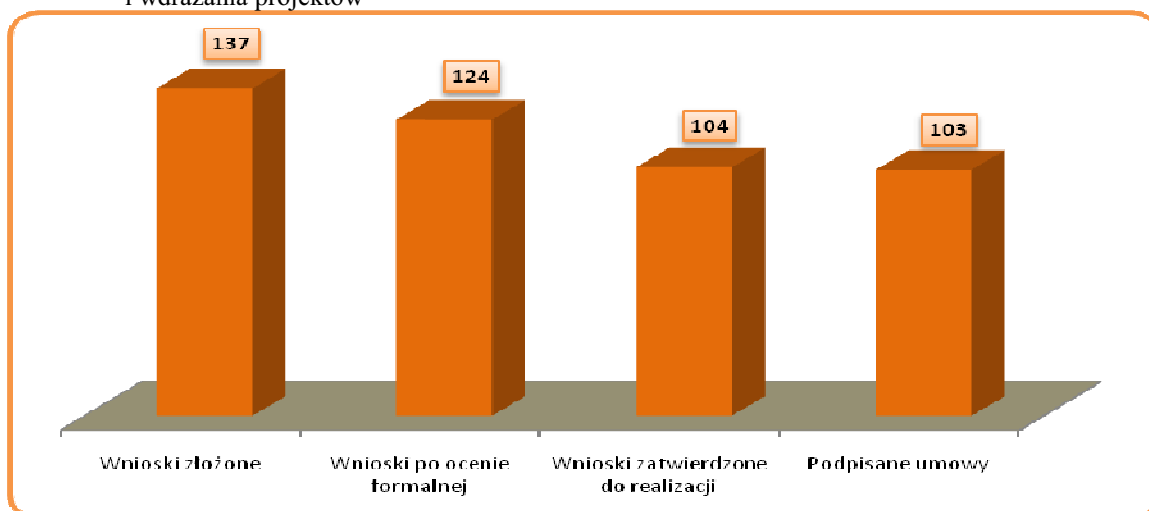

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 20. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

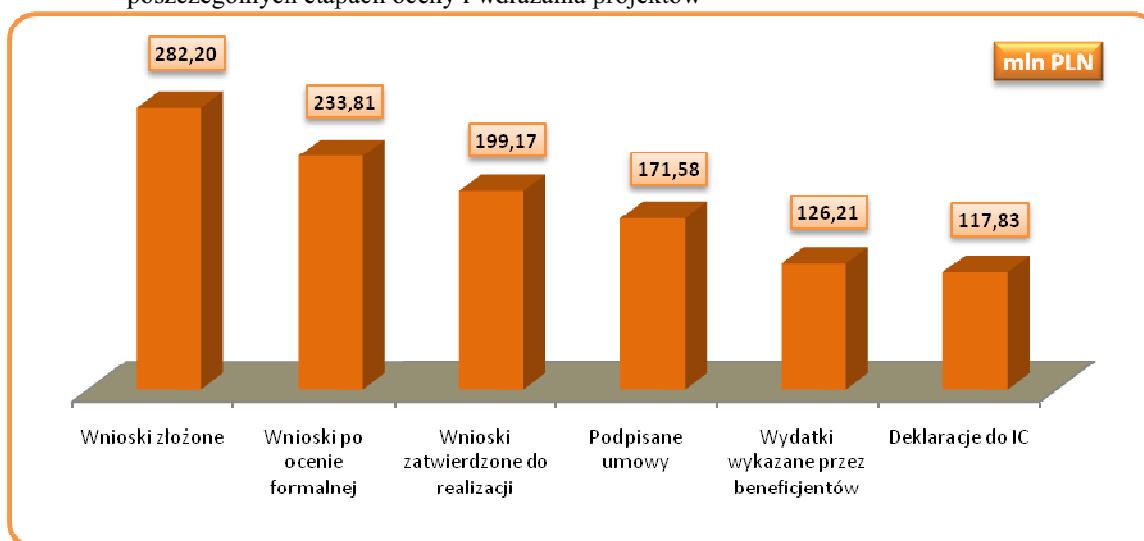

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie został przeprowadzony żaden nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 5.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym pozytywnie pod względem formalnym oceniono **2 wnioski** złożone w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*. Ich całkowita wartość wyniosła **0,48 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **0,4 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **5 projektów** na całkowitą wartość **8,67 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2,09 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **5 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **6,82 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **2,97 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **11,14 mln PLN** (kwota dofinansowania z EFRR) w ramach następujących poddziałań:

- 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* – **3,19 mln PLN**,
- 5.1.2 *Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej* – **1,8 mln PLN**,
- 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna* – **1,67 mln PLN**,
- 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* – **4,48 mln PLN**.

⇒ wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią ponad **6,5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **11,55 mln PLN**, co stanowi około **7%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 13.

Tabela 13. Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej						
I nabór (16-30.10.2009 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		3	1,42	2	0,49
5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna						
II nabór (16-30.08.2010 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		2	0,67	2	0,61

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						
I nabór (2-16.02.2009 r.)	nie złożono wniosków		nie zatwierdzono wniosków		1	1,87
OGÓLEM	0	0,00	5	2,09	5	2,97

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 5.

Jednakże w związku ze śródkresowym przeglądem Programu, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji oraz przeprowadzić dodatkowy nabór wniosków w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej* Osi priorytetowej 5. Termin przeprowadzenia naborów uzależniony będzie od momentu zakończenia renegotjacji Programu z Komisją Europejską. Ponadto, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 5.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowane są **103** projekty w tym **39** z zakresu edukacji, **38** z zakresu ochrony zdrowia oraz **26** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **70** projektów, w tym **25** z zakresu edukacji, **29** z zakresu ochrony zdrowia, **12** z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz **4** z zakresu kultury.

W ramach Osi priorytetowej 5 założono realizację 8 wskaźników produktu oraz 5 wskaźników rezultatu i obecnie wszystkie te wskaźniki są realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowany został w *Tabeli 14*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (szacowana realizacja).

Realizacja wskaźników już na obecnym etapie jest wielokrotnie przekroczone, dlatego na etapie renegotjacji programu, który zakończy się do końca 2011 roku, docelowe wartości wskaźników zostaną ponownie oszacowane.

Tabela 14. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
5.1	<i>Liczba projektów z zakresu edukacji [szt.]</i>	10	25	39
5.2	<i>Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem [szt.]</i>	10	69	109
5.3	<i>Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia [szt.]</i>	22	29	38
5.4	<i>Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: [szt.]</i>	22	61	70
a	<i>szpitale i kliniki</i>	11	18	18

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
5.5	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	9	436	503
5.6	Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [szt.]	6	12	16
5.7	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	3	4	9
Wskaźniki rezultatu				
5.8	Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym: [osoby]	2 900	7 634	24 798
a	korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	2 900	6 774	21 438
5.9	Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: [osoby]	1 000	11 875	37 440
a	korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	1 000	11 875	37 440
5.10	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów [szt.]	17 000	286 872	321 904

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Na poziomie Osi priorytetowej 5 w ramach podpisanych umów nie zidentyfikowano wskaźników, których realizacja wskazywałaby na zbyt niski poziom ich planowanego wykonania w stosunku do założonych wartości docelowych. Natomiast obserwując rozbieżności pomiędzy wartościami osiągniętymi oraz planowanymi do osiągnięcia, a założonymi na etapie programowania wartościami docelowymi, w ramach śródk okresowego przeglądu Programu dokonane zostaną zmiany we wskaźnikach na poziomie RPO WO 2007-2013.

Obszar: Infrastruktura edukacyjna

Poprawa jakości zasobów ludzkich, rozumiana jako wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców regionu, jest jednym z podstawowych warunków budowy i rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki. Realizacji tych celów służą m.in. inwestycje podejmowane w ramach działania 5.1 *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej* zapewniające szerokim grupom społeczeństwa dostępność do bazy infrastruktury edukacyjnej, dostosowanej do nowoczesnego, wykorzystującego głównie rozwiązania i technologie ICT, systemu oświaty.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **39** projektów z zakresu *infrastruktury edukacyjnej*, w tym **17** na poziomie regionalnym oraz **22** na poziomie lokalnym. Realizacja **25** projektów już się zakończyła, w tym **11** z zakresu *infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym* oraz **14** z zakresu *infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **69** placówek oświatowych o zasięgu regionalnym i lokalnym, co stanowi **690%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- **16** obiektów zostało dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono **5 072** zestawów komputerowych i oprogramowania,
- ponad **7 600** studentów korzysta z efektów projektów, a blisko **12 tys. uczniów i słuchaczy** z nowej/zmodernizowanej w wyniku realizacji projektów infrastruktury.

Regionalna infrastruktura edukacyjna

Wsparcie *regionalnej infrastruktury edukacyjnej* ukierunkowane zostało przede wszystkim na przekształcenie bazy dydaktycznej do potrzeb nauki, która przyczynia się do rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu i wpływa na dostosowanie kwalifikacji i umiejętności absolwentów do potrzeb rynku pracy. W ramach tego obszaru projekty realizują, obok uczelni wyższych, placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz placówki oświatowe na poziomie ponadgimnazjalnym w większości powiatów województwa opolskiego.

Przykładem projektu służącego poprawie warunków kształcenia w instytucjach oświatowych o zasięgu regionalnym jest projekt *Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego*. W jego ramach przebudowano **dwie obiekty oświatowe**. Pierwszy z nich to Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku, w którym uruchomiono **Centrum Kształcenia Praktycznego** przeprowadzające szkolenia i kursy zawodowe oraz pracownie służące do praktycznej nauki zawodu. W przebudowanym obiekcie znalazły się dwie pracownie do obróbki ręcznej, dwie pracownie komputerowe, sala wykładowa oraz sala dydaktyczna dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Drugi budynek objęty projektem to Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku. Po przebudowie działa tutaj **Centrum Kształcenia Ustawicznego**, przeprowadzające kursy językowe i przedsiębiorczości, sale lekcyjne, multimedialna biblioteka szkolna oraz sale dydaktyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dzięki projektowi zwiększeniu uległa liczba uczniów (**2 096 osób**) korzystających z różnorodnych form kształcenia zawodowego, ustawicznego i praktycznego poprzez dostęp do zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem. Polepszyły się warunki w placówkach oświatowych, umożliwiające zostało wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego.

W zakresie szkolnictwa wyższego zakończyła się m.in. realizacja projektu *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu*, w ramach którego zakupiono Web kioski, punkty Wi-Fi, mobilne laboratorium wraz ze stanowiskiem programisty, rzutniki, ekrany i wizualizery ułatwiające prowadzenie zajęć. Dzięki dostosowaniu bazy dydaktycznej uczelni do potrzeb studentów i wymagań rynku pracy poprawiła się jakość kształcenia. Projekt umożliwił bezpłatny dostęp do większej ilości sprzętu komputerowego. Doposażone sale dydaktyczne wpłynęły na wyrównanie szans edukacyjnych studiujących. Bezprzewodowy, darmowy Internet oraz Web kioski usytuowane w budynkach uczelni umożliwiają dostęp do Internetu, baz danych, programów i zasobów biblioteki.

Lokalna infrastruktura edukacyjna

W ramach RPO WO 2007-2013 wsparciem objęta została również *lokalna infrastruktura edukacyjna*. Łącznie, zrealizowano już **14 z 22** inwestycji dążących do podniesienia jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym oraz likwidacji barier w dostępie do edukacji dzieci, w tym szczególnie z terenów wiejskich i zmarginalizowanych.

W ich ramach unowocześniono istniejącą infrastrukturę i wyposażenie w **47 placówkach oświatowych** szczebla podstawowego i gimnazjalnego z terenu **8 powiatów** województwa opolskiego. **8** z nich dostosowało infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pochylni czy budowę podjazdów dla wózków inwalidzkich. Z efektów projektów korzysta już ponad **5 300 uczniów**.

Przyrodnicze Centrum Doświadczenia i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy to jeden z zakończonych w tym obszarze projektów. W jego ramach stworzono bazę lokalową ze specjalistycznym wyposażeniem dydaktycznym do nauki przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i matematyki – za pomocą prezentacji doświadczalnej. Centrum służy zarówno miejscowemu gimnazjum, jak i innym szkołom w regionie. Ponadto, zastosowanie tablic interaktywnych pozwala na przeprowadzanie lekcji on-line w każdej szkole posiadającej dostęp do Internetu i tablicy interaktywnej. Projekt przyczynił się do stworzenia bazy szkoleniowej dla młodzieży. Powstały obiekt jest także miejscem podnoszenia kwalifikacji oraz ponadstandardowym miejscem dla innych przedsięwzięć miejscowej ludności, np. szkoleń i konferencji, realizowanych w sposób bardziej atrakcyjny i nowoczesny.

W ramach projektu *Zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej w Gminie Branice poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia dla trzech szkół podstawowych i gimnazjum*, zakupiono wyposażenie dydaktyczne do pracowni szkolnych, które pozwala na przeprowadzenie szeregu doświadczeń z zakresu fizyki, biologii, przyrody, a także na wykorzystanie nowoczesnych programów edukacyjnych. Wyposażenie pracowni daje możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy, przeprowadzenia doświadczeń, a także posługiwania się technologiami informatycznymi. W **4 placówkach** objętych wsparciem z zakupionego sprzętu i wyposażenia korzysta blisko **600 uczniów**.

Po zrealizowaniu wszystkich projektów w ramach regionalnej i lokalnej infrastruktury edukacyjnej wspartych zostanie **109 placówek oświatowych** z terenu całego województwa, a z efektów projektów korzystać będzie blisko **25 tys. studentów** oraz ponad **37 tys. uczniów** szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Obszar: Ochrona zdrowia

W ramach działania 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* realizowane są przedsięwzięcia na rzecz ochrony zdrowia ludności województwa opolskiego poprzez zwiększenie dostępności do placówek ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Inwestycje w tym obszarze wspierają restrukturyzację istniejącej bazy szpitalnej i optymalizację bazy medycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **38** projektów z zakresu *ochrony zdrowia*, w tym **13** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **25** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*. Realizacja **29** projektów już się zakończyła, w tym **13** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **16** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparcie otrzymało **61** placówek medycznych co stanowi **277%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- wsparciem objęto **18** szpitali co stanowi **164%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- przebudowano **6** instytucji ochrony zdrowia, co stanowi **60%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- zakupiono **436** sztuk sprzętu medycznego co stanowi **4 844%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zostało zrealizowanych **286 872** specjalistycznych badań medycznych, co stanowi **1 687%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej,
- z usług medycznych skorzystało ponad **90 tys.** osób.

Stacjonarna opieka medyczna

Do końca 2010 r. zakończyła się realizacja wszystkich projektów w ramach *stacjonarnej opieki medycznej*:

- w ramach 13 projektów wsparto **18** placówek medycznych,
- przebudowano **2** instytucje ochrony zdrowia,
- zakupiono **255 sztuk** sprzętu medycznego (m.in. tomografy komputerowe, mammografy, elektroencefalografy, aparaty RTG i USG),
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zostało zrealizowanych ponad **76 tys.** specjalistycznych badań medycznych rocznie,
- z usług medycznych skorzystało ponad **56 tys.** osób.

Obok projektu kluczowego obejmującego inwestycje w 5 największych szpitalach o zasięgu wojewódzkim (opisanego szczegółowo w poprzednim sprawozdaniu), wsparciem objęto szpitale z terenu wszystkich powiatów województwa opolskiego.

Przykładowo, realizacja projektu *Zakup tomografu komputerowego, mammografu, elektroencefalografu przez SP ZOZ w Głubczycach* pozytywnie wpłynęła na zadania z zakresu specjalistycznej diagnostyki w zakresie wykrywania patologii mózgu, tj. wykrywanie zmian naczyniowych (guzy, tętniaki), wykrywanie udarów, leczenie zmian i zaburzeń neurologicznych. W zakresie specjalistyki onkologicznej projekt stworzył możliwości wykrywania zmian nowotworowych piersi i ich leczenia.

Realizacja projektu *Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku* przyczyniła się do poprawy diagnostyki kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt. W ramach projektu zakupiono ultrasonograf z możliwością obrazowania 4D, aparat do znieczuleń dorosłych, dzieci i noworodków, system nadzoru okołoporodowego do nadzoru ciąży patologicznej i porodu oraz kardiogram.

Ponadto, projekty szpitali z Nisy, Strzelec Opolskich czy Głuchołaz przyczyniają się bezpośrednio do zmniejszenia zachorowalności oraz umieralności z powodu nowotworów płuc, piersi, czy przewodu pokarmowego.

Dzięki zakupionemu sprzętowi na potrzeby *stacjonarnej opieki medycznej* wzrasta wczesna wykrywalność chorób, szczególnie w dziedzinie onkologii, kardiologii, hematologii i neurologii; poprawiła się precyzja i liczba wykonywanych badań. Przeprowadzane są one za pomocą nowoczesnej aparatury, dzięki czemu są bardziej bezpieczne dla pacjentów, a prowadzona z ich pomocą diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia dokładniejszy i pełniejszy obraz. Nastąpiła poprawa dostępności do nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki, skrócenie czasu oczekiwania na badania i specjalistyczną diagnozę. To wszystko w perspektywie długoterminowej przełoży się na obniżenie śmiertelności i poprawę zdrowia mieszkańców regionu. Dane te potwierdzają realizację głównych założeń Osi priorytetowej 5 w obszarze zdrowia, ujęte w RPO WO 2007-2013.

Ambulatoryjna opieka medyczna

Do końca czerwca 2011 r. zakończyła się ponadto realizacja **16** projektów w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*, w wyniku których wsparciem objęto **43 placówki medyczne**. Zakupiono **181 szt.** specjalistycznej aparatury medycznej (m.in. aparaty ultrasonograficzne, rentgenowskie, EKG, USG, EMG), na której będzie można przeprowadzić ponad **210 tys. badań rocznie**. Szacuje się, że liczba osób korzystających z usług ambulatoryjnej opieki medycznej przekroczy **33 tys. osób rocznie**. Ponadto, w wyniku realizacji projektów budynki przychodni zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez instalację wind czy budowę podjazdów.

Jednym ze zrealizowanych projektów w okresie sprawozdawczym jest *Rozbudowa NZOZ Domed w Zimnicach Wielkich*, w ramach którego powstały nowe gabinety lekarskie, punkt szczepień, gabinet zabiegowy oraz nowa poczekalnia i pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażono w niezbędne urządzenia oraz podstawowy sprzęt medyczny.

Dzięki projektowi poprawie uległa infrastruktura lokalnego ośrodka zdrowia. Mieszkańcy gminy Prószków zyskali dostęp do wysokiej jakości usług medycznych w ramach podstawowej, ambulatoryjnej opieki medycznej i rehabilitacji. Leczenie pacjentów w nowych pomieszczeniach gwarantuje bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych. Osoby starsze, w dużej części z obszarów wiejskich, zyskały bezpośredni dostęp do opieki medycznej w miejscu zamieszkania.

Warto zauważyć, że beneficjent jest w trakcie realizacji projektu komplementarnego *Wyposażenie nowopowstałej przychodni w Zimnicach Wielkich w nowoczesny sprzęt medyczny*. Zakup nowoczesnego wyposażenia diagnostycznego (m.in. ultrasonograf, aparat EKG, spirometr, unit ginekologiczny, unit laryngologiczny) i terapeutycznego (aparat do magnetoterapii, elektroterapii, krioterapii, kardiowersji itp.) pozwoli na uzbrojenie szeregu gabinetów specjalistycznych, nadanie im

odpowiedniej funkcjonalności w pełnym wymiarze oraz umożliwi przeprowadzanie ok. **1 000 badań rocznie**. Bardzo istotnym jest fakt, iż obok urządzeń służących prowadzeniu badań medycznych w kilku różnych specjalnościach przychodnia wyposażona zostanie w zróżnicowane bogate zaplecze dla świadczenia rehabilitacji, co pozwoli na zapewnienie możliwie szybkiego przywracania pacjentów do sprawności po przebytych urazach i chorobach.

Warty zauważenia jest także projekt zrealizowany przez Brzeskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia *Zakup urządzeń oraz specjalistycznej aparatury medycznej w celu poprawy świadczonych usług medycznych ambulatoryjnej opieki medycznej w Województwie Opolskim*. W ramach projektu zakupiono mammograf oraz samochód z zabudową typu mammobus, na którym będzie przeprowadzanych **11 tys. badań przesiewowych rocznie** w ramach profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi, w tym ok. 60% badań na terenach wiejskich.

Dzięki realizacji zadania czas oczekiwania na usługę medyczną skróci się dość znacząco, gdyż dzięki mammobusowi badania będą mogły być wykonywane bezpośrednio w miejscowości, w której planowane jest przebadanie odpowiedniej ilości kobiet. Dzięki nowoczesnej i nowej aparaturze skróci się czas oczekiwania nie tylko na usługę wykonywania badania, ale również na odbiór wyników tych badań, co w kontekście profilaktyki zwalczania raka piersi jest niezmiernie ważnym elementem.

Obszar: *Kultura i dziedzictwo kulturowe*

W ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* wspierane są przedsięwzięcia dotyczące rozwoju infrastruktury instytucji kultury, tworzenia urozmaiconej oferty kulturowej regionu, ochrony zabytków i dziedzictwa kultury oraz dziedzictwa naturalnego wspomagające społeczno-gospodarczy rozwój regionu.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **26** projektów w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*, w tym **16** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego* oraz *naturalnego* i **10** z zakresu *kultury*. Realizacja **16** projektów już się zakończyła, w tym **12** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego i naturalnego* oraz **4** projektów z zakresu *kultury*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **4** instytucje kultury, co stanowi 133% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r.,
- w przebudowywanych **4** obiektach instytucji kultury oraz w **5** obiektach dziedzictwa kulturowego został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **38** obiektów/zbiorów zostało poddanych konserwacji, a **10** zostało zabezpieczonych,
- szacuje się, że ponad **296 tys.** osób rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.

Przebudowane i odnowione obiekty dziedzictwa kulturowego w ramach RPO WO 2007-2013 to m.in. zabytkowe kościoły (pw. Trójcy Świętej w Bierawie, oo. Franciszkanów w Głogówku, św. Anny w Oleśnie), ratusze miejskie (Strzelce Opolskie, Grodków, Byczyna) czy place i parki miejskie (Leśnica, Włodzienin). Konserwacji i digitalizacji poddano także bezcenny zabytkowy księgozbiór Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Interesujący projekt, zakończony w okresie sprawozdawczym, zrealizowała Gmina Byczyna. W jego ramach zaadaptowano poddasze i wieżę Ratusza w Byczynie na potrzeby Izby Tradycji i punktu widokowego, z którego można obserwować zabytkowy układ urbanistyczny miasta, który jako jeden z dwóch na Opolszczyźnie jest otoczony niemal w całości zachowanymi murami obronnymi. Realizacja projektu gwarantuje ułatwienie dostępu do atrakcji, obiektów turystycznych i kulturalnych, wydłużenie sezonu turystycznego, zapewnienie możliwości kształtowania świadomości kulturowej osób korzystających z dóbr stworzonych w ramach projektu.

W godzinach funkcjonowania Izby Tradycji możliwa jest edukacja historyczna dzieci i młodzieży szkolnej oraz uczestnictwo w zajęciach patriotyzmu lokalnego. Ponadto, jest ona idealnym miejscem do organizowania Europejskich Dni Dziedzictwa i wszelkiego rodzaju wystaw związanych z życiem Gminy Byczyna. Szacuje się, począwszy od 2011 roku, że liczba osób odwiedzających obiekt wyniesie około **1 500** rocznie.

Niezwykle cennym z punktu widzenia dbałości o dziedzictwo kulturowe Opolszczyzny jest także projekt zrealizowany przez Powiat Opolski *Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego – w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach – w Zespole Szkół w Tułowicach*. Obydwa obiekty posiadają ważne miejsce wśród kluczowych zabytków regionu świadczących o jego bogatej historii i tradycji.

Na Zamku w Prószkowie dokonano konserwacji elewacji, sali rycerskiej i kaplicy, które wpisane są do rejestru zabytków. Uważane za jedno ze sztandarowych dzieł renesansu śląskiego, posiadają bezcenną wartość zabytkową, artystyczną i historyczną. W neorenesansowym pałacu w Tułowicach, otoczonym parkiem krajobrazowym z zachowanymi egzotycznymi gatunkami roślin, przeprowadzono remont więźby dachowej i wymianę połączeń dachowej, mający zapobiec dewastacji budynku wodami deszczowymi.

W zmodernizowanych obiektach przewidziano cykliczną organizację m.in. koncertów „Muzyka na Zamku” czy przeglądy chórów, sygnalistów myśliwskich. Organizowane będą także plenery malarskie. Przewiduje się, że liczba osób odwiedzających obiekty wyniesie ponad **9 000** rocznie.

W ramach działania 5.3 zrealizowano także 4 projekty z zakresu kultury, w ramach których utworzono Centrum Spotkań Jazzowych w Rudnikach, odnowiono Dom Kultury w Krakowicach oraz sale widowiskowo-konferencyjne w Głuchołazach i Białej. Dzięki tym projektom zyskano wielofunkcyjne obiekty przeznaczone do organizowania imprez oraz widowisk typowo kulturalnych. Ma to bezpośredni wpływ na zachowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzrost znaczenia kultury poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych skutkujących zwiększeniem uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie z *zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego* przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

- wsparciem zostanie objętych **9** instytucji kultury,
- w **10** obiektach instytucji kultury oraz **7** obiektach dziedzictwa kulturowego zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **40** obiektów/zbiorów zostanie poddanych konserwacji, a **13** zostanie zabezpieczonych,
- blisko **350 tys.** osób rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.

OSŃ PRIORYTETOWA 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*

Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach

Za wdrażanie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013.

Na realizację przedmiotowej Osi przeznaczono kwotę **34 171 585,04 Euro**, co stanowi **8%** alokacji na program.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym przemysłowym i powojkowym).

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca nie napotkała na problemy związane z wdrażaniem Osi priorytetowej 6.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **4 nabory wniosków**, w tym **3 w ramach procedury konkursowej** oraz **1 w procedurze pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **37,9 mln Euro**, w tym: na nabory w procedurze konkursowej **33,44 mln Euro**. Na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualny projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF* przewidziano **4,46mln Euro**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **60 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **317,61 mln PLN**, w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **208,28 mln PLN**,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **56 wniosków** na całkowitą wartość **291,76 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **191,33 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **41 projektów**, na całkowitą wartość **241,32 mln PLN**, w tym dofinansowanie EFRR **151,38 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **36 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **189,93 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **128,03 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł blisko **94%**.

Wnioski o płatność


⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **24,72 mln PLN**, co stanowi ponad **18%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **23,67 mln PLN**, co stanowi ponad **17%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.


Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 21-22*.

Wykres 21. Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

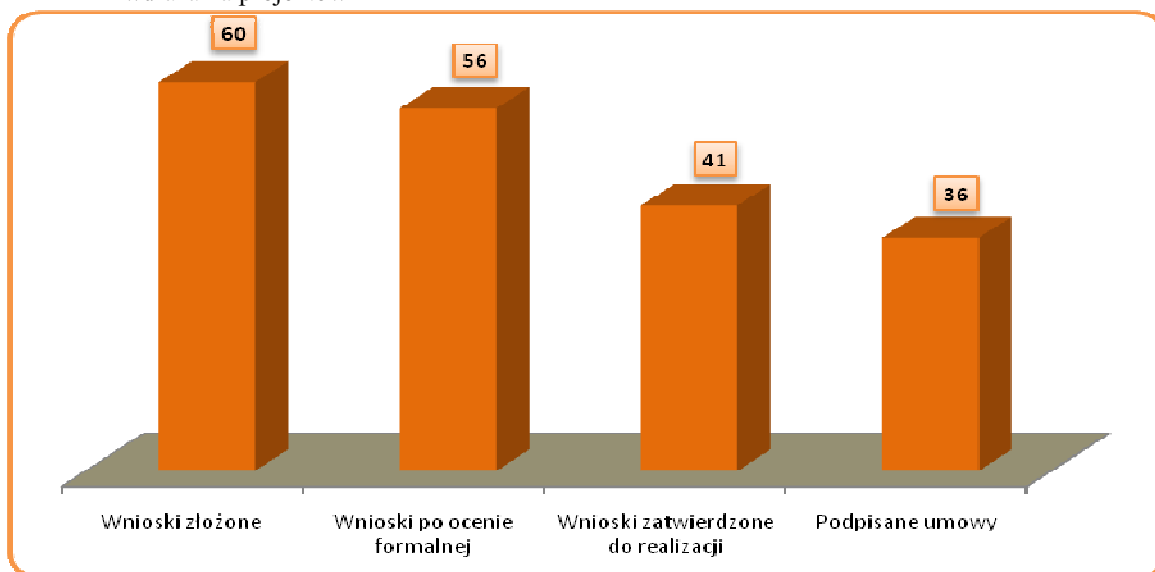

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 22. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

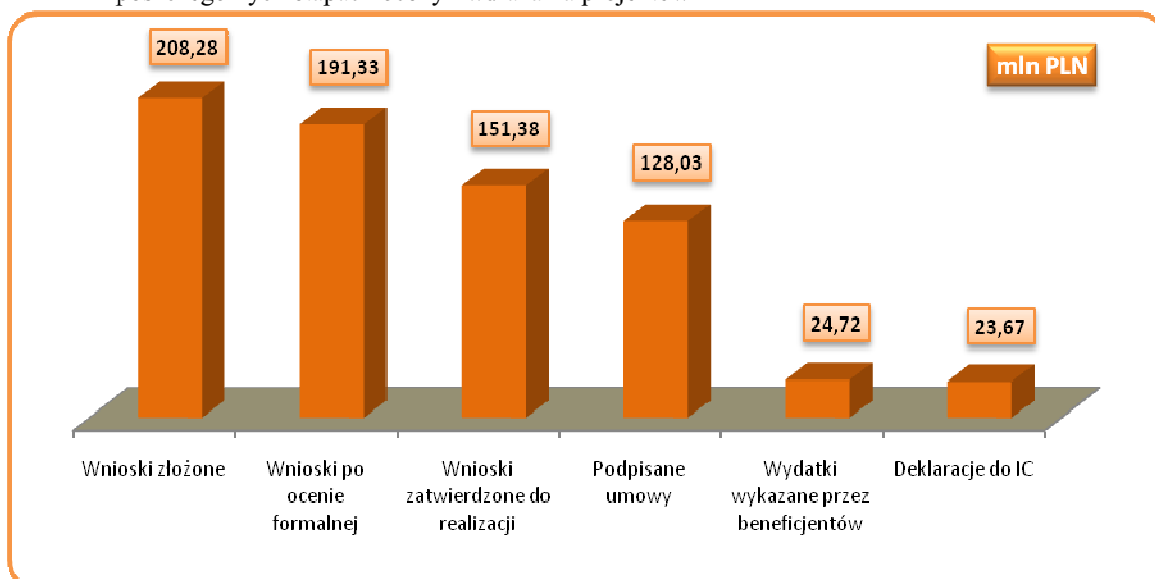

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ w okresie sprawozdawczym nie został przeprowadzony żaden nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 6.

Wnioski złożone

⇒ w okresie sprawozdawczym pozytywnie pod względem formalnym oceniono **28 wniosków** złożonych w ramach II naboru do działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Ich całkowita wartość wyniosła **112,67 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **73,09 mln PLN**.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **22 projekty** w ramach II naboru do działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*.

⇒ całkowita wartość projektów zaakceptowanych do realizacji wyniosła **97,66 mln PLN**, a dofinansowanie z EFRR **62,29 mln PLN**.

Podpisane umowy

⇒ zawarto **18 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **75,87 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **52,59 mln PLN**.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **2,09 mln PLN**, co stanowi około **1,5%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6. Wydatki te wykazano w ramach następujących działań:

- 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* – **1,55 mln PLN**,
- 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* – **0,54 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **2,86 mln PLN**, co stanowi ponad **2%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabeli 15.

Tabela 15. Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nr i termin naboru	Złożone		Zakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich						
II nabór (16-30.09.2010 r.)	<i>nie złożono wniosków</i>		22	62,29	18	52,59
OGÓŁEM	0	0,00	22	62,29	18	52,29

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 24 maja 2011 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 6.

Jednakże, dodatkowe nabory wniosków mogą zostać przeprowadzone w sytuacji wystąpienia oszczędności w ramach Osi priorytetowej 6.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest **36** projektów, w tym **25** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz **11** projektów z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

W ramach Osi priorytetowej 6 założono realizację 3 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. W związku z tym, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów, żaden ze wskaźników nie jest realizowany. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione jedynie na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie (szacowana realizacja).

Tabela 16. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
6.1	<i>Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast [szt.]</i>	8	0	25
6.2	<i>Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii [szt.]</i>	4	0	1
6.3	<i>Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych [szt.]</i>	4	0	12
Wskaźniki rezultatu				
6.4	<i>Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym: [km²]</i>	0,191	0	1,89
a	<i>miejskich [km²]</i>	0,122	0	1,77
b	<i>zdegradowanych [km²]</i>	0,069	0	0,12
6.5	<i>Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych (etat)</i>	nieoszacowana	0	36

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku I.

Porównując poziom kontraktacji (szacowanej realizacji) z założoną wartością docelową w 2015 r., należy stwierdzić, iż wartość większości wskaźników w Osi 6 zostanie przekroczona. Wynika to ze zmiany założeń metodologicznych przyjętych na etapie programowania. W ramach śródkresowego przeglądu Programu, który zakończy się do końca 2011 r. dokonane zostaną zmiany w części wskaźników na poziomie RPO WO 2007-2013.

Zagrożony nieosiągnięciem wydaje się być wskaźnik *Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii*, którego poziom realizacji wyniesie 25% (po zakończeniu realizacji wszystkich podpisanych do końca czerwca 2011 r. umów). Biorąc pod uwagę fakt, że nie zakończył się proces kontraktacji w ramach II naboru 6.1, wartość wskaźnika może ulec zwiększeniu.

Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich

W zakresie rewitalizacji obszarów miejskich obecnie realizowanych jest **25** projektów na terenie 14 miast Opolszczyzny (do końca czerwca 2011 r. nie podpisano żadnej umowy dla miasta Głuchołazy). Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się do rozwoju miast i terenów przyległych jako pól wzrostu gospodarczego oraz będzie wpływać w sposób zrównoważony na rozwój całego

województwa. W efekcie powinna doprowadzić do osiągnięcia spójności społeczno-gospodarczej na obszarach miejskich, podnoszenia ich atrakcyjności, wspierania wzrostu i tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy.

Na podstawie analizy podpisanych umów o dofinansowanie szacuje się, że wskaźnik *Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast* zostanie zrealizowany na poziomie ok. 312% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej. Natomiast *Powierzchnia obszarów miejskich poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu* wyniesie **177 ha**, co stanowi ponad 1 440% realizacji wartości docelowej określonej na etapie programowania.

W okresie sprawozdawczym zakończono proces oceny i wyboru projektów w ramach II naboru 6.1 oraz podpisano większość umów dla miast: Brzeg, Głogówek, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Lewin Brzeski, Namysłów, Opole, Paczków.

Przykładowo, na terenie Opola do realizacji wybrano 5 projektów. Poprzez realizację inwestycji *Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu* przywrócone zostaną wartości estetyczne i historyczne zabytkowego parku, co zdecydowanie poprawi ład przestrzenny miasta. Uporządkowanie terenu i montaż małej architektury pozwolą na lepsze wykorzystanie parku i podniesienie walorów estetycznych tej zaniedbanej do tej pory części miasta. Stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji podniesie atrakcyjność Opola w sferze społeczno-gospodarczej i zaspokoi istotne potrzeby mieszkańców.

Dawny blask odzyskają oraz nowe funkcje otrzymają budynki, w których obecnie mieszczą się Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Zniweluje to częściowo problem zaniedbanych i zdegradowanych struktur przestrzennych Śródmieścia, zdefiniowanych w *Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Opola na lata 2007-2015*.

Dzięki realizacji projektu *Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie* nastąpi poprawa estetyki i ładu przestrzennego dzielnicy Nowa Wieś Królewska. Zabytkowy obiekt, w którym dawniej mieściła się szkoła, zyska nowe funkcje (stacjonarne hospicjum dla dorosłych) oraz wypełni lukę na rynku usług opieki paliatywnej.

Prace renowacyjne zostaną przeprowadzone także w najstarszej opolskiej świątyni, której początki sięgają X wieku, kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha. W ramach projektu przeprowadzona zostanie m.in. renowacja zabytkowych organów kościelnych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana pokrycia dachu czy remont elewacji kościoła.

Gmina Paczków dzięki realizacji projektu *Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie* wyraźnie poprawi atrakcyjność i estetykę historycznego centrum miasta. W ramach rewitalizacyjnych przedsięwzięć przeprowadzone zostaną m.in. remonty trzech wież bramnych, renowacja wież i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową, a także montaż iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa (murów obronnych, wież bramnych i ratusza), instalacja nowego oświetlenia ulicznego na terenie plant miejskich oraz rewitalizacja otoczenia i remont elewacji budynku głównego ratusza wraz z jego wieżą.

Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

W ramach działania 6.2 realizowanych jest **11** projektów, z których realizacja żadnego jeszcze się nie zakończyła. Na terenach przemysłowych, powojkowych i zdegradowanych środowiskowo wspierane są działania na rzecz pobudzania rozwoju gospodarczego, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawy warunków wzrostu zatrudnienia. Mają przywracać możliwość sprawnego działania przez zmianę ich struktury i umieszczenie nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni poprzez wniesienie nowej jakościowo zmiany.

Po zrealizowaniu wszystkich projektów szacuje się, iż *Powierzchnia obszarów zdegradowanych poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu* wyniesie ok. **12 ha**, co stanowi 174% realizacji wartości docelowej wskaźnika określonej na etapie programowania. Ponadto, projekty przyczynią się do powstania **36** miejsc pracy na obszarach zdegradowanych⁶.

⁶ Zmiana wartości wskaźników wynika z błędnych wartości przedstawionych w poprzednim sprawozdaniu.

Ciekawym i niezwykle cennym ze względów historycznych przedsięwzięciem jest *Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi*. XVII-wieczny zamek należący w przeszłości do rodziny Opersdorffów (obecnie własność gminy) zostanie pokryty dachem, odtworzone zostaną ściany konstrukcyjne i stropy oraz wstawiona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Zmodernizowane zostaną także wnętrza zamku. Na parterze budynku planuje się utworzyć salę koncertową, która będzie mogła pełnić również funkcję galerii. Projekt przyczyni się do stworzenia warunków dalszego rozwoju zamku zwiększając tym samym atrakcyjność gospodarczo-inwestycyjną gminy. Dzięki projektowi powstanie miejsce spotkań dla społeczności lokalnej.

Ponadto, jako przykładowe, można wskazać inwestycje w Korfantowie. Realizacja projektu *Adaptacja zabytkowej remizy OSP na centrum społeczno-kulturalno-edukacyjne w Korfantowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego* wpłynie korzystnie na wszystkie najważniejsze sfery życia mieszkańców. Przeprowadzenie gruntownej modernizacji nieużytkowanej remizy uratuje przed zniszczeniem unikalny w skali województwa opolskiego zabytek z ok. 1910 r. Przywróci nie tylko dawną świetność obiektowi architektonicznemu, ale także stworzy dla niego nowe funkcje. Przewiduje się bowiem rewaloryzację budynku wraz z przystosowaniem go na potrzeby społeczno-kulturalno-edukacyjne. Na parterze budynku zaprojektowano sale biblioteczne oraz sale wystawiennicze. Na piętrze mieścić się będzie tradycyjna czytelnia oraz czytelnia internetowa. W salach wystawowych planuje się stałą wystawę muzealną poświęconą historii i rozwojowi gminy oraz historii straży pożarnej na tym terenie. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, ze wszystkich funkcji Centrum będą mogły korzystać także osoby niepełnosprawne.

Drugą inwestycją na obszarach zdegradowanych w Korfantowie jest *Rozbudowa i przebudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie*. Projekt ma na celu nadanie nowych funkcji społecznych przestrzeni poprodukcyjnej obiektu pawilonów łóżkowych, a także jego rozbudowę o blok operacyjny z centralną sterylizatornią, a przez to zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej terenu zdegradowanego oraz stworzenie nowych warunków dla wzrostu zatrudnienia na tym terenie. Dzięki projektowi możliwe stanie się umieszczenie całej działalności medycznej w jednym budynku. Zniwelowany zostanie tym samym problem rozproszenia działalności rehabilitacyjno-ortopedycznej. Ponadto, w ramach projektu powstaną chodniki, parkingi i dojścia wokół kompleksu szpitalnego.

Pozostałe projekty w ramach działania 6.2 realizowane są na terenie Opola, Branic, Nysy, Grodkowa, Strzelec Opolskich, Karłowic i zostały szczegółowo opisane w poprzednich sprawozdaniach. W głównej mierze mają na celu nadanie nowych funkcji obiektom i terenom zdegradowanym. Zapewniają poprawę ich estetyki i atrakcyjności, zwiększając tym samym ich wartość społeczną. W konsekwencji eliminują niekorzystne zjawiska społeczne występujące na tych terenach, które w istotny sposób zmniejszają ich funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców.

Spośród 36 projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 6, aż 1/3 zakłada zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów, na których projekty są realizowane. Zakończenie realizacji wszystkich dotychczas podpisanych umów pozwoli na osiągnięcie wskaźnika *Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* na poziomie 300% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej.

OŚ PRIORYTETOWA 7 *Pomoc techniczna*

Ze środków Osi priorytetowej 7 realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Na jej realizację przeznaczono **12 814 344,39 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **3%** alokacji Programu.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia wspierające IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono istotnych problemów we wdrażaniu pomocy technicznej RPO WO 2007-2013.

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach Osi przedstawiono w punkcie 6. *Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej.*

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **10 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **52,88 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **44,95 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **4 umowy o dofinansowanie** oraz podjęto **4 decyzje o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **41,44 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **35,23 mln PLN**,
- ⇒ poziom kontrakcji w ramach Osi priorytetowej wyniósł prawie **69%**.

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **26,51 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **25,39 mln PLN**, co stanowi ponad **49%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi priorytetowej 7 od początku uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresie 23*.

Wykres 23. Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów

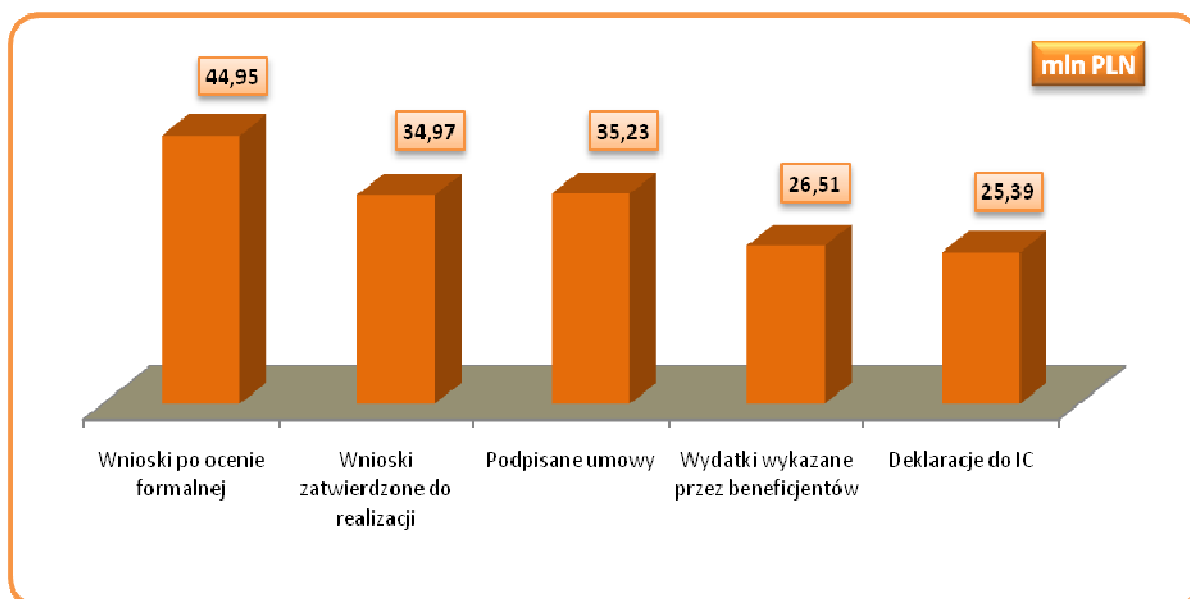

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ w okresie sprawozdawczym pozytywną ocenę formalną otrzymały **2 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**.
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **11,74 mln PLN**, w tym dofinansowanie z EFRR **9,98 mln PLN**.

Podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 7.

Tabela 17. Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013 – podpisane umowy/ wydane decyzje w I półroczu 2011 r. i od uruchomienia Programu

Lp.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	Liczba umów/ decyzji		Wartość całkowita podpisanych umów/ podjętych decyzji	
		w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu
1.	IZ RPO WO 2007-2013	0	4	0,00	27,18
2.	IP II stopnia	0	4	0,00	14,26
	SUMA	0	8	0,00	41,44

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **3,67 mln PLN**.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **4,41 mln PLN**, co stanowi około **9%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 7.

Postęp rzeczowy

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest łącznie **8 RPDzPT**. Według stanu na 30 czerwca 2011 r. zakończyła się realizacja **6 RPDzPT** (na lata 2007-2008, na rok 2009 r. oraz na rok 2010 r.).

W ramach Osi priorytetowej 7 założono realizację 6 wskaźników produktu oraz 4 wskaźników rezultatu. Wszystkie wskaźniki są obecnie realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentuje *Tabela 18*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 30 czerwca 2011 r.

Tabela 18. Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
7.1	<i>Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: [etat]</i>	105	117,25	123,5
a	<i>kobiety</i>	78	95,75	96
b	<i>mężczyźni</i>	27	21,50	27,5
7.2	<i>Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) [szt.]</i>	232	110	111
7.3	<i>Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów [szt.]</i>	500	336	361
7.4	<i>Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów [szt.]</i>	63	26	45
Wskaźniki rezultatu				
7.5	<i>Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu [osoby]</i>	14 000	7 727	7 096
7.6	<i>Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych [osoby]</i>	25 500	57 397	50 622
7.7	<i>Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych [szt.]</i>	180 000	754 416	457 147
7.8	<i>Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym [%]</i>	80	72	82,5

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz RPDzPT na lata 2007-2008, 2009 oraz 2010. Zgodnie z danymi w *Załączniku I*.

Poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej 7 wyniósł około **69%**. Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę szacowaną realizację, część wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Wynika to ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych w ramach Osi 7. W przypadku pozostałych wskaźników wartości ulegną zmianie z uwagi na planowane do realizacji w kolejnych latach RPDzPT.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomu realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej w ramach Osi 7.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie instytucjonalne Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Środki alokowane w ramach Osi 7 przeznaczane są na wsparcie procesów wdrażania RPO WO 2007-2013, tj. naboru, oceny i wyboru projektów, a także monitoringu i kontroli. Przedsięwzięcia te dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wsparcia kadrowego, tj. zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Druga zakłada wzmocnienie organizacyjno – techniczne procesu wdrażania. Obejmuje ona działania związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu, ale także sporządzanie ekspertyz, analiz oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

Obszar: *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola*

Właściwa realizacja zapisów RPO WO 2007-2013 zależy w dużej mierze od zdolności administracyjnych instytucji zaangażowanych w proces jego wdrażania.

W ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT wskaźnik *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej* wyniósł **117,25 etatów**, w tym **95,75 etatów** stanowią kobiety, natomiast **21,5 etatów** - mężczyźni. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wartość wskaźnika wzrosła o około 8%. Jednocześnie biorąc pod uwagę realizowany obecnie RPDzPT na 2011 r. przedmiotowy wskaźnik osiągnie wartość na poziomie 123,5 etatów, co będzie stanowiło około 118% w stosunku do założonej na etapie programowania wartości docelowej.

Ponadto, w celu zagwarantowania odpowiednich zasobów kadrowych pozwalających na prawidłowe i efektywne zarządzanie Programem, jego wdrażanie, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 oraz Instytucja Pośrednicząca II stopnia zapewniają finansowanie udziału pracowników w różnych formach kształcenia zawodowego w obszarze wdrażania funduszy strukturalnych, w tym m.in. w studiach podyplomowych oraz kursach językowych.

Sprawną pracę osób zaangażowanych w realizację programu, a co za tym idzie efektywne wykorzystanie środków funduszy strukturalnych warunkuje odpowiednie przygotowanie miejsc pracy wraz z ich kompletnym i nowoczesnym wyposażeniem. Od uruchomienia Programu zakupiono **110** sztuk zestawów komputerowych, co stanowi ponad **47%** założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)*. Biorąc pod uwagę realizację RPDzPT w kolejnych latach wdrażania Programu, przewiduje się, iż wartość ww. wskaźnika ulegnie zwiększeniu.

Obszar: *Ocena, badania/expertyzy, informacja i komunikacja*

Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi priorytetowej 7 realizacja działań informacyjno-promocyjnych umożliwi rozpropagowanie wiedzy na temat Programu, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie dostępu i możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych. Ponadto, promocja Programu służy podniesieniu poziomu opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia.

Od uruchomienia Programu przeprowadzono **336** szkoleń, konferencji i seminariów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło ponad **7 700 osób**. Organizacja różnego rodzaju spotkań z beneficjentami zwiększyła dostęp do informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także przybliżyła zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Biorąc pod uwagę RPDzPT na 2011 r. przewiduje się, iż

wskaźnik *liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów* osiągnie poziom ponad **72%** w stosunku do założonej dla niego wartości docelowej.

W ramach RPDzPT na 2011 r. w okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w dwóch blokach tematycznych: przygotowanie projektu oraz rozliczenie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013. Zrealizowane tematy szkoleń dotyczyły: zarządzania projektem, przygotowania i realizacji projektów partnerskich (partnerstwa JST oraz partnerstwo publiczno-prawne) w ramach RPO WO 2007-2013, rozliczania projektów, w tym księgowania i kwalifikowalności kosztów, listy płac osób zatrudnionych w ramach projektu RPO WO 2007-2013, jak również zamówień publicznych finansowanych ze środków RPO WO 2007-2013.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym organizowano spotkania informacyjne dla beneficjentów m.in. z zakresu potencjalnych możliwości pozyskania środków z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, zasad kontraktacji, rozliczania i kontroli projektów. W związku ze zmianą zapisów w zakresie stosowania zamówień publicznych zorganizowano również cykl spotkań z beneficjentami w zakresie omówienia przedmiotowych zmian i ich wpływu na proces przygotowywania dokumentów do rozliczania.

W celu sprawnej i efektywnej realizacji Programu od początku wdrażania opracowano **26** ekspertyz i analiz. Wykonane ekspertyzy i analizy były odpowiedzią na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013 w obszarach wymagających dodatkowej specjalistycznej wiedzy, m.in. w zakresie stanu i potrzeb oferowanych usług medycznych, bioróżnorodności, liczenia efektywności kosztowej, przeszacowania wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013 czy opracowania kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi działań informacyjno-promocyjnych w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 realizowała szereg działań, w tym wyemitowała w radiu i telewizji cykl informacyjny w przystępny sposób prezentujący dotychczasowe doświadczenia beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WO 2007-2013 oraz zachęcający i motywujący potencjalnych beneficjentów do aplikowania w kolejnych konkursach. Każdy odcinek cyklu ukazywał odbiorcom nie tylko korzyści jakie przynosi realizacja przedmiotowych projektów, ale również problemy jakie napotykają beneficjenci funduszy unijnych. Cykl poprzez prezentację dobrych praktyk przybliżył beneficjentom, potencjalnym beneficjentom oraz opinii publicznej warunki ubiegania się o dofinansowanie i zasady realizacji projektów unijnych. W okresie sprawozdawczym wyemitowano materiały w obszarach: przedsiębiorczość, społeczeństwo informacyjne, turystyka, edukacja, kultura, rewitalizacja, transport, ochrona środowiska oraz ochrona zdrowia.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 kontynuowała ponadto podjęte wcześniej działania informacyjne, np. publikację Biuletynu Informacyjnego, ulotek, Informatora Europejskiego. W zakresie działań informacyjno-promocyjnych przygotowano również materiały promocyjne, które znalazły ponad **57 tys. odbiorców**. Zarówno IZ RPO WO 2007-2013 jak i IP II stopnia prowadziły strony internetowe (www.rpo.opolskie.pl oraz www.ocrg.opolskie.pl), na których na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty z zakresu wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom/ potencjalnym beneficjentom. Strony internetowe obu instytucji odwiedziło ponad **750 tys. osób**.


Wysoki odsetek wniosków złożonych poprawnych pod względem formalnym tj. **72%** oznacza iż dotychczas prowadzone działania informacyjno-promocyjne są skuteczne i zostały przeprowadzone w sposób adekwatny do wdrażania Programu.

Nakłady przeznaczone na wdrażanie Osi priorytetowej 7 wpłynęły na sprawną i efektywną realizację RPO WO 2007-2013. Poniesione wydatki umożliwiły sprawne funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez m.in.: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania RPO WO 2007-2013, doksztalcanie personelu, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawną i efektywną pracę.

III. Dokumenty zmieniane/opracowywane przez IZ RPO WO 2007-2013

IZ RPO WO 2007-2013, mając na celu usprawnienie wdrażania RPO WO 2007-2013 i zapewnienie właściwego poziomu realizacji projektów, opracowuje dokumenty o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego, dokumenty dla beneficjentów (*Schemat 1*).

Schemat 1. Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013

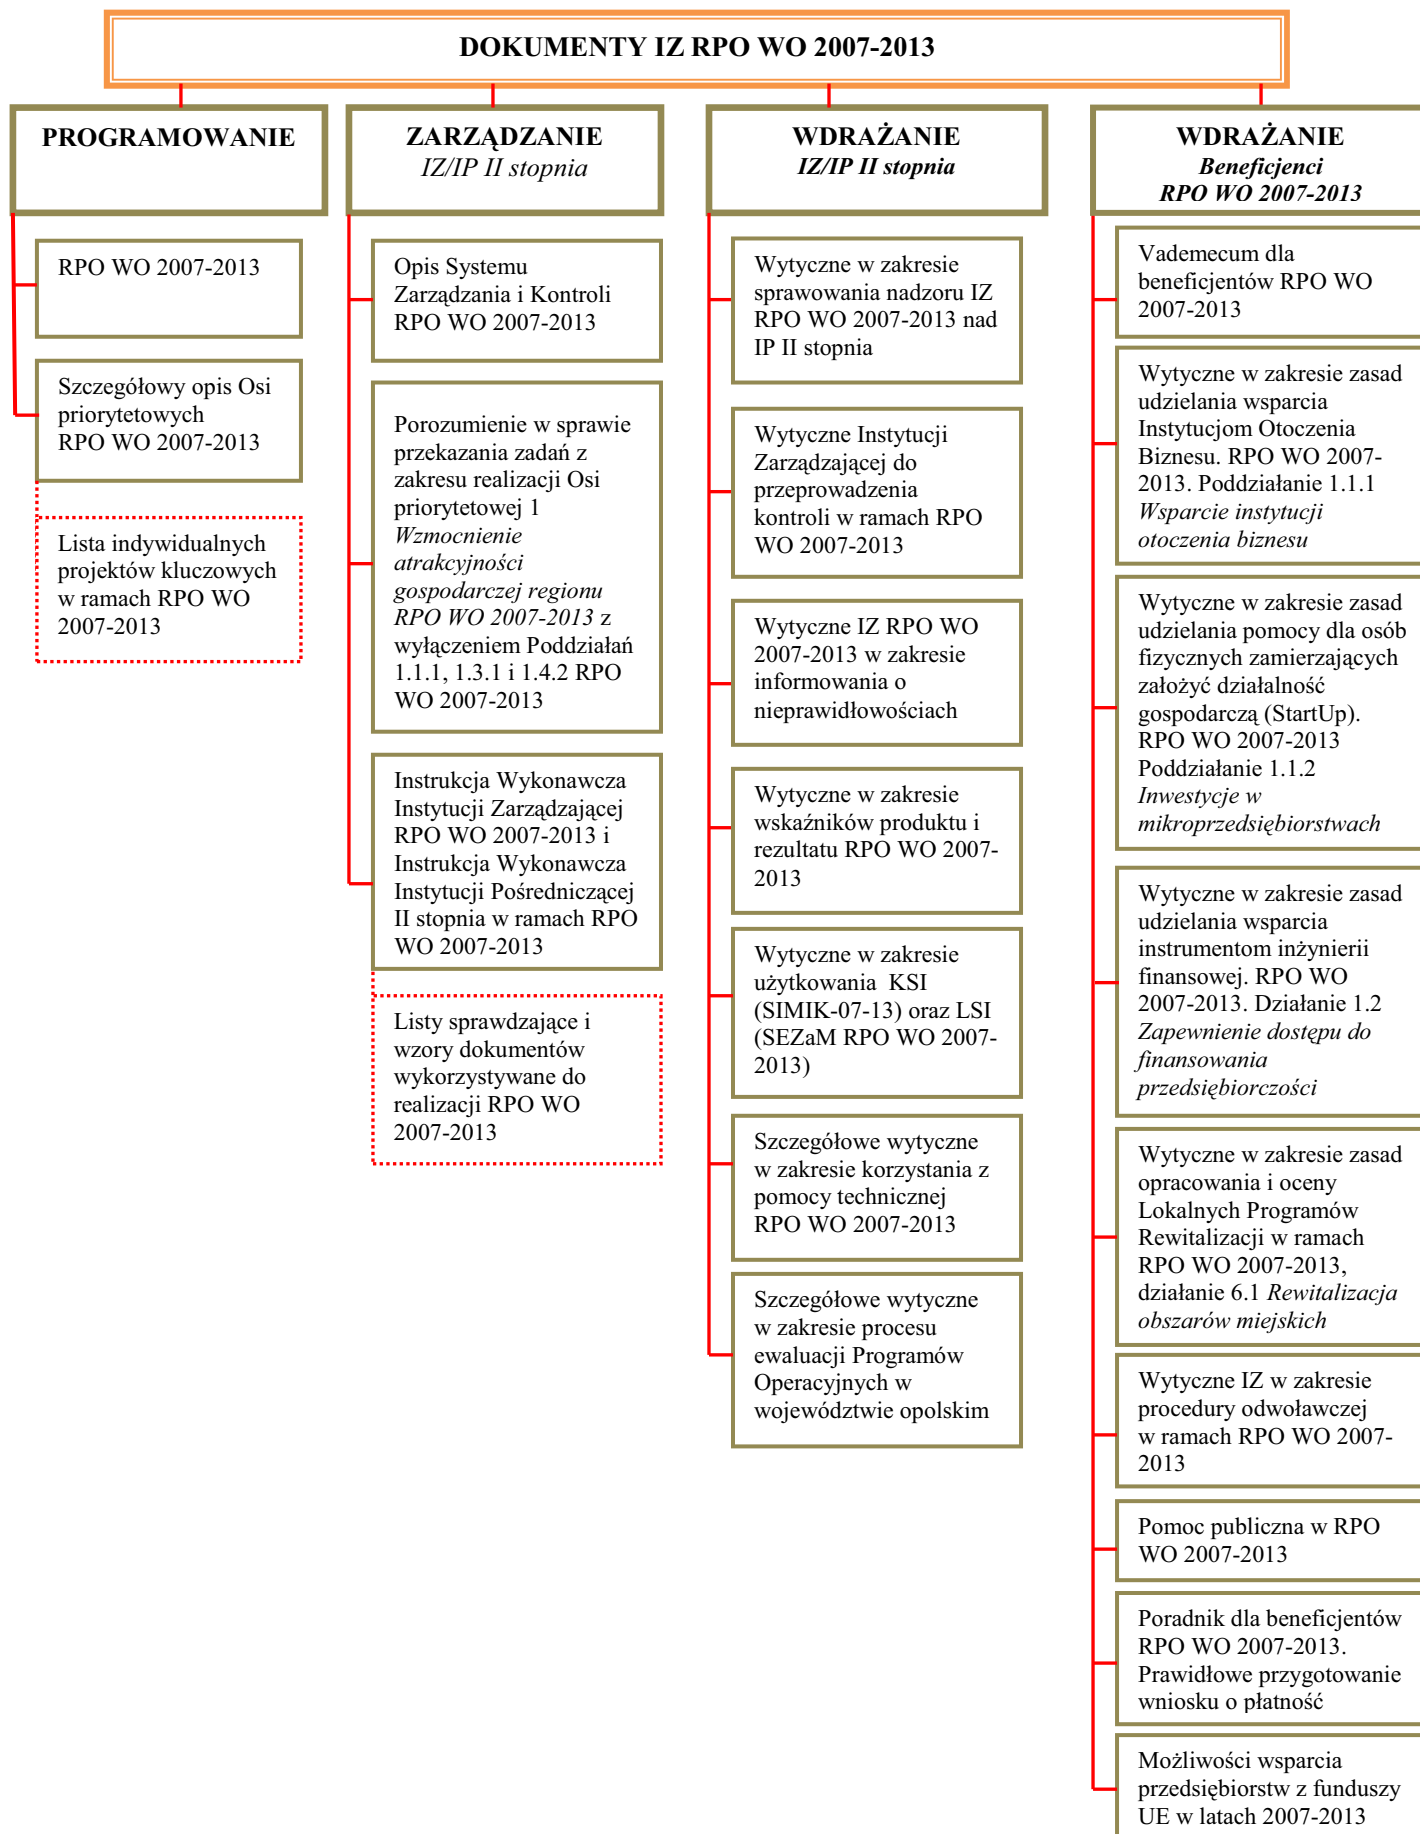

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała zadania związane z opracowaniem/zmianą następujących dokumentów:

Dokumenty programowe IZ RPO WO 2007-2013

➤ **Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1324/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 r. z późn. zm.

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 19.

Tabela 19. Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 360/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 lutego 2011 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiany alokacji w ramach poddziałania 5.2.1 <i>Stacjonarna opieka medyczna</i> i 5.2.2 <i>Ambulatoryjna opieka medyczna</i>, ▪ aktualizacja i doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013</i>. Zmiany dotyczyły kryteriów wyboru projektów w ramach działania 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i>.
<i>Uchwała nr 476/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 28 marca 2011 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiany alokacji w ramach poddziałania 5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</i> i 5.2.1 <i>Stacjonarna opieka medyczna</i>.
<i>Uchwała nr 614/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 kwietnia 2011 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmiany alokacji w ramach działania 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>, 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> i 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i>.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Dokumenty systemu instytucjonalnego IZ RPO WO 2007-2013

➤ **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1855/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm. Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 20. Zmiany wprowadzane do dokumentu są przedstawiane do zaopiniowania przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Tabela 20. Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 316/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2011 r.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach Procesu 1 <i>Wybór projektów</i> dokonano zmian polegających na wskazaniu Wicemarszałka Województwa jako osoby zatwierdzającej pisma powiadamiające beneficjentów o odrzuceniu wniosków na każdym etapie oceny projektów oraz Marszałka Województwa jako osoby, która zatwierdza pisma powiadamiające o wynikach wyboru/braku wyboru projektu do dofinansowania po podjęciu przez ZWO uchwały w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, ▪ w ramach Procesu 3 <i>Rozliczanie projektów</i> zaktualizowano termin losowania próby beneficjentów do kontroli oraz generowania raportów losowego wyłonienia beneficjentów,

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach Procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> dokonano zmian wynikających z aktualizacji <i>Procedury informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności</i> oraz nowych zasad obowiązujących w przypadku nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE. Ponadto, wprowadzono zmiany polegające na przekazywaniu w ramach Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych informacji o wysłanych raportach i zestawieniach dotyczących nieprawidłowości, celem uaktualnienia danych zawartych w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13).
<p><i>Uchwała nr 612/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zmodyfikowano zapisy dokumentu pod kątem aktualizacji <i>Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013</i>, ▪ w ramach Procesu 1 <i>Wybór projektów</i> dokonano zmian polegających na kierowaniu treści ogłoszenia oraz treści informacji dotyczącej zakończenia naboru wniosków na posiedzenie ZWO przez Marszałka Województwa, ▪ uaktualniono zapisy Procesu 2 <i>Wdrażanie projektów</i> w związku z wydaniem <i>Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz. U. 2010 r., Nr 128, poz. 861), ▪ dostosowano zapisy Procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> pod kątem wdrożenia w IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia systemu informatycznego IMS, tj. <i>Irregularity Management System</i>, służącego do przekazywania informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, ▪ w ramach Procesu 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> dodano zapis dotyczący aktualizacji rejestru podmiotów wykluczonych oraz rejestru obciążeń na projekcie w przypadku wydania przez sąd orzeczenia z korzyścią dla beneficjenta, ▪ doprecyzowano terminy niektórych działań, m.in. w podprocesie dotyczącym weryfikacji wniosku o płatność.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1936/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r. z późn. zm.* Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego, zaprezentowanymi w Tabeli 21.

Tabela 21. Aktualizacja *Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 317/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 lutego 2011 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano treść całego dokumentu do nazw stanowisk i poszczególnych Działów OCRG wprowadzonych nowym <i>Regulaminem Organizacyjnym OCRG</i>, ▪ w ramach Procesu 3 <i>Rozliczanie projektów</i> dokonano zmian polegających na uwzględnieniu konieczności informowania Działu Rozliczeń Projektów o wszczęciu wizyt monitorujących,

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach Procesu 4 <i>Zarządzanie finansowe</i> wprowadzono zmiany polegające na uściśleniu procedury ujmowania w <i>Zapotrzebowaniu</i> aktualnych danych beneficjenta, ▪ dostosowano zapisy Procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> pod kątem obowiązujących zasad przekazywania informacji o nieprawidłowościach niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej do Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, ▪ w ramach Procesu 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> dodano obowiązek zgłoszenia beneficjenta do Rejestru Podmiotów Wykluczonych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
<p><i>Uchwała nr 655/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 10 maja 2011 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy całego dokumentu pod kątem obowiązujących Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie nieprawidłowości, kontroli i certyfikacji, ▪ uszczegółowiono zapisy Procesu 3 <i>Rozliczanie projektów</i> (kontrola na miejscu realizacji projektu) pod kątem weryfikacji formalno-prawnej przez radcę prawnego zaleceń powodujących skutki finansowe, ▪ dokonano zmian w ramach Procesu 5 <i>Sprawozdawczość i monitoring</i> w zakresie Działu odpowiedzialnego za przygotowanie <i>Informacji miesięcznej z realizacji RPO WO 2007-2013</i>, tj. z Działu Informacji Europejskiej (obecnie Działu Analiz Strategicznych i Informacji Europejskiej) na Dział Rozliczeń Projektów, ▪ dostosowano zapisy Procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> pod kątem wprowadzenia systemu informatycznego IMS, tj. <i>Irregularity Management System</i> służącego do przekazywania informacji o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, ▪ uszczegółowiono zapisy Procesu 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> dotyczące postępowania w przypadku wniesienia przez beneficjenta za pośrednictwem IZ RPO WO 2007-2013 skargi na decyzję administracyjną (dotyczy postępowania przed WSA i NSA).

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Dokumentem uzupełniającym do *Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2007-2013* oraz IP II stopnia są *Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO 2007-2013*, przyjęte przez Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych 30 listopada 2007 r. z późn. zm. W okresie sprawozdawczym dokument aktualizowano trzykrotnie.

➤ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1854/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm.* Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano *uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego*, zaprezentowaną w *Tabeli 22*.

Tabela 22. Aktualizacja *Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 784/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 czerwca 2011 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ do spisu podstawowych aktów prawnych dodano <i>Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i> (Dz. U. Nr 125 poz. 846), ▪ uaktualniono spis wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego, ▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem <i>Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach finansowych wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013</i>, w tym m.in. dodano

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<p>zapis, iż „W przypadku nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE, informacje przekazywane są wyłącznie do IPOC”,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ w części dotyczącej nieprawidłowości i kwot odzyskanych wprowadzono informacje nt. systemu IMS (Irregularity Management System) za pomocą którego zgłaszane są nieprawidłowości do Komisji Europejskiej, ▪ zaktualizowano zapisy punktu dotyczącego organizacji Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 2/2011 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień (...), ▪ uzupełniono zapisy ppkt. 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 o pkt. „Kontrola Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013”, ▪ doprecyzowano zapis dotyczący sporządzania dyspozycji przelewu poprzez określenie, iż to pracownicy Referatu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych oraz Działu Rozliczeń Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki sporządzają przedmiotową dyspozycję, ▪ zaktualizowano: Rozdział 4 Instytucja Certyfikująca, Rozdział 5 Instytucja Audytowa i Organy Audytowe i Rozdział 6 Systemy informatyczne zgodnie z wkładami przesłanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Dokumenty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013

➤ ***Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Składa się z trzech tomów:

- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013* – przyjęty uchwałą nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.

Dokument dostępny jest na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Aktualizacje zapisów ww. dokumentu, jakie zostały przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Zarząd Województwa Opolskiego, zaprezentowano w Tabeli 23.

Tabela 23. Aktualizacja *Vademecum* dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Podstawa aktualizacji dokumentu	Nr tomu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 283/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 4 lutego 2011 r.</i></p>	<p>II</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowano zapisy dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie w związku ze zmianą stawek podatku VAT od 1 stycznia 2011 r. [<i>Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej</i> (Dz. U. 2010 r., Nr 238, poz. 1578)], ▪ zmieniono nazwy wskaźników produktu dotyczące długości dróg powiatowych, ▪ dostosowano zapisy dokumentu w związku ze zmianą <i>Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</i>, ▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem treści Załącznika do <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie</i> (Dz. U. 2010 r., Nr 53, poz. 312 z późn. zm.).
<p><i>Uchwała nr 315/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 lutego 2011 r.</i></p>	<p>III</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu do treści <i>Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013</i> oraz umowy o dofinansowanie, ▪ w treści Załącznika nr 1 <i>Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność</i> wprowadzono definicję dochodu incydentalnego oraz zasady jego wykazywania we wnioskach o płatność, ▪ wprowadzono zapisy <i>Instrukcji wypełniania sprawozdania merytorycznego przez beneficjentów działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007-2013</i>, ▪ zaktualizowano podstawę prawną w związku ze zmianą tekstu jednolitego <i>Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</i> (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
<p><i>Uchwała nr 455/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 22 marca 2011 r.</i></p>	<p>III</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zapisy Załącznika 5 <i>Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy uzupełniono o kategorię nieprawidłowości: Nieprzestrzeganie w odpowiednim stopniu zasad jawności i przejrzystości.</i>
<p><i>Uchwała nr 774/2011 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 czerwca 2011 r.</i></p>	<p>III</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w Rozdziale 1.10 <i>Zakres stosowania prawa zamówień publicznych w ramach RPO WO 2007-2013</i> wprowadzono zmiany związane z zaleceniami Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, ▪ dodano zapisy Załącznika nr 7 <i>Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenia zasad udzielania zamówień współfinansowanych ze środków funduszy dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych</i> w związku z zaleceniami Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, ▪ w Załączniku 5 <i>Wskaźniki procentowe do obliczania wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych współfinansowanych ze środków funduszy</i> wprowadzono zmianę związaną z aktualizacją przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn. <i>Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.</i>

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne:

- **Wytyczne w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK-07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3714/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 sierpnia 2009 r. z późn. zm.,
- **Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3690/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 4 sierpnia 2009 r. z późn. zm.,
- **Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 1411/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 25 stycznia 2008r. z późn. zm.,
- **Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3162/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 kwietnia 2009 r.,
- **Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie informowania o nieprawidłowościach.** Dokument został zaakceptowany decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z 6 stycznia 2009 r. z późn. zm.

W okresie sprawozdawczym straciła moc uchwała nr 4151/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia **Szczegółowych wytycznych w zakresie ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** W ich miejsce uchwałą nr 456/2011 z 22 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął **Szczegółowe wytyczne w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim.** Ww. dokument opracowany został dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent regionalny), co zostało uzasadnione wnioskami audytu i kontroli.

Pozostałe opracowane przez IZ RPO WO 2007-2013 wytyczne i opracowania nie były aktualizowane w okresie sprawozdawczym.

Dokumenty dostępne są na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W I półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zidentyfikowała następujące problemy we wdrażaniu Programu dotyczące:

- **terminowości dostarczania przez beneficjentów dokumentacji do podpisywania umów, rezygnacji z podpisywania umów**

W okresie sprawozdawczym pojawił się problem dotyczący niedotrzymywania przez beneficjentów terminów dostarczania dokumentacji niezbędnej dla kontynuowania procesu podpisywania umów. Wystąpiły również przypadki rezygnacji beneficjentów z podpisania umowy o dofinansowanie. Wśród najczęstszych powodów rezygnacji z podpisania umowy wymienić można m.in.: zmianę statusu przedsiębiorcy, zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie czy realizację inwestycji w ramach innego programu operacyjnego.

Sytuacje takie wymagały kierowania spraw pod obrady Zarządu Województwa Opolskiego, który rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie.

Rezygnacja beneficjenta bądź decyzja ZWO o usunięciu go z listy projektów wybranych do dofinansowania, powodowała konieczność aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. W miejsce projektów usuniętych wybierano projekty z list rezerwowych.

Ponadto, w celu ograniczenia liczby przypadków niedotrzymywania przez beneficjentów terminów dostarczania dokumentacji niezbędnej do podpisywania umów o dofinansowanie, w okresie sprawozdawczym organizowano spotkania informacyjne dla beneficjentów, których tematyka obejmowała m.in. najważniejsze zasady determinujące prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady kontraktacji.

➤ ***przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych***

Beneficjenci RPO WO 2007-2013 na etapie realizacji projektów wielokrotnie zgłaszali problemy związane z przeciągającą się procedurą przetargową/nierozstrzygnięciem przetargów, co powodowało brak możliwości zakończenia realizacji projektów w terminie określonym na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W konsekwencji beneficjenci tych projektów wnioskowali do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 o możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotowych projektów, co skutkowało koniecznością aneksowania umów.

➤ ***zmiany stawek podatku VAT***

17 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 238 Poz. 1578 opublikowana została ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta wprowadziła w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zmianę stawek podatku VAT, która spowodowała od 1 stycznia 2011 r. podwyższenie dotychczasowych stawek podatku.

W celu jednolitego podejścia do problemu związanego z ujęciem zwiększonej stawki podatku VAT w projektach realizowanych w ramach Programu oraz kierując się interesem beneficjentów, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 w I kwartale 2011 r. wydała dla beneficjentów specjalną interpretację w tym zakresie. Interpretacja ta pozwoli na stosowanie jednolitych zasad postępowania w dwóch przypadkach, tj. gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny projektu. Zmiana stawek podatku VAT spowodowała konieczność aneksowania większości umów o dofinansowanie projektów. Przedmiotowa interpretacja została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 www.rpo.opolskie.pl.

W związku ze zmianą stawek podatku VAT, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 dostosowała również generator wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu w LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

➤ ***błędów we wnioskach o płatność***

Na etapie wdrażania projektów wystąpiły nieznaczne opóźnienia w realizacji Programu związane z pojawiającymi się błędami we wnioskach o płatność i koniecznością dokonywania korekt wniosków, co opóźniało rozliczenia poszczególnych projektów.

W celu ograniczenia ilości błędnie wypełnianych wniosków o płatność organizowano szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania i prawidłowego rozliczania wniosków o płatność. Na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 jest umieszczony *Poradnik dla Beneficjentów*, ułatwiający prawidłowe przygotowanie wniosków o płatność. Ponadto, pracownicy instytucji pozostają w stałym kontakcie z beneficjentami udzielając wszelkich wyjaśnień i wskazówek.

W okresie sprawozdawczym realizowano przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości wdrażania Programu, w tym miały miejsce m.in.:

- posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013);
- posiedzenia Zespołu Strategicznego;
- oraz badania ewaluacyjne.

Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Do końca czerwca 2011 r. miało miejsce łącznie **20 posiedzeń KM RPO WO 2007-2013**.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce **4 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013**. W związku z trwającym procesem renegotjacji RPO WO 2007-2013 był to najczęściej poruszany temat na posiedzeniach KM RPO WO 2007-2013.

Tabela 24. Terminy i tematy omawiane podczas posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w I półroczu 2011 r.

Termin spotkania	Tematy
14 lutego 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013,▪ omówienie wyników badania ewaluacyjnego pn. „Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia”,▪ przedstawienie propozycji zmian RPO WO 2007-2013,▪ przyjęcie zmian kryteriów wyboru projektów dla działania 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i>,
7 marca 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ podsumowanie konsultacji zmian RPO WO 2007-2013,▪ przedstawienie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za II półrocze 2010 r.),▪ omówienie <i>Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2011</i>,
9 maja 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ przedstawienie i przyjęcie projektu RPO WO 2007-2013,
10 czerwca 2011 r.	<ul style="list-style-type: none">▪ przedstawienie <i>Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> (za rok 2010),▪ zaprezentowanie informacji nt. procesu renegotjacji RPO WO 2007-2013,

XX posiedzenie KM RPO WO 2007-2013 miało jubileuszowy charakter. W jego obradach uczestniczył **Pan Pascal Boijmans** - Z-ca Dyrektora Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej.

Zespół Strategiczny RPO WO 2007-2013

Uchwałą nr 2861/2009 z 5 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego powołał *Zespół Strategiczny*, który ma na celu dbałość o skuteczne zarządzanie programem oraz intensyfikację, na wszystkich etapach realizacji projektów, działań Instytucji Zarządzającej dla lepszego wydatkowania środków w ramach Programu. Szczególną rolę *Zespół* spełnił w okresie starań o dodatkowe środki z KRW, wskazując i rekomendując konkretne działania.

Tym samym w okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2011 r. *Zespół* obradował **dwa razy**:

- **21 stycznia br.** na posiedzeniu omawiano wyniki KRW, planowane zmiany RPO WO 2007-2013 oraz obszary rekomendowane do wsparcia ze środków KRW,
- Natomiast **6 kwietnia br.** miało miejsce uroczyste posiedzenie, na którym przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 podziękowali członkom *Zespołu* za zaangażowanie, które przyczyniło się do pozyskania dodatkowych środków.

Jednocześnie dyskutowano o planie rozliczenia płatności projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz realizowanych w ramach działań wdrażanych przez OCRG w 2011 r. Omawiano także proces renegotjacji RPO WO 2007-2013.

Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

Od uruchomienia Programu do końca czerwca 2011 r. zostało zakończonych **6 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:

- ***Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim***

Termin badania: I – IV kwartał 2011 r.

Celem badania jest analiza i ocena działań podejmowanych w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie komplementarności z innymi instrumentami wsparcia, także pod kątem zasadności zintegrowania w przyszłym okresie programowania oraz przygotowania propozycji mechanizmów zapewniających komplementarność.

W ramach badania zaplanowano zbadanie mechanizmów zapewnienia komplementarności w ramach RPO WO 2007-2013 oraz ocenę komplementarności projektów RPO WO 2007-2013. Ponadto, badanie ma na celu wskazanie mechanizmów i narzędzi zapewnienia komplementarności adekwatnych do potrzeb Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 w obecnym i przyszłym okresie programowania.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje z interesariuszami RPO WO 2007-2013, dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia badania oraz przygotowania procedury wyboru Wykonawcy badania.

Zakończenie badania zaplanowano na IV kwartał 2011 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2011 r.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad badaniem ewaluacyjnym pn.:

- ***Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim.***

Termin badania: IV kwartał 2010 r. – IV kwartał 2011 r.

Głównym celem badania jest ocena i analiza efektywności wsparcia przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych (w ramach działań 6.1.3 – *Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych* - projekty systemowe i 6.2 – *Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia* PO KL i poddziałania 1.1.2 – *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013* – projekty start-up) w województwie opolskim w stosunku do potrzeb regionalnych. Dodatkowo analizie poddana zostanie jakość utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów w ramach działań 6.2 i 6.1.3 PO KL oraz 1.3.2 i 1.1.2 RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym prowadzone były konsultacje z interesariuszami RPO WO 2007-2013 i PO KL, dotyczące opracowania przedmiotu zamówienia badania oraz przygotowania procedury wyboru Wykonawcy badania.

Zakończenie badania zaplanowano na IV kwartał 2011 r., wobec tego wnioski i rekomendacje możliwe będą do zaprezentowania najwcześniej w sprawozdaniu okresowym za II półrocze 2011 r.

Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych

W okresie sprawozdawczym zmianie uległy zasady monitoringu wdrożenia rekomendacji. Obecnie monitoring rekomendacji z wszystkich badań ewaluacyjnych odbywać się będzie nie częściej niż raz w roku przy współpracy z adresatami rekomendacji, aż do momentu pełnego wdrożenia uzgodnionych i przyjętych rekomendacji. W okresie sprawozdawczym dokonano monitoringu wdrożenia rekomendacji dla jednego zakończonego badania ewaluacyjnego. Monitoring wdrożenia rekomendacji pozostałych badań ewaluacyjnych zakończonych w 2009 i 2010 r. zaplanowano w terminach innych niż okres sprawozdawczy.

➤ Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Termin badania: III – IV kwartał 2009 r.

Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:

- ⇒ przeprowadzenie cyklu szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013 oraz dla wnioskodawców podnoszących wiedzę z zakresu wdrażania polityk horyzontalnych;
- ⇒ zaktualizowanie i rozszerzenie lub wprowadzenie szeregu praktycznych, wewnętrznych wytycznych/zasad organizujących pracę Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 i Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz KM RPO WO 2007-2013 przyczyniających się do utrwalania postaw i tworzenia pozytywnych wzorców do naśladowania np. segregacja odpadów, zastosowanie żarówek energooszczędnych, zastosowanie papieru ekologicznego;
- ⇒ przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość na temat korzyści ze stosowania polityk horyzontalnych;
- ⇒ zebranie i utworzenie bazy przykładów inwestycji zrealizowanych w województwie opolskim, w Polsce i UE, które kompleksowo uwzględniają zasady polityk horyzontalnych;
- ⇒ rozwinięcie informacji dotyczących polityk horyzontalnych w dokumentach RPO WO 2007-2013.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

- ⇒ zmieniono zasady organizacji pracy Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej II stopnia i KM RPO WO 2007-2013 m.in. w zakresie stosowania ekologicznego papieru, korzystania w większym stopniu z dokumentów i materiałów w wersji elektronicznej, wprowadzanie żarówek energooszczędnych;
- ⇒ w terminie od marca do maja 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kompleksową kampanię informacyjną Programu uwzględniającą elementy polityk horyzontalnych m.in. w zakresie polityki równych szans oraz polityki ochrony środowiska.

Ze względu na przedłużające się prace nad portalem internetowym, zmianie uległ termin wdrożenia dwóch z zaplanowanych do realizacji w I półroczu 2011 r. rekomendacji:

- ⇒ rozbudowanie strony internetowej o przykłady zrealizowanych inwestycji w ramach RPO WO 2007-2013, które realizują zintegrowane polityki horyzontalne,
- ⇒ rozbudowanie strony internetowej o bazę dobrych praktyk w zakresie wdrażania polityk horyzontalnych.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

W maju 2011 r. przeprowadzono monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji sformułowanych w wyniku badania. Ponowna weryfikacja wdrożenia rekomendacji powinna nastąpić w I kwartale 2012 r.

Badania ewaluacyjne planowane na II półroczu 2011 r.

Zgodnie z *Okresowym planem ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2011*, oprócz dwóch rozpoczętych już badań ewaluacyjnych, w odpowiedzi na doraźną potrzebę – Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, Instytucji Pośredniczącej II stopnia lub Krajowej Jednostki Oceny – może zostać przeprowadzone *Badanie ad hoc*.

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

W I półroczu 2011 r., tj. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2011 **przeprowadziła w Instytucji Pośredniczącej II stopnia 1 systemową kontrolę doraźną**. Kontrolę przeprowadzono w dniach:

➤ 9 marca – 15 kwietnia 2011 r.

Zakres kontroli:

- ⇒ prawidłowości zawarcia i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-065/08 pn. „*Centrum Gastronomiczno-Konferencyjne w Opolu - Rozwój turystyki biznesowej i rozrywkowej*”, zawartej z Beneficjentem BUS CENTRUM Paweł Wójcik,
- ⇒ prawidłowość procesu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-022/09, pn. „*Restauracja na Młynówce – nowa atrakcja turystyczna Opola*”.

Wyniki kontroli:

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 stwierdziła, że Instytucja Pośrednicząca II stopnia prawidłowo zrealizowała:

- ⇒ procedurę podpisania: umowy o dofinansowanie projektu pn. „*Centrum Gastronomiczno-Konferencyjne w Opolu – Rozwój turystyki biznesowej i rozrywkowej*” oraz aneksów do umowy nr RPOP.01.04.01-16-065/08-00, wystąpiły uchybienia nie mające wpływu na proces wdrażania,
- ⇒ proces naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.04.01-16-022/09 pn. „*Restauracja na Młynówce – nowa atrakcja turystyczna Opola*”, z uchybieniami nie mającymi wpływu na wybór projektu do dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 jest w trakcie formułowania zaleceń pokontrolnych, które będą miały na celu usunięcie stwierdzonych uchybień.

Ponadto, w I półroczu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 o sposobie usunięcia uchybień i wdrożeniu zaleceń pokontrolnych w ramach **kontroli systemowej przeprowadzonej w Instytucji Pośredniczącej II stopnia w dniach 28 czerwca – 30 lipca 2010 r.**

W I półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 sporządziła również informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach **kontroli systemowej przeprowadzonej w Instytucji Pośredniczącej II w stopnia w poprzednim okresie sprawozdawczym, tj.:**

➤ 27 października – 15 grudnia 2010 r.

Wyniki kontroli:

W wyniku kontroli Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 stwierdziła w zakresie:

⇒ **Prawidłowości zawarcia i realizacji umowy o dofinansowanie projektu *Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkryć paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie realizowanego przez „Stowarzyszenie DELTA”***

- uchybienie w zakresie braku weryfikacji danych zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie rzeczowo-finansowym podczas sporządzania pisma do beneficjenta w sprawie przekazania do OCRG dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

⇒ **Sprawdzenia czy sytuacja postępowania, tak jak w przypadku „Stowarzyszenia DELTA”, w zakresie niekwalifikowalności kosztów miała miejsce podczas weryfikacji wniosków o płatność innych beneficjentów realizujących projekty, w szczególności w ramach poddziałania 1.4.1.**

uchybień:

- w odniesieniu do niektórych beneficjentów, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie brak przekazania informacji na temat zaktualizowania okresu realizacji projektu, jeżeli uległ zmianie w stosunku do okresu zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem konieczności jego zmiany,
- w umowie o dofinansowanie okres rozpoczęcia i/lub zakończenia rzeczowej, finansowej realizacji projektu jest niezgodny z okresem wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tzn. ujęto okres wnioskowany przez beneficjenta w piśmie przed podpisaniem umowy. Błąd został poprawiony poprzez zawarcie aneksu do ww. umowy, na mocy którego skorygowano m.in. harmonogram realizacji projektu ujęty we wniosku o dofinansowanie,
- zawarcie aneksu z naruszeniem zapisów § 3 ust. 2 umowy o dofinansowanie, na mocy którego *IP II może zmienić terminy zakończenia realizacji projektu, określone w ust. 1, na uzasadniony wniosek beneficjenta, złożony zgodnie z § 18 ust. 1 (nie później niż 30 dni przed planowanym zakończeniem finansowym realizacji projektu),*
- nieterminowe złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność,
- nieterminowe przeprowadzanie weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej wniosku/korekty wniosku o płatność,
- nieterminowe akceptowanie wniosku/korekty wniosku o płatność,
- w dokumentacji dotyczącej wniosku o płatność brak kopii faktur wystawionych przed rozpoczęciem projektu, które według pisma beneficjenta omyłkowo zostały załączone do wniosku o płatność,
- pomniejszanie w trakcie weryfikacji wniosku o płatność, zakresu wydatków w punkcie (tabeli) 11 wniosku o płatność, które zostały uznane za niekwalifikowane,
- sprzeczne informacje dotyczące przyczyny uwolnienia środków zawarte w *zestawieniu podpisanych umów/ zawartych aneksów z beneficjentem w ramach ogłoszonych naborów: 1.1.2-III Nabór* sporządzonym przez OCRG w dniu 09.11.2010 r., w *informacji wewnętrznej dot. stanu uwolnionych środków oraz oświadczeniu beneficjenta,*
- brak wykazania wydatków niekwalifikowanych jako nieprawidłowości na projekcie,
- nie dotrzymano terminu przekazania beneficjentowi Informacji pokontrolnej.

⇒ **Sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 zbiorczych wniosków o płatność**

uchybień:

- złożenie „*Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach RPO WO od IP II stopnia do IZ*” na 2010 i 2011 r. po terminie,
- brak weryfikacji i akceptacji wniosku oraz załączników przez Kierownika Działu Rozliczeń Projektów RPO i Głównego Księgowego,

- brak weryfikacji i akceptacji wniosku oraz załączników przez Głównego Księgowego.
- ⇒ **Sporządzania i przekazywania do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 sprawozdań z realizacji RPO WO**
 - uchybienia w zakresie weryfikacji i akceptacji sporządzonych sprawozdań.
- ⇒ **Prawidłowości realizacji Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na lata 2007-2008 i na 2009 r.**

uchybienia w zakresie:

 - prawidłowości rozliczania wydatków potwierdzających poniesione wydatki,
 - prawidłowości wypełnienia załącznika „Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki(...)”,
 - prawidłowości opisywania dokumentów zewnętrznych obcych (fakturach, rachunkach).
- ⇒ **Procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie**
 - uchybienia w przeprowadzeniu procedury rozpatrywania wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPOP.01.01.02-16-057/10 pn. „Zakup ambulansów z wyposażeniem do świadczenia usług ratownictwa medycznego”, które nie miały wpływu na wybór projektu do dofinansowania,
 - nieprawidłowe nakładanie na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków, dokonywanie zmian w zasadach konkursu, w tym we wzorach dokumentów.
- ⇒ **Bazy interpretacji wydanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 oraz opinii prawnych wydanych na potrzeby Instytucji Pośredniczącej II stopnia**
 - Instytucja Pośrednicząca II stopnia nie realizuje działania w zakresie prowadzenia bazy interpretacji wydanych przez IZ RPO WO.

Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 stwierdziła, że w zakresie **wprowadzania danych do systemów informatycznych SEZaM oraz KSI** oraz **prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych** Instytucja Pośrednicząca II stopnia prawidłowo realizuje nałożone zadania.

W związku z powyższym sformułowano zalecenia pokontrolne, które mają na celu usunięcie uchybień. Jednostka kontrolowana jest w trakcie realizacji przedmiotowych zaleceń.

3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

➤ *Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 w ramach wszystkich Osi priorytetowych*

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 przeprowadziła:

⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

35 kontroli dokumentacji projektów, polegających na sprawdzeniu kompletności wszystkich dokumentów wymaganych na etapie realizacji i rozliczania projektów oraz prawidłowości postępowania przy weryfikacji przedmiotowych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz właściwymi procedurami.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu**, w tym w ramach:

- Osi priorytetowej 3 - **2 kontrole planowe**,
- Osi priorytetowej 5 - **1 kontrola planowa** oraz **1 kontrola doraźna**.

Na dzień sporządzania przedmiotowego sprawozdania w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **2 beneficjentów**. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie ujawniono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

➤ **Kontrole przeprowadzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi priorytetowej 1**

W I półroczu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła:

⇒ **kontrole dokumentacji** (przeprowadzane obligatoryjnie na zakończenie realizacji każdego projektu):

56 kontroli dokumentacji projektów, polegających na sprawdzeniu kompletności i zgodności z obowiązującymi procedurami, wszystkich dokumentów związanych ze zrealizowanymi projektami.

⇒ **kontrole w miejscu realizacji projektu:**

Oś 1 - 20 kontroli planowych i 8 kontroli doraźnych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym Instytucja Pośrednicząca II stopnia przeprowadziła **5 wizyt monitorujących**.

W I półroczu 2011 r. w następstwie kontroli realizacji projektów zostały sformułowane zalecenia pokontrolne w stosunku do **5 beneficjentów**. 4 beneficjentów wdrożyło sformułowane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia zalecenia pokontrolne. Instytucja Pośrednicząca II stopnia dokonała weryfikacji wdrożenia zaleceń na podstawie przesłanych przez beneficjentów pisemnych informacji wraz z załączonymi kserokopiami dokumentacji. W jednym przypadku beneficjent nie wdrożył zaleceń pokontrolnych, w związku z tym wszczęto wobec niego postępowanie administracyjne.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

➤ **Kontrole w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013**

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 podjęły działania kontrolne następujące instytucje:

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin i zakres kontroli:** 11 stycznia – 25 marca 2011 r.

Kontrola w zakresie powiązania budżetu Samorządu Województwa Opolskiego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r.

- **wynik kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- pomimo zgłoszenia 17.09.2009 r. zapotrzebowania na środki w ramach dotacji rozwojowej w kwocie 170 mln zł, w tym I transza 45 mln zł, wnioszek o udzielenie dotacji z 17.09.2009r. nr 1/2/2009/RPO/18 obejmował jedynie kwotę 45 mln zł,
- w poleceniach przelewów zwracanych środków z dnia 29.01.2010 r. IZ nie podała roku (2009) oraz źródła finansowania (środki budżetowe),

- sprawozdanie z wykorzystania transz dotacji wg stanu na 30.11.2009 r. przesłano do MRR 31.12.2009 r., tj. trzy dni po terminie.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizację zadań objętych kontrolą i nie sformułowała wniosków pokontrolnych.

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres kontroli:** 6 maja – 2 czerwca 2011 r.

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Pomocy Technicznej na zadania w ramach RPO WO 2007-2013, za okres od 01.01.2010 r. do 2011 r.:

- dla kategorii interwencji 85 – *Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola,*
- dla kategorii interwencji 86 – *Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja,* z wyłączeniem wydatków na promocję programu oraz wsparcie procesu ewaluacji,

ze szczególnym uwzględnieniem zawieranych umów cywilno – prawnych z tytułu dostaw i usług:

- sprawdzenie realizacji Pomocy Technicznej zgodnie z Rocznym Planem Działań z Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 r. zgodnie z decyzją o dofinansowaniu nr RPOP.07.01.00-16-001/09-00 z dnia 22.12.2009 r.,
- prawidłowość realizacji wydatków w ramach Pomocy Technicznej – rodzaje wydatków podlegających refundacji (na próbie),
- ocena kwalifikowalności kosztów w ramach Pomocy Technicznej oraz sposobu ich dokumentowania (na próbie),
- kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania poniesionych kosztów w ramach Pomocy Technicznej.

- **wynik kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:

- błędnego podawania Dziennika Ustaw ustawy Prawo zamówień publicznych,
- błędów w opisach dokumentów,
- opóźnień w realizacjach przelewów za wystawione faktury,
- prawidłowego sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych,
- błędnie wpisanej we wniosku o płatność daty wystawienia dokumentu oraz kategorii wydatku,
- braku podpisywania list płac z umów zleceń po przeprowadzonej kontroli merytorycznej dokumentu,

- **uwagi i polecenia:**

- dowody księgowe sprawdzać pod względem formalno – rachunkowym oraz zamieszczać w opisie informacje wymagane przez Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, tom III oraz Zarządzenie nr 29 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 02.10.2000 r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Finansowo – Księgowych w Urzędzie Marszałkowskim,
- przestrzegać terminów płatności określonych umową,
- dokładnie i rzetelnie wypełniać dokumenty,
- w opisie dowodów księgowych stosować aktualną podstawę prawną ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

- dokumentować odbiór dzieła poprzez podpisywanie protokołu zdawczo – odbiorczego przez osoby upoważnione, uczestniczące w odbiorze.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 wdrożyła zalecenia pokontrolne.

⇒ **BIURO AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres audytu:** 17 czerwca – 31 sierpnia 2011 r.
Zadanie audytowe pn. *Monitoring i sprawozdawczość w ramach RPO WO 2007-2013.*
- **wyniki audytu:**
Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończono czynności audytowych.

Ponadto w I półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 **otrzymała wyniki kontroli/ audytów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym przez:**

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 30 września 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.
- **wyniki audytu:**
W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono uchybienia w zakresie:
 - braku udokumentowania wiedzy kandydata na stanowisko asesora dla działania 4.3,
 - wersja nr 14 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WO 2007-2013, lipiec 2010 r. nie przewiduje mechanizmu weryfikującego wywiązywanie się beneficjenta z obowiązku zachowania określonych we wniosku wymogów dotyczących trwałości projektu i docelowych wartości wskaźników realizacji projektu - § 9 pkt 10 umowy oraz § 9 pkt 8 decyzji,
 - od dnia 24.05.2010 r. weryfikacja wniosku o płatność pod kątem zgodności z zasadami zamówień publicznych odbywa się jedynie poprzez sprawdzenie czy beneficjent zamieścił na fakturze informację o zgodności projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
 - metodologia doboru próby nie zawiera elementu/ wskaźnika określającego stopień zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.
- **rekomendacje:**
 - przy wyborze kandydatów na asesorów przestrzegać kryteriów naboru zgodnie z określonymi w ogłoszeniu,
 - należy opracować procedury weryfikacji wywiązywania się beneficjenta z nałożonego na niego w umowie o dofinansowanie/ decyzji o dofinansowaniu obowiązków w zakresie trwałości projektu i docelowych wartości wskaźników realizacji projektu,
 - należy rozważyć podjęcie działań zmierzających do uzupełnienia procedur w celu zapewnienia odpowiedniej weryfikacji w obszarze zamówień publicznych, przed deklarowaniem wydatków do Komisji Europejskiej w szczególności objęcia sprawdzeniem zagadnień, które w audytach operacji zostały zidentyfikowane jako obszary ryzyka, w tym wybór właściwego trybu postępowania, potencjalne ograniczenia dotyczące podwykonawstwa i związane z udziałem w konsorcjach, kwestie związane z przynależnością do właściwych izb samorządu zawodowego, zmiany w ogłoszeniach ws. zamówień publicznych w świetle konieczności zachowania właściwej formy publikacji,
 - zaleca się uszczegółowienie metodologii doboru próby do kontroli o wskaźnik/ stopień zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 18 października 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.

- **wyniki audytu:**

W trakcie czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji następujących projektów:

- WND-RPOP.01.04.02-16-027/08, Gmina Zawadzkie. Stwierdzono wydatek niekwalifikowany w łącznej kwocie 20 867,10 zł,
- WND-RPOP.05.01.02-16-022/09, Gmina Kędzierzyn-Koźle. Stwierdzono wydatek niekwalifikowany w łącznej kwocie 43 131,69 zł,
- WND-RPOP.04.03.00-16-051/10, Powiat Strzelecki. Stwierdzono wydatek niekwalifikowany w kwocie 14 250,00 zł,
- WND-RPOP.04.01.00-16-009/08, Gmina Olesno. Stwierdzono wydatek niekwalifikowany w kwocie 500,99 zł

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 podjęła czynności związane z procedurą analizy wyników audytów.

⇒ **DEPARTAMENT OCHRONY INTERESÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
MINISTERSTWA FINANSÓW**

- **termin audytu:** 8 – 10 listopada 2010 r.

- **wyniki audytu:**

W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono następujące uchybienia:

- brak posiadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udokumentowanej procedury szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI. Proces szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI nie został przeprowadzony,
- brak formalnego obowiązku ponownego przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa informacji w przypadku znaczącej zmiany dotyczącej dokumentu Polityki,
- brak formalnego dokumentu nakładającego obowiązek aktualizacji treści instrukcji użytkowników modułów aplikacji LSI i przypisującego odpowiedzialność, w szczególności w przypadku zmian w funkcjonalności modułów,
- procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych nie określa w sposób szczegółowy czynności, które powinien podjąć użytkownik w zakresie skontrolowania technicznej sprawności sprzętu komputerowego. Użytkownik może nie posiadać wymaganej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do bezpiecznego przeprowadzenia właściwych czynności,
- brak należytego sprawdzenia nabytych wiadomości w procesie kształcenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w organizacji co powoduje niemożność uzyskania zapewnienia o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności przez pracowników,
- brak w budynku przy ul. Piastowskiej 14 – Ostrówek: książki wejść (wyjść) gości i bariery fizycznej,
- brak uregulowań formalnych w zakresie dostępu do pomieszczeń serwerowni,
- brak spójności pomiędzy stanem faktycznym a opisem formalnym dotyczącym blokowania kont użytkowników w Active Directory,

- brak uregulowań formalnych w zakresie przeglądu kont i praw użytkowników LSI,
 - brak implementacji kompletnych mechanizmów kontrolnych dla danych wprowadzanych przez operatora na podstawie wniosku w postaci papierowej,
 - LSI nie jest objęty planem ciągłości działania. Plan nie został sporządzony,
 - brak formalnego obowiązku przeprowadzania testów odtworzeniowych LSI z kopii zapasowych,
 - brak ustanowienia gwarantowanych maksymalnych czasów: reakcji na dokonane zgłoszenie oraz usunięcia usterki urządzeń klimatyzacyjnych. Przeglądy, konserwacje i naprawy nie są dokumentowane,
 - brak zainstalowanych czujek zanurzeniowych oraz urządzeń zapewniających wypompowanie wody z pomieszczeń serwerowni,
 - instalacje teletechniczne w serwerowni nie są dodatkowo zabezpieczone,
 - brak uporządkowania i jednoznacznego opisu wszystkich kabli sieci informatycznej,
 - brak wdrożenia w sieci Urzędu systemu IDS/IPS,
 - brak formalnej procedury wycofania zmian wprowadzonych do LSI.
- **rekomendacje instytucji audytowej:**
 - opracowanie uregulowania formalnego dla procesu szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz realizację czynności w zakresie szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem dla LSI, zgodnie z opracowanymi uregulowaniami formalnymi,
 - wprowadzenie formalnego obowiązku przeprowadzania szkoleń dla pracowników w przypadku zmian zasad ustanowionych w Polityce Bezpieczeństwa i realizację czynności wynikających z tych zapisów,
 - przypisanie odpowiedzialności za aktualizację treści instrukcji przeznaczonych dla użytkowników, w przypadku zmian funkcjonalności LSI oraz realizację czynności związanych przeprowadzeniem aktualizacji treści instrukcji,
 - bezzwłoczna aktualizacja zapisów, dotyczących w szczególności kontroli technicznej sprawności sprzętu komputerowego przez użytkowników z uwzględnieniem sytuacji, w której nie każdy pracownik Urzędu posiada odpowiednie kwalifikacje i wiedzę merytoryczną do dokonywania takich czynności,
 - wprowadzenie rozwiązań umożliwiających uzyskanie niezależnego zapewnienia o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności przez pracowników podczas szkoleń z zasad bezpieczeństwa informacji,
 - rozważenie wprowadzenia do użytkowania książki wejść (wyjść) lub bariery fizycznej,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie formalnego dokumentu regulującego proces dostępu do pomieszczenia serwerowni,
 - implementować zasadę blokady konta po trzech nieudanych próbach zalogowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentów formalnych,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie formalnego dokumentu regulującego proces przeglądu kont i praw użytkowników LSI,
 - rozważenie wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa, integralności i spójności danych,
 - opracowanie, wdrożenie testowanie i utrzymanie dokumentu formalnego – planu zarządzania ciągłością działania LSI,
 - opracowanie, wdrożenie i utrzymanie dokumentu formalnego regulującego proces przeprowadzania testów odtworzeniowych LSI,

- podjęcie czynności mających na celu uzyskanie zapewnienia wznowienia świadczenia usług przez LSI w przypadku awarii systemu klimatyzacji w serwerowni w czasie akceptowalnym przez użytkowników LSI. Zaleca się dokumentowanie podejmowanych czynności w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw,
- podjęcie czynności mających na celu ograniczenie ryzyka zalania,
- usunięcie lub zabezpieczenie instalacji teletechnicznych przebiegających w pomieszczeniu, które nie są związane bezpośrednio z prawidłowym działaniem urządzeń informatycznych i systemów wspomagających serwerowni,
- uporządkowanie i jednoznaczne opisanie wszystkich kabli sieci informatycznej w serwerowni,
- rozważenie wdrożenia systemu IDS/IPS w sieci Urzędu,
- opracowanie i wdrożenie formalnego dokumentu regulującego proces wycofania wprowadzonych już zmian do środowiska produkcyjnego LSI.

Institucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych rekomendacji.

⇒ **NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI**

- **termin kontroli:** 22 czerwca – 8 września 2010 r.
- **wyniki kontroli:**
Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące realizacji zamówień na materiały i usługi promocyjne w wysokości 403 677,75 zł.
- **zalecenia instytucji kontrolującej:**
 - rozliczenie kwoty 403 677,75 zł. wydatków poniesionych w latach 2008/2009 na materiały i usługi promocyjne jako wydatków niekwalifikowanych w ramach RPO,
 - podjęcie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i rozważenie uregulowania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości niższej od progu zobowiązującego do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych,
 - podjęcie działań organizacyjnych w celu zapewnienia terminowego informowania beneficjentów RPO o zatwierdzeniu wniosków o płatność.

Institucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 poinformowała Jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia sformułowanych zaleceń.

➤ **Kontrole w Instytucji Pośredniczącej II stopnia**

W okresie sprawozdawczym w Instytucji Pośredniczącej II stopnia zostały przeprowadzone następujące kontrole:

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin i zakres kontroli:** 8 lutego – 7 marca 2011 r.
Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok*.
- **wyniki kontroli:**
W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte błędy/uchybień w zakresie:
 - wystawiania dokumentów polecenia wyjazdu służbowego (delegacje) i rozliczania kosztów podróży służbowych (wyjazdy służbowe w miejscu pracy – Opole), w tym:

- ✓ zastosowanie druku „polecenie wyjazdu służbowego” dla pracownika przeprowadzającego kontrolę w granicach administracyjnych miasta Opola,
- ✓ brak określenia terminu zakończenia podróży służbowej na drukach „polecenie wyjazdu służbowego”,
- ✓ brak zgodności wystawionych poleceń wyjazdu służbowego z prowadzonym Rejestrem delegacji;
- ✓ błędna podstawa prawna ustawy Prawo zamówień publicznych w dokumentach księgowych,
- procedury zamówień publicznych, w tym:
 - ✓ błędne określenie terminu przez zamawiającego w punkcie 8.2 SIWZ,
 - ✓ brak druku ZP – 17 w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 - ✓ brak uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty w zawiadomieniu.
- **rekomendacje instytucji kontrolującej:**
 - dostosować treść Zarządzenia nr 49/2009 Dyrektora OCRG z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie delegacji wyjazdów służbowych pracowników OCRG do zapisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
 - ewidencję wyjazdów służbowych pracowników wykonujących swoje obowiązki w granicach administracyjnych miasta Opola prowadzić w książce wyjazdów, zaprzestając stosowania druków „polecenia wyjazdu służbowego”,
 - rozliczeń kosztów dojazdów pracowników przeprowadzających kontrolę na terenie miasta Opola dokonywać na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych o używanie pojazdu do celów służbowych,
 - dokładnie wypełniać wszystkie wymagane pola na drukach delegacji oraz rachunku kosztów podróży,
 - ujmować w rejestrze delegacji wszystkie wystawione polecenia wyjazdu służbowego,
 - w opisie dowodów księgowych stosować aktualną podstawę prawną ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - opracowując dokumentację związaną z procedurą zamówień publicznych stosować określone w przepisach terminy oraz ujmować wszystkie wymagane informacje, szczególnie informacje dotyczące uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
 - kontrolą zarządczą objąć wszystkie obszary wskazane w Komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

W kwietniu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

⇒ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI

- **termin i zakres kontroli:** 4 – 15 kwietnia 2010 r.
Kontrola systemowa. Przedmiotem kontroli była prawidłowość funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz stosowania procedur.
- **wyniki kontroli:**
W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/ uchybienia:
 - przekroczenie terminów weryfikacji wniosków o płatność,

- niezgodność zastosowanych wzorów pism z wzorami określonymi w *Listach Sprawdzających i Wzorach Dokumentów*,
 - dyspozycja dokonania przelewu środków EFRR na rzecz beneficjenta została przekazana do realizacji z opóźnieniem,
 - błędne wskazanie beneficjentowi sposobu naliczenia odsetek od nieprawidłowo wypłaconego dofinansowania,
 - nieterminowe sporządzanie *Formularza weryfikacji nieprawidłowości* przez pracowników wykrywających nieprawidłowość;
 - nieterminowe przekazywanie sporządzonych *Formularzy weryfikacji nieprawidłowości/ informacji o wystąpieniu nieprawidłowości* do Działu Kontroli RPO,
 - błędne wskazanie organu odwoławczego w przypadku projektu nr WND-RPOP.01.01.02-16-249/08 w wydanej Decyzji 1/2011,
 - nieterminowe dokonanie analizy wyniku audytu w przypadku projektu nr WND-RPOP.01.01.02-16-249/08,
 - w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych przez IPOC w Informacji Pokontrolnej z dnia 30 grudnia 2009r. (zalecenie nr I.9) pracownicy Działu Rozliczeń dokonali korekty wniosków o płatność niezgodnie ze stanowiskiem IPOC dotyczącym dokonywania korekt wyrażonym w pismach DIC-V-9340-164-IJ/09 oraz DIC-II-9341(8)-4-KO/09.
- **zalecenia instytucji kontrolującej:**
 - wpisywać daty sporządzenia/ weryfikacji dokumentu przy parafach wszystkich osób zaangażowanych w realizację podprocesu,
 - dochować staranności podczas sporządzania Poświadczenia od Instytucji Pośredniczącej II stopnia do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013,
 - przestrzegać terminów realizacji poszczególnych czynności ujętych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
 - przestrzegać zapisów Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie weryfikacji wniosków o płatność,
 - stosować i przestrzegać wzorów dokumentów ujętych w *Listach sprawdzających i wzorach dokumentów wykorzystywanych do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
 - dochować należytej staranności przy przekazywaniu wewnętrznej korespondencji między Działami (podpisy, pieczęć, daty),
 - dochować należytej staranności przy przekazywaniu beneficjentom informacji o sposobie naliczania odsetek w celu właściwego ich wyliczenia,
 - w wydawanych decyzjach podawać właściwy organ odwoławczy,
 - przestrzegać terminów analizy wyników audytów/ kontroli przeprowadzanych u beneficjentów,
 - bezwzględnie stosować wytyczne Instytucji Certyfikującej dotyczące dokonywania korekt we wnioskach o płatność wyrażonych w pismach DIC-V-9340-164-IJ/09 oraz DIC-II-9341(8)-4-KO/09.

W czerwcu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia zaleceń i wykorzystania sformułowanych uwag i poleceń.

Ponadto, w I półroczu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia **otrzymała wyniki kontroli rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym:**

⇒ **BIURO KONTROLI I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO**

- **termin kontroli:** 25 października – 10 listopada 2010 r.
- **wyniki kontroli:**

W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wykryte następujące błędy/uchybień:

 - umowę podpisano już po zakończeniu realizacji projektu, a w treści umowy brak jednoznacznych zapisów mówiących o sposobie postępowania dotyczącego aneksowania umowy z powodu zmiany terminów w sytuacji, gdy w momencie podpisywania umowy inwestycja jest już zakończona,
 - okres wskazany we wniosku o płatność jest niezgodny z okresem realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie.
- **rekomendacje instytucji kontrolującej:**
 - na etapie przygotowywania umów o dofinansowanie dla poszczególnych beneficjentów dokładnie analizować wszystkie elementy i na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości,
 - podjąć działania (w porozumieniu z DPO) w zakresie ustalania procedur postępowania bądź doprecyzowania zapisów umów o dofinansowanie pod kątem zasad aneksowania umów w odniesieniu do beneficjentów, których projekt jest realizowany w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie,
 - w sprawach spornych zawsze występować w pierwszej kolejności o opinię radców prawnych zatrudnionych w OCRG, a w przypadkach dalszych wątpliwości wystąpić o inną opinię wewnętrzną/zewnętrzną,
 - odpowiedzi na pisma dotyczące spraw spornych z beneficjentami udzielać po wyrażeniu opinii przez radcę prawnego,
 - podejmować działania w celu szybkiego i sprawnego rozpatrywania wniosków i wszelkiej korespondencji z beneficjentem.

W styczniu 2011 r. Instytucja Pośrednicząca II stopnia poinformowała pisemnie jednostkę kontrolującą o sposobie wdrożenia rekomendacji.

⇒ **URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ**

- **termin audytu:** 20 października 2010 r. – 31 grudnia 2011 r.
- **wyniki audytu:**

W trakcie czynności audytowych stwierdzono nieprawidłowości w realizacji projektów WND-RPOP.01.03.02-16-084/08 oraz WND-RPOP.01.01.02-16-273/09.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia podjęła czynności zmierzające do odzyskania od beneficjenta środków uznanych za niekwalifikowalne.

3.4 Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach

W pierwszym półroczu 2011 r. stwierdzono 46 nieprawidłowości, z czego 4 przekazano lub zostanie przekazane do MF-R w formie *Raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* za pomocą systemu IMS. Pozostałe nieprawidłowości zgłoszono, bądź zostaną zgłoszone w formie *Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE*.

Przedmiotowe nieprawidłowości polegały na:

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków nieuprawnionych;
- płatności gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15 tys. Euro - naruszenie art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.);
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Za I kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC przekazano:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **48 343,75 PLN**, tj. **12 144,84 Euro** (EFRR);
 - **85 781,53 PLN**, tj. **21 549,90 Euro** (EFRR).
- zestawienie kwartalne ujmujące 15 nieprawidłowości na łączną kwotę **100 463,61 PLN**, tj. **25 499,59 Euro** (EFRR).

Za II kwartał 2011 r. do MF-R i IPOC zostaną przekazane:

- dwa raporty kwartalne, odpowiednio na kwoty:
 - **120 424,77 PLN**, tj. **28 291,97 Euro** (EFRR);
 - **108 290,00 PLN**, tj. **27 314,23 Euro** (EFRR).
- zestawienie kwartalne ujmujące 27 nieprawidłowości o łącznej wartości **403 352,08 PLN**, tj. **71 701,20 Euro** (EFRR).

Łączna kwota nieprawidłowości wykrytych w okresie sprawozdawczym wynosi **866 655,74 PLN**, tj. **186 501,73 Euro** (EFRR).

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, w I półroczu 2011 r. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 sporządziła również informację pokontrolną oraz sformułowała zalecenia pokontrolne w ramach kontroli systemowej przeprowadzonej w Instytucji Pośredniczącej II w stopnia w poprzednim okresie sprawozdawczym. W wyniku tej kontroli również nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.5 Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w okresie sprawozdawczym i podlegających odzyskaniu wyniosła **481 561,90 PLN** (tj. **117 872,55 Euro**), z czego:

- w okresie sprawozdawczym odzyskano **207 752,81 PLN** (**51 124,12 Euro**);
- wg stanu na 30 czerwca 2011 r. do odzyskania pozostawała kwota **273 809,09 PLN** (**66 748,43 Euro**).

Ponadto, w obecnym okresie sprawozdawczym odzyskano kwotę nieprawidłowości stwierdzonej w II półroczu 2010 r. Kwota tej nieprawidłowości to **122,35 PLN** (**29,46 Euro**).

Kwoty odzyskane zwiększyły alokację pozostałą do wykorzystania w ramach działania/poddziałania:

- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach;*
- 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach;*
- 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa;*
- 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych;*
- 3.1.2 *Drogi lokalne;*
- 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami;*
- 7.1 *Pomoc techniczna.*

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce:
	24.08.2011 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej:
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na etapie procesu oceny projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 tj. oceny formalnej oraz oceny merytorycznej I i II stopnia, w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano nieprawidłowości, problemów i zagrożeń w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

W związku z powyższym nie ma konieczności podejmowania działań zapobiegawczych w przedmiotowym zakresie. Jednakże w przypadku pojawienia się błędów w zakresie stosowania przez beneficjentów ww. ustawy, Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 gotowa jest do przeprowadzenia kontroli systemowych oraz doraźnych celem wyeliminowania rozpoznanych uchybień.

Na etapie wdrażania projektów zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 była zobowiązana do dnia 3 czerwca 2009 r. do sprawdzania części dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych przed opublikowaniem jej przez beneficjenta. Od ww. terminu, czyli od czasu przyjęcia nowych wzorów umów o dofinansowanie projektu, IZ RPO WO 2007-2013 nie weryfikuje dokumentów dotyczących zamówienia publicznego przed jego ogłoszeniem. Na etapie

weryfikacji wniosków o płatność weryfikowana jest zgodność pod kątem przedmiotowym i podmiotowym treści zawartej umowy z wykonawcą z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Prawdliwość stosowania prawa zamówień publicznych jest szczegółowo weryfikowana na etapie kontroli realizacji projektu, odbywającej się na miejscu u Beneficjenta.

Na etapie kontroli projektów IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła występowania problemów o charakterze systemowym związanych ze stosowaniem prawa zamówień publicznych.

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi. Prowadzone dotychczas nabory wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałań: 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*, 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*, 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*, 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych* są zgodne z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317);
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787).


Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 3 *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy (Załącznik nr III).*

⇒ **Pomoc publiczna przekazana od uruchomienia Programu do końca I półrocza 2011 r.**

Pomoc publiczna została przekazana 470 podmiotom w wysokości 233,82 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 453 przedsiębiorstwom, jednostkom samorządu terytorialnego (10 projektów), jednostce badawczo – rozwojowej (3 projekty), kościołowi katolickiemu (3 projekty) i organizacji pracodawców (1 projekt).

- **Pomoc *de minimis* została przekazana na realizację 313 projektów na kwotę 73,24 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.1.2 (288 projektów na kwotę 67,22 mln PLN) oraz 1.4.1 (25 projektów na kwotę 6,02 mln PLN), z czego 308 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 5 projektów przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalna pomoc inwestycyjna przeznaczona została na realizację 152 projekty na kwotę 158,22 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny) realizowanych w ramach poddziałań 1.3.2 (91 projektów na kwotę 84,82 mln PLN), 1.4.1 (52 projekty na kwotę 47,88 mln PLN) oraz 1.4.2 (9 projektów na kwotę 25,52 mln PLN). Beneficjentami pomocy są mikroprzedsiębiorstwa (44 projekty), małe przedsiębiorstwa (61 projekty), średnie przedsiębiorstwa (35 projektów), jednostki samorządu terytorialnego (9 projektów) oraz kościół katolicki (3 projekty).
- **Pomoc na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **2 projektów na kwotę 1,44 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie otrzymała jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacja pracodawców.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 udzielono jednostce badawczo – rozwojowej (**3 projekty na kwotę 0,92 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny).

Wykres 24. Procentowy udział poszczególnych grup podmiotów w całości udzielonej pomocy publicznej

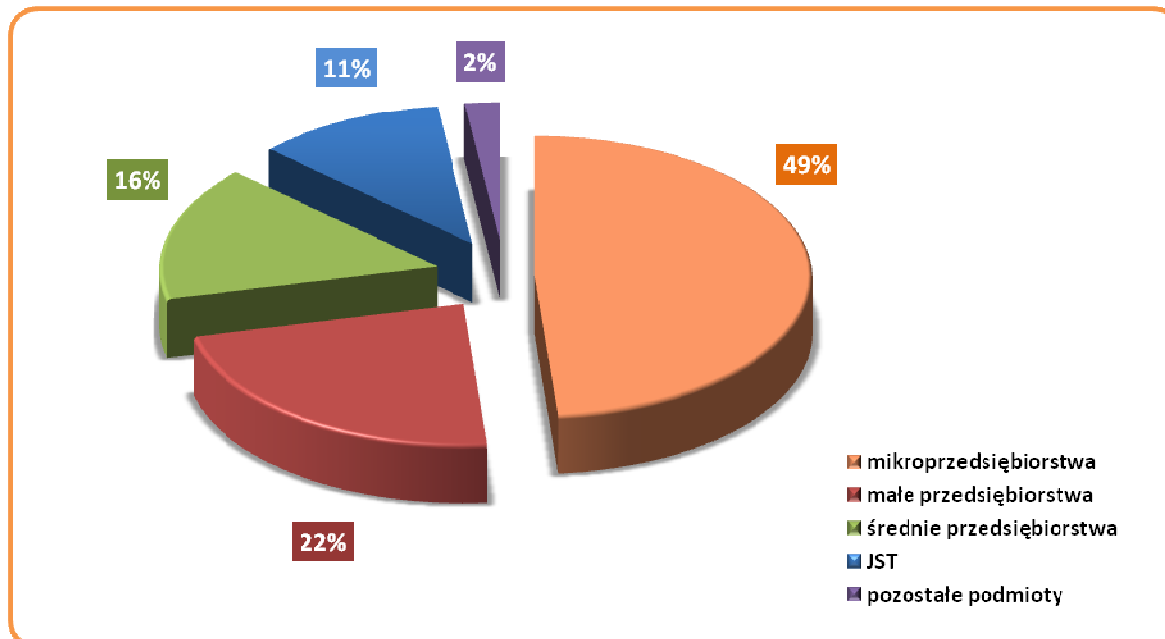

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


⇒ **Pomoc publiczna przekazana w okresie sprawozdawczym**

Pomoc publiczna została przekazana 142 podmiotom w wysokości 49,23 mln PLN (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny), w tym 132 przedsiębiorstwom, 6 jednostkom samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców (1 projekt) oraz jednostce badawczo – rozwojowej (3 projekty).

Wartość pomocy udzielonej w I półroczu 2011 r. stanowi ponad 21 % całości pomocy udzielonej beneficjentom od początku realizacji Programu.

- **Pomoc *de minimis* otrzymało 67 przedsiębiorstw na kwotę 14,70 mln PLN**, z czego 65 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa natomiast 2 projekty przez małe przedsiębiorstwa.
- **Regionalną pomoc inwestycyjną otrzymało 70 podmiotów na kwotę 32,76 mln PLN**, z czego 25 projektów realizowanych jest przez mikroprzedsiębiorstwa, 26 projektów przez małe przedsiębiorstwa, 14 projektów przez średnie przedsiębiorstwa oraz 5 projektów przez jednostki samorządu terytorialnego.
- **Pomoc na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu** przekazana została w ramach poddziałania 1.1.1 na realizację **2 projektów na kwotę 0,85 mln PLN** (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny). Wsparcie otrzymała jednostka samorządu terytorialnego oraz organizacja pracodawców.
- **Pomoc na inwestycje w zakresie infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej** w ramach poddziałania 1.3.1 otrzymała jednostka badawczo – rozwojowa (pomocy publicznej udzielono w ramach **3 projektów na kwotę 0,92 mln PLN** tj. wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny).

Wykres 25. Udział poszczególnych programów pomocowych w całości udzielonej pomocy publicznej (wkład wspólnotowy oraz krajowy wkład publiczny)

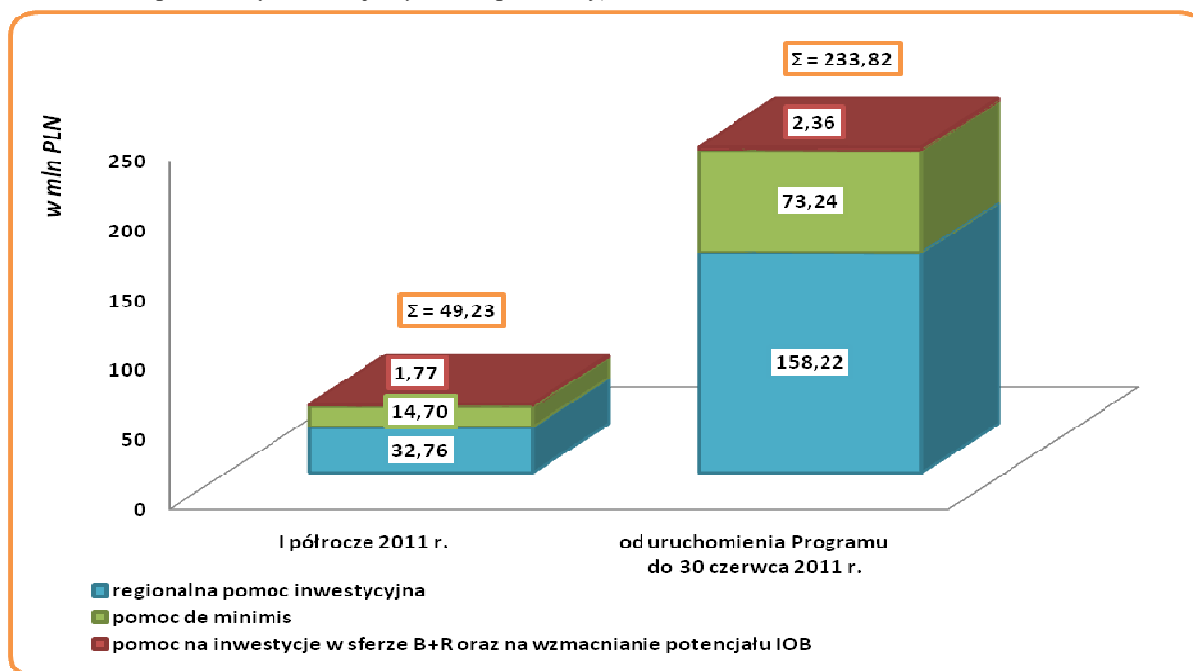

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

5. Informacja o realizacji dużych projektów

W ramach RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

W I półroczu 2011 r. Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali **2 projekty**: każda z instytucji realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2011 rok*. Całkowita wartość na jaką opiewały ww. Roczne Plany Działań to **11,85 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **10,07 mln PLN**. Ponadto, obie instytucje rozliczyły zaliczki w ramach *Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok*.

W okresie sprawozdawczym zostało złożonych **7 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków **4 452 302,52 PLN**, w tym **3 784 457,02 PLN** dofinansowania z EFRR. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami, organizacją spotkań informacyjnych dla beneficjentów Programu. Ponadto, w I półroczu 2011 r. odzyskano kwotę EFRR **114 643,81 PLN**, dotyczącą wniosków o płatność złożonych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W ramach Rocznych Planów Działań, realizowanych w okresie sprawozdawczym przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 i Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO 2007-2013, poniesione wydatki nie przekraczają kwot zarezerwowanych na nie w ramach poszczególnych kategorii wydatków.

Tabela 25. Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie z EFRR
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	3 596 508,89	3 057 032,55
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	29 233,41	24 848,38
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	320 509,02	272 432,64
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	66 650,95	56 653,26
5.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	276 234,44	234 799,26
6.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	55 632,00	47 287,20
7.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	5 870,00	4 989,50
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych	101 663,81	86 414,23
RAZEM		4 452 302,52	3 784 457,02

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Tabela 26. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu	% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ⁷
1	2	3	4	5
1.	Szkolenia	-	987 751,82	2,80%
2.	Zatrudnienie	-	20 545 686,40	58,33%
3.	Sprzęt komputerowy	-	5 049 237,90*	14,34%
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych	-		
5.	Promocja	-	4 837 703,40	13,73%
6.	Ekspertyzy/ doradztwo	-	983 419,23*	2,79%
7.	Ewaluacje	-		
8.	Kontrola/audyt	-	91 730,05	0,26%
9.	Organizacja procesu wyboru projektów	-	1 353 132,98*	3,84%
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów	-		
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów	-	1 235 263,03	3,51%
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu	-	142 359,79	0,40%
RAZEM		8	35 226 284,60	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli nr 24. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

⁷ Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartości należy wyliczyć w procentach jako iloraz: wartości dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie powinna wynosić zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia.

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Dane dotyczące realizacji działań informacyjno-promocyjnych w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* zawarte są w **Załączniku nr IV Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji**.

8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
	Joanna Klimkiewicz
	Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 234, j.klimkiewicz@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 567
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą	Data i miejsce:
	24.08.2011 r., Opole
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:
	Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego
	Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):
	tel. 77 54 16 510, marszalek@umwo.opole.pl, fax 77 54 16 512
Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:	

Załączniki:

1. Załącznik I. Tabela 1. *Postęp rzeczowy RPO WO 2007-2013*
2. Załącznik II.
 - Tabela 1. *Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2011 r.;*
 - Tabela 3. *Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowane poniesione od uruchomienia programu (w PLN);*
 - Tabela 4. *Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE.*
3. Załącznik III. Tabela 3. *Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wyplaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy*
4. Załącznik IV. *Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji*
5. Załącznik V. *Materiały informacyjno-promocyjne (płyta CD)*

Tabela 1. Postęp rzeczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Uwagi ogólne:

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, począwszy od sprawozdania okresowego za II półrocze 2010 r. wartości wskaźników produktu i rezultatu w wierszu realizacja zaprezentowane zostały na podstawie operacji zakończonych, tj wniosków o płatność końcową. Wobec powyższego IZ RPO WO 2007-2013 ujednoliciła podejście prezentowania wskaźników również dla poprzednich okresów, w związku z czym wartości te uległy zmianie.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 1 „Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		24		-		30	
		Wartość bazowa	0																	
- w MSP	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 3: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	3	23	60	128	296	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		262		-		-		1 047		-		1 309	
		Wartość bazowa	0																	
- Mikro: do 9 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	3	22	46	91	242	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		204		-		-		816		-		1 020	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
- Małe: 10–49 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	10	25	36	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		48		-		-		192		-		240	
		Wartość bazowa	0																	
- Średnie: 50–249 pracujących	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	18	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		39		-		49	
		Wartość bazowa	0																	
oraz w: - innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140	
		Wartość bazowa	0																	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		18		-		22	
		Wartość bazowa	0																	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	1	5	14	28	63	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		26		-		-		104		-		130	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 4: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		7		-		-		29		-		36	
		Wartość bazowa	0																	
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		23		-		29	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 5: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46 ³	19,17 ³	19,01 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	3	11	17	36	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		36		-		-		139		-		174		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		1,44		-		1,8		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		12		-		-		54		-		68		
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34		
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		6		-		-		27		-		34		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 9: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	67	182	424	990	1285,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		616		-		-		2 464		-		3 080		
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	5	30	83	194	258,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	62	152	341	796	1027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		308		-		-		1 232		-		1 540	
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	26	89	130	263	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		296		-		-		1 186		-		1 482	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	12	35	51	139	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		90		-		-		336		-		420	
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	4	14	21	54	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		168		-		210	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	8	21	30	85	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		45		-		-		168		-		210	
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	31	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		53		-		-		200		-		250	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 12: Dodatkowe wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	2,83	8,69	26,58	37,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		39,46		-		-		137,0		-		171,2	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																				
1.1		Rozwój przedsiębiorczości																		
1.1.1		Wsparcie instytucji otoczenia biznesu																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu <i>(P.5.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		4		-		5	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez instytucje otoczenia biznesu <i>(R.5.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 4: Liczba nowych, zmodernizowanych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu <i>(R.3.2.3)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5,62	-	-	-	-	22,52	-	-	28,1	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
1.1.2	Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 6: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.	Realizacja	-	0	0	3	20	39	81	221	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	204	-	-	-	-	816	-	-	1 020	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	18	-	-	22	-	-	
		Wartość bazowa	0																	
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	-	0	0	1	4	11	22	54	79	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	81,5	-	-	102	-	-	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	29	-	-	36	-	-	
		Wartość bazowa	0																	
- funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	23	-	-	29	-	-	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok półrocze	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 8: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	55	108	199	571	698,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		480		-		-		1 920		-		2 400	
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	1	11	30	103	115,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		240		-		-		960		-		1 200	
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	54	97	169	468	583	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		240		-		-		960		-		1 200	
		Wartość bazowa	0																	
obszary wiejskie	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	26	52	79	184	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		240		-		-		960		-		1 200	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 9: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	1,02	2,83	7,83	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		7,58		-		-		30,32		-		37,9	
		Wartość bazowa	0																	
1.2	Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	13,46 ³	19,17 ³	19,01 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 11: Liczba dokapitalizowanych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3 ³	3 ³	3 ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw (R.5.8.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	53 ⁴	281 ⁴	365 ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		11		-		-		45		-		56		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 13: Wartość udzielonych kredytów i pożyczek (R.5.8.2)	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,83 ⁵	11,34 ⁴	14,52 ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		8		-		10		
		Wartość bazowa	0																		
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny																				
1.3.1	Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw																				
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 15: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		8		-		-		32		-		40		
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20		
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20		
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	9,2	-	-	11,5	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 18: Liczba wdrożeń powstałych w wyniku zrealizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	32	-	-	40	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami (R.3.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
1.3.2	Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- w MSP	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	2 ¹	2 ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	10	32	48	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	95	-	-	119	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- Małe: 10-49 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	6	19	27	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	79	-	-	99	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
-Średnie: 50-249 pracujących,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	4	12	17	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	20	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
oraz:		Realizacja	-	0	0	0	0	10	28	42	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- w innowacyjne przedsięwzięcia	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		24		-		-		112		-		140	
		Wartość bazowa	0																	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	
		Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		9		-		11	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 22:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0,51	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Wartość docelowa	-		-		-		0,36		-		-		1,44		-		1,8	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 23:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza (P.6.1.1)	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		4,8		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 24:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami (P.6.1.2)	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2,4		-		3	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 25:		Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (P.6.1.3)	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	22	-	-	28	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11	-	-	14	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11	-	-	14	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	39	185	306	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	56	-	-	224	-	-	280	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	5	34	44	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	-	112	-	-	140	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	34	151	262	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	-	112	-	-	140	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
obszary wiejskie	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	23	37	49	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	34	-	-	42	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 28: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	1,35	4,18	8,9	11,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8,92	-	-	35,68	-	-	44,6	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 29: Liczba nowych produktów/usług (R.7.4.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	8	47	68	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		41		-		-		236		-		296	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 30: Liczba wdrożonych wyników prac B+R	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	6	12	19	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4		-		-		16		-		20	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 31: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla (R.6.1.1)	tony/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1,43	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		1		-		1	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 32: Zmiana ilości wytwarzanych odpadów (R.6.1.2)	tony/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	8 000	8 121	8 137,76	8152,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		121		-		-		238		-		238	
		Wartość bazowa	0																	
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej																			
1.4.1	Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 33: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		33		-		-		134		-		168	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 34: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	3	11	15	27	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		34		-		-		136		-		170	
		Wartość bazowa	0																	
- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	-	0	0	0	2	7	9	17	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
- Males: 10-49 pracowników,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	4	6	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-	-	141
		Wartość bazowa	0																		
-Średnie: 50-249 pracowników,	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	29
		Wartość bazowa	0																		
oraz:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	2	4	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa		-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	17	
Wartość bazowa		0																			
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	12	35	40	113	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	400
		Wartość bazowa	0																		
kobiety	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	4	14	19	47	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	200
		Wartość bazowa	0																		
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	8	21	21	66	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	200
		Wartość bazowa	0																		
obszary wiejskie	szt. (EPC) ²	Realizacja	-	0	0	0	0	14	14	30	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	240
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	25	29	213	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	300	-	-	-	-	-	375
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	0	0	0	0	0,46	0,49	1,74	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6,34	-	-	-	-	-	25,36	-	-	-	-	-	31,7
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1.4.2	Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 38:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szt.	Wartość docelowa	-		-		-		3		-		-		5		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 39:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	11	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC) ²	Wartość docelowa	-		-		-		10		-		-		16		-		20	
		Wartość bazowa	0																	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kobiety	szt. (EPC) ²	Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
mężczyźni	szt. (EPC) ²	Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
		Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
na obszarach wiejskich	szt. (EPC) ²	Wartość docelowa	-		-		-		5		-		-		8		-		10	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 40:		Realizacja	-	0	0	0	0	0	1,19	8,11	11,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Wartość docelowa	-		-		-		8,7		-		-		13,92		-		17,4	
		Wartość bazowa	0																	

¹ Zmiana wartości wskaźnika wynika ze zmiany kategorii interwencji w realizowanych projektach.

² Jednostka miary wskaźnika to szt. (EPC) - ekwiwalent pełnego czasu pracy. Zmiana jednostki miary wskaźnika zostanie uwzględniona podczas renegotjacji Programu.

³ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

⁴ Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

⁵ Z uwagi na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2 realizacja wskaźników nie jest wykazywana na podstawie wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013. W sprawozdaniu za I półroczu 2010 r. omyłkowo wpisano wartość 1,58 zamiast 1,83.

* Wartości wskaźników zostaną przeszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego (P.10.1.1)	km ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	240	-	300	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 3: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3003	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 4: Liczba osób które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: (R.10.1.1)	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	69 800	-	-	-	279 200	-	349 000	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
na obszarach wiejskich	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	30 014	-	-	-	120 056	-	150 070	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 5: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
gospodarstwach domowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
MŚP (R.10.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
szkołach (R.10.1.3)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa		0																	
na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																					
2.1		Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		1	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego (P.10.1.1)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		60		-		-		240		-		300	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 3: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: (R.10.1.1)	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		69 800		-		-		279 200		-		349 000	
		Wartość bazowa		0																	
na obszarach wiejskich	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		30 014		-		-		120 056		-		150 070	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 4: Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa		0																	
gospodarstwach domowych	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
MŚP (R.10.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
szkołach (R.10.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
na obszarach wiejskich	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
2.2	Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych																				
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-		1		-		-		3		-		4
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 6: Liczba utworzonych aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych (P.11.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 7: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3003	4 ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		-		*		-		-		*		-		*
		Wartość bazowa	0																		

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

² Zmiana wartości wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego wynika z błędnej interpretacji wskaźnika przyjętej pierwotnie przez beneficjenta

* Wartości wskaźników zostaną przeszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 3 „Transport”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki produktu

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
		Realizacja	Wartość docelowa	Wartość bazowa																	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	0	0	1	12	24	40	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	48	-	-	60	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9	-	-	11	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
- regionalne (wojewódzkie),	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
- lokalne (powiatowe i gminne).	km	Realizacja	0	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	5	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	0	7	23,34	43,79	67,67	70,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	74	-	-	93	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
- regionalne (wojewódzkie),	km	Realizacja	0	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	24	-	-	30	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
- lokalne (powiatowe i gminne).	km	Realizacja	0	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	50	-	-	63	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego (P.18.1.1;P.52.2.1)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	5	5	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	12	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 5: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ² (R.23.2.1; R.23.2.2)	Euro/rok ¹	Realizacja	0	0	0	0	7 101 270,00	8 144 611,82	9 248 851,86	10 829 547,48	10 955 032,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu (P.18.1.3; P.52.2.2)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	680	2 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	-	-	-	-	-	1 300
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 7: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok ¹	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	776 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	-	1 533 000
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 8: Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy (R.29.1.1)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	-	-	200 000
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																					
3.1		Infrastruktura drogowa																			
3.1.1		Drogi regionalne																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	1	1	4	8	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	7	7	12,66	18,37	18,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	30
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ²	Euro/rok ¹	Realizacja	-	0	0	0	7 101 270,00	7 101 270,00	7 101 270,00	7 355 618,92	7 353 475,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
3.1.2		Drogi lokalne																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	10	19	31	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	40	-	50	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	0	0	3,63	3,89	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km	Realizacja	-	0	0	0	0	16,34	31,13	49,3	52,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	63	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 8: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ² (R.23.2.1; R.23.2.2)	Euro/rok1	Realizacja	-	0	0	0	0	1 043 341,82	2 147 581,86	3 473 928,56	3 601 557,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
3.2		Transport publiczny																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	6	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba zakupionych środków transportu publicznego (P.18.1.1; P.52.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	5	5	5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	12	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 11: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu (P.18.1.3; P.52.2.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	680	2 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	1 300	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 12: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	776 585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	-	-	-	-	1 533 000
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 13: Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy (R.29.1.1)	osoby/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	60 000	-	-	-	-	160 000	-	-	-	-	200 000
		Wartość bazowa	0																	

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-12013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

² Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renegotjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																					
Wskaźniki produktu																					
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	7	-	-	9	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	8	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 6: Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km ²) w wyniku realizacji projektów	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 7: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (R.44.1.1)	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	24 800	-	-	31 000	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 8: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (R.53.2.3)	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (R.46.1.2)	osoby ¹	Realizacja		-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2 800		-		-		11 200		-		14 000	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych (P.39.1.3; P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5; P.43.1.4; P.43.1.5)	MW	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0,85		-		-		3,4		-		4,25	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki na poziomie działań																					
4.1		Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	1	1	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		7		-		9	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (P.46.1.3)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	8,69	8,69	26,67	59,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		21		-		-		86		-		107	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (P.46.1.4)	km	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		5		-		-		21		-		26	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków (P.46.1.5; P.46.1.6)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 6: Liczba nowowybudowanych/zmodernizowanych składowisk (P.44.1.5; P.44.1.6)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 8: Powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	0,01
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów (R.46.1.2)	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	1 923	1 923	4 129	8 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	14 000
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 10: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów (R.44.1.1)	osoby ¹	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	24 800	-	-	-	-	-	31 000
		Wartość bazowa	0																	
4.2	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe																			
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 12: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (R.53.2.3)	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 13: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową (R.53.2.2)	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
4.3		Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii																				
Wskaźniki produktu																						
Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	-	8	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 15: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 16: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych <i>(P.42.1.1; P.42.1.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 17: Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru <i>(P.39.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 18: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego <i>(P.40.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźnik 19: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biomasy i biogazu <i>(P.41.1.5)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																			
Wskaźniki rezultatu																						
Wskaźnik 20: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych <i>(P.39.1.3; P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5; P.43.1.4; P.43.1.5)</i>	MW	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,85	-	-	-	-	3,4	-	-	4,25	-	-	-	-	-
		Wartość bazowa	0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
4.4		Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 21: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 22: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu <i>(R.51.1.1)</i>	ha	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	1,52	-	-	-	-	1,9
		Wartość bazowa	0																	

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	20	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	41	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	8	-	-	10	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	-	0	0	0	8	10	16	24	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	18	-	-	22	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	14	14	46	56	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	18	-	-	22	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
- szpitale i kliniki	szt.	Realizacja	-	0	0	0	14	14	15	15	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	11	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 5: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	126	196	364	383	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	-	9	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	6	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem ¹	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6 144	7 634	7 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1450	-	-	-	-	2 320	-	-	2 900	-	-	-
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury (R.75.1.2)	osoby ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1450		-		-		2 320		-		2 900	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: (R.75.1.1)	osoby ²	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa	0																	
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	12 879	11 875	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 10: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/ zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R.76.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	17 893	89 979	195 353	236 740	286 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		4 600		-		-		13 600		-		17 000	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																				
5.1		Wsparcie infrastruktury edukacyjnej																		
5.1.1		Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	4	9	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	7	17	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P.75.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	3	7	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki <i>(P.75.2.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6 144	7 634	7 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1 450		-		-		2 320		-		2 900	
		Wartość bazowa	0																	
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury <i>(R.75.1.2)</i>	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	5 284	6 774	6 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1 450		-		-		2 320		-		2 900	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: <i>(R.75.1.1)</i>	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	4 082	4 315	6 511	6 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	
5.1.2		Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	9	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	23	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		5		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych <i>(P.75.1.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	7	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		4		-		6	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: <i>(R.75.1.1)</i>	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	0	6 368	5364	5364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	6 368	5364	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		0		-		-		800		-		1 000	
		Wartość bazowa		0																	
5.2		Rozwój bazy medycznej w regionie																			
5.2.1		Stacjonarna opieka medyczna																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja		-	0	0	0	8	10	12	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		2		-		-		6		-		7	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Realizacja		-	0	0	0	14	14	15	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		3		-		-		9		-		11	
		Wartość bazowa		0																	
- szpitale i kliniki	szt.	Realizacja		-	0	0	0	14	14	15	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		3		-		-		9		-		11	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 13: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (P.76.1.2)	szt.	Realizacja		-	0	0	0	0	0	0	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźnik 14: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja		-	0	0	0	126	196	255	255	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		1		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa		0																	
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R.76.2.1)	szt./rok	Realizacja		-	0	0	0	17 893	89 979	59 813	76 313	76 313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa		-		-		-		3 600		-		-		9 600		-		12 000	
		Wartość bazowa		0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
5.2.2		Ambulatoryjna opieka medyczna																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	4	11	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	15
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	31	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	11
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia (P.76.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 19: Liczba zakupionego sprzętu medycznego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	109	128	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów (R.76.2.1)	szt./rok	Realizacja	-	0	0	0	0	0	135 540	160 427	210 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-	-	5 000
		Wartość bazowa	0																		
5.3		Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	6
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 22: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem ²	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 23: Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P.58.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		2		-		3	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 24: Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (P.59.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 25: Liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji (P.58.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	2	3	36	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		1	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 26: Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów (P.58.2.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	1	2	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 27: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem (R.58.1.1)	osoby/rok	Realizacja	-	0	0	0	0	56 420	65 120	195 683	296 283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		19 000		-		-		76 000		-		95 000	
		Wartość bazowa	0																	

¹ Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renegotjacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

² Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędu redakcyjnego w dokumencie programowym.

* Wartości wskaźników zostaną przeszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 6 „Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej																				
Wskaźniki produktu																				
Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		6		-		8	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		2		-		-		3		-		4	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym ¹ : <i>(P.61.1.2)</i>	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		0,024		-		-		0,15		-		0,191	
		Wartość bazowa	0																	
miejskich	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		0,01		-		-		0,1		-		0,122	
		Wartość bazowa	0																	
zdegradowanych	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		0,014		-		-		0,05		-		0,069	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych <i>(R.100)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Wskaźniki na poziomie działań / poddziałań																					
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich																				
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 1:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba zrewitalizowanych obszarów <i>(P.61.1.1)</i>		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	8						
Wartość bazowa		0																			
Wskaźnik 2:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	8						
Wartość bazowa		0																			
Wskaźnik 3:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2						
Wartość bazowa		0																			
Wskaźnik 4:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2						
Wartość bazowa		0																			
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 5:	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu <i>(P.61.1.2)</i>		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	0,1	-	0,122						
Wartość bazowa		0																			
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych																				
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 6:	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2						
Wartość bazowa		0																			

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 7: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		1		-		-		1		-		2	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźniki rezultatu																				
Wskaźnik 8: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		0,014		-		-		0,05		-		0,069	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 9: Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych (R.100)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		*		-		-		*		-		*	
		Wartość bazowa	0																	

* Wartości wskaźników zostaną przeszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Postęp fizyczny Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

Wskaźniki na poziomie osi priorytetowej

Wskaźniki produktu

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
		Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	105 ¹	-	-	-	-	-	-	
Wartość bazowa	0																				
- kobiety,	szt. (EPC) ¹	Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	78 ¹	-	-	-	-	-	78
		Wartość bazowa	0																		
- mężczyźni	szt. (EPC) ¹	Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	27 ¹	-	-	-	-	-	27
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (P.85.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-	-	-	232 ¹	-	-	-	-	-	232
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów (P.85.1.2)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	400	-	-	-	-	-	500
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów (P.86.1.1)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	63
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	3307	5993	5993	7 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	-	-	-	14 000
		Wartość bazowa	0																		

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			półroczne		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		5 100		-		-		20 400		-		25 500	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość docelowa	-		-		-		36 000		-		-		144 000		-		180 000	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 8: Odsetek złożonych wniosków poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	-	0	0	0	0	76,6	76,9	76,9	72	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		80		-		-		80		-		80	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki na poziomie kategorii

Kat 85		Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola																		
Wskaźniki produktu																				
Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	90	90	109	109	117,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		105		-		-		105		-		105	
		Wartość bazowa	0																	
- kobiety,	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	70	70	89	89	95,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		78		-		-		78		-		78	
		Wartość bazowa	0																	
- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	-	0	0	0	20	20	20	20	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		27		-		-		27		-		27	
		Wartość bazowa	0																	
Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) (P.85.1.3)	szt.	Realizacja	-	0	0	0	85	85	99	99	110	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-		-		-		232		-		-		232		-		232	
		Wartość bazowa	0																	

Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		
		półroczne	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	
Kat 86		Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja																			
Wskaźniki produktu																					
Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów <i>(P.85.1.2)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	151	151	254	254	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	400	-	-	500	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów <i>(P.86.1.1)</i>	szt.	Realizacja	-	0	0	0	17	17	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-	50	-	-	63	-	-	-	-	-	
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźniki rezultatu																					
Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	3 307	5993	5993	7727	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	-	14 000	-	-	-	-		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	-	0	0	0	0	16 622	40 522	40 522	57 397	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5 100	-	-	20 400	-	-	25 500	-	-	-	-		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szt.	Realizacja	-	0	0	0	0	201 547	488 084	488 084	754 416	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36 000	-	-	144 000	-	-	180 000	-	-	-	-		
		Wartość bazowa	0																		
Wskaźnik 8: Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	-	0	0	0	0	76,6	76,9	76,9	72	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	-	-		
		Wartość bazowa	0																		

¹ Wykazane wartości zostały skorygowane w *Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*. Będą przedmiotem renegotjacji Programu.

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2011 r.

Oś priorytetowa		Złożone wnioski o dofinansowanie/ramowe plany działań					Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie						
		Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)			Liczba		Wartość od uruchomienia programu (PLN)				% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13
		w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	wnioskowanego dofinansowania	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia programu	wydatków ogółem	wydatków kwalifikowalnych	dofinansowania ze środków publicznych	dofinansowania ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	12	1 016	2 155 155 750,87	1 787 247 879,62	997 358 712,82	20	646	1 512 769 156,41	1 250 312 094,73	690 030 084,73	609 647 900,69	96,47%
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	0	25	124 960 709,72	124 523 220,05	105 990 522,61	0	24	123 539 573,37	122 954 770,37	102 273 937,18	102 273 937,18	99,80%
3	Oś priorytetowa - Transport	0	116	761 315 683,47	742 574 282,40	594 642 328,71	1	96	572 767 254,68	549 289 296,92	443 047 481,88	443 047 481,88	99,77%
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	3	99	521 005 671,06	446 320 638,07	301 091 207,47	0	58	316 268 759,37	252 356 037,80	168 869 206,83	167 627 596,61	98,14%
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	2	124	367 435 709,37	343 084 555,76	233 809 505,15	5	103	276 849 295,20	254 955 958,77	171 576 279,14	171 576 279,14	100,45%
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	28	56	291 764 560,11	264 004 996,24	192 116 439,64	18	36	189 934 147,54	176 582 207,96	128 335 312,66	128 031 694,38	93,70%
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	2	10	52 879 761,71	52 879 761,71	44 947 797,45	0	8	41 442 687,78	41 442 687,78	35 226 284,60	35 226 284,60	68,75%
OGÓŁEM:		47	1 446	4 274 517 846,31	3 760 635 333,85	2 469 956 513,85	44	971	3 033 570 874,35	2 647 893 054,33	1 739 358 587,02	1 657 431 174,48	97,04%

UWAGI:

- Oś priorytetowa 1, kolumna "liczba umów podpisanych w okresie sprawozdawczym" - nie uwzględniono umowy nr RPOP.01.01.02-16-240/09-01, którą podpisano w czerwcu 2010 r. Umowa ta została w okresie sprawozdawczym omyłkowo usunięta z systemu KSI (SIMIK 07-13) i ponownie wprowadzona w kwietniu 2011 r.
- Oś priorytetowa 3, kolumny od 13 do 16 "wydatki we wnioskach o płatność" - system Oracle Discoverer nie pomniejszył ww. wartości o kwotę odzyskaną wykazaną w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków przekazanych do IPOC (dotyczy wniosku o płatność RPOP.03.01.02-16-009/08-04, kwota wydatków kwalifikowalnych 1 618,86 PLN, w tym wkład UE 1 376,03 PLN).

Tabela 1. Stan wdrażania programu operacyjnego według osi priorytetowych na dzień 30 czerwca 2011 r.

Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia programu (PLN)					Oś priorytetowa
ogółem	wydatki kwalifikowalne	dofinansowanie ze środków publicznych	dofinansowanie ze śr.publ. w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13	
13	14	15	16	17	18
722 078 672,31	596 818 937,21	343 699 570,60	309 130 881,08	48,92%	1
14 669 135,46	14 420 555,50	12 191 609,81	12 191 609,81	11,90%	2
381 690 476,83	372 444 869,08	294 055 141,57	294 055 141,57	66,22%	3
130 815 154,59	107 423 583,77	81 133 575,02	81 133 575,02	47,50%	4
209 528 072,51	192 271 898,73	126 211 422,15	126 211 422,15	73,89%	5
40 048 843,09	38 811 615,39	24 719 262,28	24 719 262,28	18,09%	6
31 342 883,82	31 184 489,26	26 506 814,94	26 506 814,94	51,73%	7
1 530 173 238,61	1 353 375 948,94	908 517 396,37	873 948 706,85	51,17%	OGÓŁEM:

Tabela 3. Źródła, z których sfinansowane zostały wydatki kwalifikowalne poniesione od uruchomienia programu (w PLN)

Załącznik nr II

Oś priorytetowa	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne	Środki z pożyczek EBI	Procentowy udział wkładu funduszy
		Ogółem	Środki wspólnotowe				Środki publiczne krajowe							
			Ogółem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Fundusz Spójności	Ogółem	Budżet państwa	Jednostki samorządu terytorialnego	Inne				
0	1=2+11	2=3+7	3=4+5+6	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10	11	12	13=(3/2)*100	
1 Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	596 884 806,40	405 371 854,94	309 130 881,08	309 130 881,08	0,00	0,00	96 240 973,86	34 602 373,77	58 444 581,30	3 194 018,79	191 512 951,46	0,00	76,26%	
2 Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	14 420 555,50	14 420 555,50	12 191 609,81	12 191 609,81	0,00	0,00	2 228 945,69	0,00	885 558,33	1 343 387,36	0,00	0,00	84,54%	
3 Oś priorytetowa - Transport	372 444 626,25	372 444 626,25	294 055 141,57	294 055 141,57	0,00	0,00	78 389 484,68	0,00	78 387 928,07	1 556,61	0,00	0,00	78,95%	
4 Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	107 423 583,77	107 423 583,77	81 133 575,02	81 133 575,02	0,00	0,00	26 290 008,75	0,00	23 553 752,48	2 736 256,27	0,00	0,00	75,53%	
5 Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	192 271 898,73	192 271 898,73	126 211 422,15	126 211 422,15	0,00	0,00	66 060 476,58	0,00	47 200 793,21	18 859 683,37	0,00	3 930 497,07	65,64%	
6 Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	38 811 615,39	38 811 615,39	24 719 262,28	24 719 262,28	0,00	0,00	14 092 353,11	0,00	9 731 547,94	4 360 805,17	0,00	0,00	63,69%	
7 Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	31 189 431,53	31 189 431,53	26 506 814,94	26 506 814,94	0,00	0,00	4 682 616,59	0,00	4 682 616,59	0,00	0,00	0,00	84,99%	
OGÓŁEM:	1 353 446 517,57	1 161 933 566,11	873 948 706,85	873 948 706,85	0,00	0,00	287 984 859,26	34 602 373,77	222 886 777,92	30 495 707,57	191 512 951,46	3 930 497,07	75,22%	

Wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy Tabelą 1 i 3:

1. Rozbieżności w kolumnach dot. budżetu państwa, budżetu JST oraz środków prywatnych w Osiach priorytetowych 1 i 7 wynikają z nieskorygowania wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. części dotyczącej źródeł finansowania we wnioskach płatność. Dotyczy to wniosków o płatność dla których trwa (Oś 1) lub został zakończony (Oś 7) proces odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych. Ww. sytuacja dot. wniosków o płatność o numerach: RPOP.01.01.02-16-183/09-01, RPOP.01.01.02-16-250/09-01, RPOP.01.03.02-16-129/08-03, RPOP.01.03.02-16-133/08-02, RPOP.01.04.01-16-015/08-06, RPOP.01.04.01-16-041/08-01, RPOP.01.04.01-16-080/09-01, RPOP.07.01.00-16-001/09-01, RPOP.07.01.00-16-001/09-02, RPOP.07.01.00-16-001/09-03, RPOP.07.01.00-16-001/09-04, RPOP.07.01.00-16-001/09-05, RPOP.07.01.00-16-001/09-06, RPOP.07.01.00-16-001/09-07, RPOP.07.01.00-16-001/09-09, RPOP.07.01.00-16-001/09-10, RPOP.07.01.00-16-001/09-11.

2. Ponadto rozbieżności w kolumnie dot. środków prywatnych w ramach Osi priorytetowej 1 wynikają z nieuzupełnienia w okresie sprawozdawczym podstawowych informacji o zwrocie w karcie informacyjnej zwrotu dla wniosku o płatność o numerze: RPOP.01.03.02-16-008/09-01-K01.

3. Rozbieżności w Osi priorytetowej 3 wynikają z faktu, iż system Oracle Discoverer pomniejsza budżet JST w Tabeli 3 o kwotę odzyskaną wykazaną w Poświadczeniach i deklaracjach przekazanych do IPOC (dotyczy wniosku o płatność RPOP.03.01.02-16-009/08-04, kwota 242,83 PLN), natomiast nie uwzględniła pomniejszenia w Tabeli 1 - kolumna 14 *Wydatki kwalifikowalne*.

Dodatkowe uwagi:

1. System Oracle Discoverer nie uwzględniła w Tabelach 1 i 3 pomniejszenia wkładu UE wykazanego jako kwota odzyskana w Poświadczeniach i deklaracjach wydatków przekazanych do IPOC (dotyczy wniosku o płatność RPOP.03.01.02-16-009/08-04, kwota 1 376,03 PLN).

Tabela 4. Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE oraz płatności okresowe zrealizowane przez KE

Oś priorytetowa		Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (EUR)		Płatności okresowe KE (EUR)
		Ogółem	Wkład UE	
0		1	2	3
1	Oś priorytetowa - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	92 342 837,87		
2	Oś priorytetowa - Społeczeństwo informacyjne	2 623 091,80		
3	Oś priorytetowa - Transport	82 667 719,69		
4	Oś priorytetowa - Ochrona środowiska	23 998 395,91		
5	Oś priorytetowa - Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	44 427 976,66		
6	Oś priorytetowa - Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	9 537 637,79		
7	Oś priorytetowa - Pomoc techniczna	7 219 478,05		
OGÓŁEM:		262 817 137,77	223 394 567,07	220 578 452,15

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik nr III

Działanie (nr i nazwa)	Program pomocowy/ inna podstawa udzielenia pomocy	Liczba projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wielkość przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis				
		wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	kwota ogółem	dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom UE		dofinansowanie ze środków publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym	
							kwota	%	kwota	%
1	2	3	4	5	6	7=8+10	8	9=8/7	10	11=10/7
1.1	Rozwój przedsiębiorczości	347	290	243 663 738,05	132 904 344,45	68 657 588,11	58 375 192,93	85,02%	10 282 395,18	14,98%
1.3	Innowacje, badania, rozwój technologiczny	140	94	383 224 577,43	161 859 574,36	85 740 999,91	72 888 080,53	85,01%	12 852 919,38	14,99%
1.4	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej	124	86	428 471 290,24	157 538 747,29	79 421 938,11	68 590 455,40	86,36%	10 831 482,71	13,64%
2.1	Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
3.2	Transport publiczny	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.1	Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
4.3	Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	4	0	17 315 167,90	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
6.1	Rewitalizacja obszarów miejskich	1	0	584 832,43	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
6.2	Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	1	0	4 961 332,66	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
OGÓLEM:		617	470	1 078 220 938,71	452 302 666,10	233 820 526,13	199 853 728,86	85,47%	33 966 797,27	14,53%

UWAGI:

1) W działaniu 1.1 w Tabeli 3 nie wykazano umowy RPOF.01.01.02-16-259/10-00, wynika to z faktu nie wykazania pomocy publicznej w umowie wpisanej w KSI SIMIK 07-13.

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy

Załącznik nr III

Liczba projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Wartość projektów MŚP objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis		Udział pomocy dla MŚP w przekazanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis								Działanie
wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	wg podpisanych umów / wydanych decyzji	wg zrealizowanych wniosków o płatność	ogółem MŚP		w tym według wielkości przedsiębiorstwa						
				kwota	%	mikro		małe		średnie		
						kwota	%	kwota	%	kwota	%	
12	13	14	15	16=18+20+22	17=18/7	18	19=18/16	20	21=20/16	22	23=22/16	
345	288	213 979 067,92	130 552 875,74	67 218 566,25	97,90%	67 218 566,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.1
134	89	375 174 813,15	155 897 232,43	82 759 828,95	96,52%	13 162 291,36	15,90%	39 915 814,14	48,23%	29 681 723,45	35,86%	1.3
111	76	291 571 356,45	100 855 478,87	53 152 116,29	66,92%	33 382 469,01	62,81%	12 869 913,74	24,21%	6 899 733,54	12,98%	1.4
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	2.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	3.2
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	4.3
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.1
0	0	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	6.2
590	453	880 725 237,52	387 305 587,04	203 130 511,49	86,87%	113 763 326,62	56,01%	52 785 727,88	25,99%	36 581 456,99	18,01%	

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007 PL 161 PO 012
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	I/2011/RPO/16
Okres sprawozdawczy:	od: (01/01/2011) do: (30/06/2011)

Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2007 - 2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011 w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Punkty Informacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym obsługę beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie udzielania informacji o RPO WO 2007-2013 realizowała Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim na lata 2007-2013. Struktura Sieci obejmuje 12 punktów informacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główny Punkt Informacyjny w Opolu dla beneficjentów prowadzony przez IZ RPO WO 2007-2013, • Lokalny Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez IP II stopnia, • 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych w 10 miastach powiatowych na bazie istniejących i funkcjonujących przy Starostwach powiatowych Centrów Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG). <p>W okresie sprawozdawczym punkty informacyjne udzielały pełnej i kompleksowej informacji o Programie drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie konsultacji bezpośrednich. Ponadto, punkty prowadziły bieżącą wymianę informacji w ramach Sieci oraz współpracowały z organizacjami pozarządowymi z obszaru województwa (wymiana informacji, newslettery, spotkania robocze). Działania koncentrowały się wokół wprowadzenia usługi w zakresie konsultacji wniosków o płatność w ramach RPO WO 2007-2013 (spotkania, konsultacje, wymiana doświadczeń).</p>

2.	Broszura „Instytucje poręczeniowe i pożyczkowe w ramach RPO WO 2007-2013”	Na przełomie maja i czerwca 2011 r. IP II stopnia RPO WO 2007-2013 opracowała broszurę dot. instytucji poręczeniowych i pożyczkowych dofinansowanych w ramach Programu. Broszura ma na celu wskazanie przedsiębiorcom alternatywnych źródeł pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania realizowanych projektów. Została przygotowana wspólnie z instytucjami merytorycznie odpowiedzialnymi za udzielanie pożyczek oraz poręczeń i stanowi dla potencjalnych beneficjentów cenne źródło informacji o najważniejszych elementach wiążących się z pozyskaniem środków w ramach funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Broszura zostanie wydrukowana w III kwartale 2011 r.
3.	Spotkania informacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 połączone z podpisaniem umów w ramach Programu. Spotkania stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i opinii nt. realizacji projektów RPO WO 2007 – 2013 w danych obszarach wsparcia. Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania robocze z beneficjentami Programu mające na celu weryfikację stanu wdrażania projektów RPO WO 2007-2013 i zachęcające do efektywnego rozliczania projektów oraz konsultacje nowych zapisów Programu.</p> <p>IP II stopnia RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania informacyjne skierowane do potencjalnych beneficjentów 1 Osi priorytetowej RPO WO 2007-2013 tj. głównie przedsiębiorców. Zakres merytoryczny spotkań dotyczył potencjalnych (praktycznych) możliwości wsparcia realizowanych inwestycji z RPO WO 2007 – 2013, możliwości pozyskania środków z funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych, najważniejszych zasad determinujących prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zasad kontraktacji, rozliczania i kontroli projektów. Dodatkowo, w związku ze zmianą zapisów w zakresie stosowania Zamówień Publicznych przeprowadzono cykl 11 spotkań z beneficjentami rozliczającymi projekty w zakresie omówienia zmian i ich wpływu na proces przygotowywania dokumentów do rozliczania.</p>
4.	Cykl informacyjny w mediach	<p>Od kwietnia do czerwca 2011 r. - na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013 - <i>TVP Opole, Radio Opole, Radio Plus</i> emitowały cykl informacyjny, który obejmował następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cykl informacyjny w TVP Opole (czas trwania: 20.04-07.12.2011) – w ramach cyklu emitowane były magazyny i debaty dot. RPO WO 2007-2013. Celem cyklu było zaprezentowanie w przystępny sposób dotychczasowych doświadczeń beneficjentów RPO WO 2007-2013 w realizacji projektów oraz zachęcenie i zmotywowanie potencjalnych beneficjentów do startowania w kolejnych konkursach. Cykl poprzez prezentację dobrych praktyk oraz sprawdzonych sposobów pozyskiwania funduszy unijnych przybliżył beneficjentom, potencjalnym beneficjentom oraz opinii publicznej warunki ubiegania się o dofinansowanie i zasady realizacji projektów w ramach w/w programów. W okresie sprawozdawczym wyemitowano materiały dot. turystyki, kultury, rewitalizacji, transportu, ochrony środowiska i ochrony zdrowia.

5.	Cykl informacyjny w mediach – c.d.	<ul style="list-style-type: none"> • Cykl informacyjny w Radio Opole (czas trwania: 20.04-17.08.2011) oraz w Radio Plus (czas trwania: 01.04-23.07.2011) – w ramach cyklu emitowane były audycje i debaty dot. RPO WO 2007-2013. Celem cyklu było zaprezentowanie w przystępny sposób dotychczasowych doświadczeń beneficjentów RPO WO 2007-2013, w tym korzyści i efektów, jakie przynosi realizacja unijnych projektów. W okresie sprawozdawczym wyemitowano materiały dot. przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego, edukacji, nauki, kultury, transportu, ochrony środowiska. <p>Ponadto, w Radiu Plus wyemitowano audycje, które szczególnie podkreślały włączenie polityk horyzontalnych w realizację programu tj. audycje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Być kobietą - Opolanka, Polka, Europejka. Opolanka korzysta z odnowy biologicznej”, gdzie zaprezentowano przedsiębiorcze kobiety, które uzyskały dofinansowanie na rozwój firm z branży ochrony zdrowia oraz medycyny estetycznej. 2. „Mrowisko - Rozwój infrastruktury informatycznej i nowoczesnych technologii IT na opolskich uczelniach”, w której pokazano jak młodzież studencka korzysta z projektów informatycznych dofinansowanych w ramach programu.
Promocja		
6.	Gala podsumowująca wyniki konkursu KRW w ramach m.in. RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim „Opolskie naj...!”	<p>25 lutego 2011 r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała Galę podsumowującą sukces województwa opolskiego w konkursie MRR o Krajową Rezerwę Wykonania m.in. w ramach RPO WO 2007-2013. Podczas uroczystości zebrano doświadczenia z dwuletniego okresu realizacji programu, w szczególności podsumowano podziękowano beneficjentom za wysiłek włożony w sprawną realizację programu. Podczas gali minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska wręczyła marszałkowi Józefowi Sebeście symboliczny czek na kwotę nagrody, którą otrzymała Opolszczyzna. W trakcie gali wyróżniono również beneficjentów, którzy w największym stopniu przyczynili się do wygranej w ramach RPO WO 2007-2013. Nagrody przyznano w kategoriach nawiązujących do hasła gali: „Opolskie naj...!” m.in.: Miasto Opole za „najwyższą wartość umowy”, Politechnika Opolska za „największą liczbę zrealizowanych projektów”, Gmina Kluczbork za „największą wyremontowaną przestrzeń rekreacyjno-sportową” czy Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu za „największą liczbę pożyczek udzielonych mikro-przedsiębiorcom”. W uroczystości wzięło udział około 450 osób. Gali towarzyszyła wystawa plasz z najciekawszymi projektami zrealizowanymi w ramach Programu. Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 zleciła TVP Opole przygotowanie reportażu z gali, który został wyemitowany w telewizji regionalnej na początku marca 2011 r. (3 emisje).</p> <p>W <i>Załączniku V</i> zaprezentowano: <i>fotoreportaż i notatkę prasową z Gali</i>.</p>

7.	Konferencja ewaluacyjna	<p>24 marca 2011 w sali konferencyjnej UMWO Jednostka Ewaluacyjna IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała II Opolską Konferencję Ewaluacyjną. Powyższe przedsięwzięcie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie badań ewaluacyjnych i budowy kultury ewaluacyjnej w regionie, a także omówienie przyszłych działań ewaluacyjnych, będących szansą na poznanie potrzeb i oczekiwań dot. przyszłych badań i stojących za nimi pytań. W konferencji wzięło udział ok. 160 osób. Przedsięwzięcie zgromadziło duże grono zainteresowanych samorządowców, naukowców i przedstawicieli biznesu zarówno z Opolszczyzny jak i z całej Polski. Na konferencji gościli eksperci w dziedzinie rozwoju regionalnego oraz ewaluacji. Spotkanie otworzył marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta. Prelegentami konferencji byli m.in.: prof. Grzegorz Gorzelak i prof. Marek Kozak z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorzy UMWO. Druga część konferencji, w formie panelu dyskusyjnego, poświęcona została roli badań ewaluacyjnych w kluczowych obszarach rozwoju regionu. Panel dyskusyjny moderowany był przez dr Witolda Potworę, prorektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. W dyskusji uczestniczyli: w zakresie rozwoju lokalnego – w roli eksperta Jarosław Kielar, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego, burmistrz Kluczborka; w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności – dr Bogdan Tomaszek, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.; rynku pracy – Jacek Suski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu; nauki i edukacji – prof. Krzysztof Malik, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Opolskiej; sfery organizacji pozarządowych – Tomasz Kosmała, prezes Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.</p>
8.	Konkurs „Opolska Marka”	<p>7 kwietnia 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała konkurs „Opolska marka” na najlepsze firmy regionalne oraz produkty wytwarzane w województwie opolskim, w tym dofinansowane ze środków RPO WO 2007-2013 oraz gałę podsumowującą konkurs. Nagrody otrzymali m.in. beneficjenci RPO WO 2007-2013, których inwestycje w usługi i produkty uzyskały dofinansowanie w ramach programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniwersytet Opolski – w kategorii Usługi (usługi edukacyjne i badawcze realizowane przez jednostkę), • Nowoczesne Technologie Produkcji S.A. z Kędzierzyna-Koźla – w kategorii Przedsiębiorstwo, • Chespa Sp. z o.o. z Krapkowic – w kategorii Eksport (farby fleksograficzne wodne i alkoholowe), • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział w Opolu – w kategorii Usługi specjalistyczne (badania prowadzone przez Laboratorium Pomiarów Przemysłowych), • Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc z Opola – w kategorii Produkt specjalistyczny (układ wybuchowego platerowania blach).

9.	Współorganizacja i udział w imprezach, targach i konferencjach	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2070-2013 współorganizowała i brała udział w imprezach, targach i konferencjach organizowanych m.in. przez partnerów społeczno-gospodarczych i media, obejmujących udział w takich przedsięwzięciach jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionalne i lokalne Targi Pracy – marzec-maj 2011 r.; • IV Forum Funduszy Europejskich - maj 2011 r.
10.	Film promocyjny dot. wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WO 2007-2013	<p>W kwietniu 2011 r. IP II stopnia RPO WO 2007-2013 wydała film promocyjny dotyczący wsparcia przedsiębiorczości w ramach Programu. Celem filmu było zaprezentowanie skali inwestycji w przedsiębiorstwach, ich różnorodnego charakteru oraz pozytywnych zmian w otoczeniu, jakie zachodzą w regionie dzięki dofinansowaniu ze środków RPO WO 2007 – 2013. Film w dynamiczny sposób prezentował m.in. procesy technologiczne wdrażane dzięki środkom unijnym.</p> <p>Film został m.in. zaprezentowany podczas IV Forum Funduszy Europejskich oraz umieszczony na stronie IP II. Dodatkowo film został wydany na płytach DVD i jest dystrybuowany podczas spotkań, konferencji i targów dla przedsiębiorców w regionie.</p>
11.	Konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych	<p>W okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała konkurs dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań informacyjnych i promocyjnych Programu. Do konkursu zgłosiło się 6 podmiotów. Wartość projektów przekroczyła dostępną alokację na konkurs o ok. 30 tys. zł. Komisja Konkursowa zarekomendowała do dofinansowania wszystkie projekty. Zarząd Województwa Opolskiego podpisał umowę z 5 organizacjami (1 organizacja wycofała ofertę). Działania wybrane do dofinansowania obejmują szeroką gamę działań promocyjnych, skierowanych do dzieci i młodzieży m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • konkursy np.: 2 konkursy plastyczne, konkurs z zagadkami „Eurodetektyw”, • akcje promocyjne: np. happening plastyczny, quizy wiedzy, audycje radiowe, • warsztaty np. pisanie innowacyjnych projektów przez dzieci i młodzież, • spotkań i prelekcji nt. programu. <p>W okresie sprawozdawczym rozpoczęła się realizacja projektu Stowarzyszenia Artsfera w Opolu, pozostałe inicjatywy będą zrealizowane w II połowie 2011 r.</p>

12.	Kampania promocyjna RPO WO 2007-2013	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, IZ RPO WO 2007-2013 od marca do maja 2011 r. zrealizowała kampanię promocyjną programu, która objęła emisję spotów reklamowych w TVP Opole, emisję spotów radiowych w trzech stacjach radiowych (m.in. Radio Opole, Radio Plus, Radio Park FM), emisję reklam prasowych w Nowej Trybunie Opolskiej i Gazecie Wyborczej – Opole oraz 7 tytułach prasy lokalnej. Ponadto, w ramach kampanii zrealizowano działania w Internecie, m.in. na stronach www.nto.opole.pl, www.opole.gazeta.pl, www.onet.pl; www.wp.pl, www.o2.pl, www.google.pl oraz utworzono fanpage programu na portalu Facebook. Kampania zakończyła się w maju 2011 r.</p> <p>Telewizyjne i radiowe spoty reklamowe, reklamy prasowe oraz wizualizacje outdooru zamieszczone zostały na stronie www.rpo.opolskie.pl w zakładce Informacja, promocja, szkolenia.</p> <p><i>W Załączniku V zaprezentowano: spot telewizyjny oraz spot radiowy z kampanii.</i></p>
13.	Kampania promocyjna I Osi Priorytetowej RPO WO 2007-2013	<p>Od kwietnia do czerwca 2011 r. IP II stopnia RPO WO 2007-2013 przeprowadziła kampanię promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie I Osi Priorytetowej. Kampania opierała się na przygotowaniu cyklu ponad 30 artykułów, które były zamieszczane we wskazanym okresie w gazetach powiatowych będących dwutygodnikami lub miesięcznikami. Przyjęta formuła pozwoliła rozpropagować wśród mieszkańców informację o zakresie wdrażanych na danym obszarze funduszy unijnych w ramach RPO WO 2007 – 2013. Koncepcja artykułów, przygotowywanych przez niezależnych dziennikarzy, pozwoliła zaprezentować przyjazną z punktu widzenia czytelnika formę, gwarantującą wiarygodność oraz przyjazny język. Gazety powiatowe w których zamieszczano artykuły to: 7 dni Tygodnik Lokalny, Tygodnik Krapkowicki, Nowa Gazeta Lokalna, Kulisy Powiatu Kluczbork – Olesno, Strzelec Opolski, Kurier Brzeski, Tygodnik Prudnicki.</p> <p><i>W Załączniku V zaprezentowano: przykładowe artykuły do prasy lokalnej w ramach kampanii.</i></p>
14.	Współpraca z mediami - Akcja letnia „Radio na szlaku”	<p>Od czerwca 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 brała udział w akcji letniej „Radio na szlaku”, współrealizowanej z Radiem Opole. Akcja promocyjna pn. „Radio na szlaku”, w części dot. RPO WO 2007-2013 swoim zasięgiem objęła całe województwo opolskie. Głównym celem akcji było promowanie atrakcji turystycznych regionu oraz najciekawszych inwestycji turystycznych i sportowo-rekreacyjnych dofinansowanych w ramach Programu. W szczególności prezentowano projekty uwzględniające politykę horyzontalną UE w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.</p>
15.	Materiały szkoleniowe i konferencyjne	<p>W lutym 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 w związku z realizacją gali podsumowującej wdrażanie sukces regionu w konkursie o Krajową Rezerwę Wykonania w ramach RPO WO 2007-2013 wydała 20 szklanych statuetek oraz dyplomy okolicznościowe. Na potrzeby gali wydano również ulotkę i plakaty z programem gali.</p>

16.	Gadżety promocyjne	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała gadżety promocyjne m.in. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, które dystrybuowane były podczas spotkań, szkoleń, konferencji, imprez i targów, w których IZ RPO WO 2007-2013 brała udział. Były to m.in.: układanki plastikowe, puzzle (ze zdjęciami projektów), ołówki, długopisy, zestawy piśmiennicze, kalendarze z aluminium na biurko, breloki, smycze, notesy (w tym ze zdjęciami projektów), kubki (w tym ze zdjęciami projektów), torby papierowe ze sznurkiem i z uchem wycinanym, teczki, bloczki (format A4).</p> <p>W ramach materiałów wykonano promocyjne gadżety świąteczne. Ponadto, wykonano wyroby szklane, zdobione ręcznie grafiką z regionalnym wzorem. Gadżety świąteczne rozdysponowano na spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO WO 2007 – 2010. Wyroby szklane rozdysponowano podczas gali, która miała miejsce 25 lutego 2011 r.</p>
Edukacja		
17.	Szkolenia specjalistyczne	<p>Od czerwca 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu w dwóch blokach tematycznych: I. Przygotowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 i II. Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013. Zrealizowane tematy szkoleń dotyczyły: Zarządzania projektem RPO WO 2007-2013, Przygotowanie i realizacji projektów partnerskich (partnerstwa JST oraz partnerstwa publiczno-prawne) w ramach RPO WO 2007-2013, Rozliczania projektów, w tym księgowania i kwalifikowalności kosztów oraz listy płac osób zatrudnionych w ramach projektu RPO WO 2007- 2013, jak również zamówień publicznych finansowanych ze środków RPO WO 2007-2013.</p>
18.	Szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających Fundusze Europejskie	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała szkolenia specjalistyczne przeznaczone dla pracowników IZ RPO WO 2007-2013. Szkolenia swą tematyką obejmowały m.in. zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, kwestie pomocy publicznej oraz kontroli w regionalnych programach operacyjnych.</p> <p>Pracownicy IP II stopnia uczestniczyli w licznych szkoleniach, których celem było poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją zadań różnych działów wdrażających RPO WO 2007 – 2013 m.in. zamówień publicznych, oceny oddziaływania na środowisko oraz prawa budowlanego.</p>
Internet		
19.	Strona internetowa IZ RPO WO 2007-2013	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stronę internetową www.rpo.opolskie.pl. Na stronie na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty w zakresie wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom przy przygotowaniu wniosku w ramach RPO WO 2007-2013, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Strona była systematycznie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.</p>

20.	Strona internetowa IP II stopnia RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IP II stopnia prowadziła i aktualizowała stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl w obszarze informacji i dokumentów programowych związanych z RPO WO 2007 – 2013.
21.	Newsletter RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła System Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich obejmujący dystrybucję informacji o RPO WO 2007-2013 w postaci newsletterów i newsletterów specjalnych. IZ RPO WO 2007-2013 wysyłała do subskrybentów newsletter dotyczący Programu, funkcjonujący jako samodzielna publikacja dotycząca RPO WO 2007-2013 (subskrypcja na stronie Programu). Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 po każdej istotnej informacji/ decyzji Zarządu Województwa Opolskiego, związanej z realizacją Programu, wysyłała do subskrybentów newsletter specjalny, niezwłocznie po uzyskaniu informacji/ otrzymaniu decyzji.
22.	Informator Europejski	W okresie sprawozdawczym w ramach Systemu Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich IZ RPO WO 2007 – 2013 publikowała Informator Europejski (tygodnik w wersji elektronicznej) zawierający informacje o aktualnościach oraz bieżących naborach m.in. w ramach RPO WO 2007 – 2013, najważniejszych wydarzeniach w realizacji programu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Informator rozsyłany był według listy subskrybentów newslettera RPO WO 2007 – 2013. W Załączniku V zaprezentowano przykładowy Informator: <i>Informator Europejski nr 11 (125)</i> .
23.	Mapa interaktywna projektów RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym trwały prace nad przygotowaniem wkładu do mapy interaktywnej projektów dofinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013. W związku z opóźnieniem projektu UMWO pt.: „Opolskie w Internecie”, którego mapa jest częścią uruchomienie mapy nastąpi w II połowie 2011 r. W I połowie br. przygotowano opisy projektów oraz zgromadzono zdjęcia oraz inne materiały, które będą stanowiły wkład merytoryczny do mapy.
Ewaluacja		
24.	Badania ewaluacyjne	W okresie sprawozdawczym były również wdrażane i monitorowane rekomendacje badań ewaluacyjnych, zrealizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013: <ul style="list-style-type: none"> • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim, • Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013, • Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.

Wymiana doświadczeń		
25.	Zespół ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015.	W okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba zorganizowania spotkania Zespołu ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła intensywną bieżącą wymianę informacji przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach Roczego planu działań oraz organizowała spotkania robocze związane z omówieniem szczegółowych zagadnień związanych z realizacją zadań w 2011 r.
26.	Grupa Sterująca ds. informacji i promocji	W okresie sprawozdawczym pracownicy IZ RPO WO 2007-2013 brali udział w spotkaniach oraz uczestniczył w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji.
27.	Spotkania członków Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013, która pełni rolę koordynatora Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim organizowała spotkania (11.02, 17.06) dla konsultantów Sieci oraz pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie Sieci dot. bieżącego funkcjonowania Sieci oraz wprowadzenia usprawnień w działalności sieci. Ponadto, prowadzona była bieżąca wymiana korespondencji oraz monitoring.

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar	Wskaźnik	Rok	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Półrocze	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba konferencji	Realizacja									8									
		Wartość docelowa									2/8									
		Wartość bazowa									0									
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba uczestników konferencji	Realizacja									1485									
		Wartość docelowa									240/600									
		Wartość bazowa									0									
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba innych przedsięwzięć promocyjnych	Realizacja									20									
		Wartość docelowa									7/10									
		Wartość bazowa									0									
Spotkania informacyjne	Liczba zrealizowanych spotkań informacyjnych	Realizacja									155									
		Wartość docelowa									40/200									
		Wartość bazowa									0									
Spotkania informacyjne	Liczba uczestników spotkań informacyjnych	Realizacja									4316									
		Wartość docelowa									700/6500									
		Wartość bazowa									0									

Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE	Realizacja							302								
		Wartość docelowa							50/280								
		Wartość bazowa	0														
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba uczestników szkoleń	Realizacja							1763								
		Wartość docelowa							400/2800								
		Wartość bazowa	0														
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE	Realizacja							209								
		Wartość docelowa							40/250								
		Wartość bazowa	0														
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Realizacja							4030								
		Wartość docelowa							500/7000								
		Wartość bazowa	0														
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba wydanych egzemplarzy biuletynu	Realizacja							21 300								
		Wartość docelowa							6000/40000								
		Wartość bazowa	0														

Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>Liczba numerów biuletynu</i>	Realizacja							13			
		Wartość docelowa							4/28			
		Wartość bazowa	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>Liczba wydanych egzemplarzy ulotek</i>	Realizacja							47 400			
		Wartość docelowa							10 000/ 80 000			
		Wartość bazowa	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>Liczba tytułów/rodzajów ulotek</i>	Realizacja							28			
		Wartość docelowa							8/30			
		Wartość bazowa	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>Liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych</i>	Realizacja							81 610			
		Wartość docelowa							32 000/ 10 000			
		Wartość bazowa	0									
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	<i>Liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych</i>	Realizacja							9			
		Wartość docelowa							8/8			
		Wartość bazowa	0									

Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)					
	Liczba punktów informacyjnych	Realizacja							12							
		Wartość docelowa							12/12							
		Wartość bazowa	0													
Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)					
	Liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne	Realizacja							9946							
		Wartość docelowa							2000/3000							
		Wartość bazowa	0													
Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)					
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną	Realizacja							20 653							
		Wartość docelowa							4500/ 10 000							
		Wartość bazowa	0													
Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)					
	Liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową	Realizacja							3622							
		Wartość docelowa							1500/5000							
		Wartość bazowa	0													
Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)					
	Liczba wejść na stronę internetową	Realizacja							710 444							
		Wartość docelowa							150 000/ 180 000							
		Wartość bazowa	0													

Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba subskrybentów newslettera	Realizacja							951								
		Wartość docelowa							850/300								
		Wartość bazowa	0														
Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba wysłanych newsletterów	Realizacja							296								
		Wartość docelowa							70/300								
		Wartość bazowa	0														
Współpraca z mediami	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba publikacji w mediach	Realizacja							208								
		Wartość docelowa							70/220								
		Wartość bazowa	0														
Współpraca z sememem	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Liczba opublikowanych w ramach kampanii ogłoszeń, magazynów/ audycji	Realizacja							643								
		Wartość docelowa							40/500								
		Wartość bazowa	0														
Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)						
	Ilość / liczba przygotowanych materiałów promocyjnych – gadżetów	Realizacja							33 581								
		Wartość docelowa							8 000/15 000								
		Wartość bazowa	0														

Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	
	Ilość przygotowanych materiałów biurowych i szkoleniowo- konferencyjnych	Realizacja							65 531			
		Wartość docelowa							12 000 /85 000			
		Wartość bazowa	0									
Komentarz	<p>1) Ze względu na długi czas trwania procedury zamówień publicznych w zakresie opracowania i wydania biuletynów RPO WO 2007-2013, która zakończyła się w lipcu 2011 r., termin realizacji działania w zakresie wydania 2 numerów biuletynów RPO WO 2007-2013 uległ przesunięciu na III kwartał 2011 r.</p> <p>2) Ze względu na organizację Gali podsumowującej wyniki konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania w ramach PRO WO 2007-2013 i PO KL, która miała miejsce w lutym 2011 r., IZ RPO WO 2007-2013 zrezygnowała z działania dot. emisji cyklu wkładek informacyjnych RPO WO 2007-2013 r.</p> <p>3) W związku z częstymi zmianami dokumentów w zakresie wdrażania programu, IZ RPO WO 2007-2013, zdecydowała o przesunięciu terminu emisji ulotek planowanych do wydania w I połowie 2011 r. (ryzyko szybkiej dezaktualizacji) na II półrocze 2011 r., w zamian intensyfikując działania informacyjne w ramach Punktów Informacyjnych i stron internetowych.</p> <p>4) W związku z przesunięciem terminów przygotowania tekstów do publikacji przez autorów, IZ RPO WO 2007-2013 przesunęła termin wydania publikacji podsumowującej raporty końcowe z badań ewaluacyjnych na II półrocze 2011 r.</p> <p>5) W związku z realizacją Gali podsumowującej wyniki konkursu o KRW w ramach PRO WO 2007-2013 i PO KL, na której nagrodzono najlepszych beneficjentów RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 zrezygnowała z działania dot. organizacji konkursu „Opolskie Euro 2011 r.”</p> <p>6) W związku z realizacją licznych ciekawych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych oraz organizacją Gali podsumowującej wyniki konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania w ramach PRO WO 2007-2013 i PO KL, IZ RPO WO 2007-2013 zrezygnowała z realizacji akcji promocyjnej „Projekt Unia”.</p> <p>7) W związku z realizacją kampanii promującej sukces województwa opolskiego w konkursie MRR o Krajową Rezerwę Wykonania (kampanię zrealizowano w lipcu 2011 r.), IZ RPO WO 2007-2013 zrezygnowała z realizacji akcji promocyjnej „Eurowizytówka”.</p> <p>8) Ze względu na uzasadnione ekonomicznie połączenie działań promocyjnych konkursu Europuzzle z konkursem „Moje Fundusze” IP II stopnia RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o przesunięciu konkursu „Europuzzle” na drugie półrocze 2011r.</p> <p>9) W związku z przesunięciem terminów realizacji zadań przez podwykonawców umów, IP II stopnia RPO WO 2007-2013 przesunęła terminy realizacji kampanii promocyjnej I Osi RPO WO 2007-2013 – planowany termin luty/maj 2011 r. – zrealizowano w terminie maj/czerwiec 2011 r.</p>											

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów Programu, zawierające nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE w Internecie pod adresem: www.rpo.opolskie.pl i www.ocrg.opolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 19 razy.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input checked="" type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Zgodnie z przyjętą tabelą wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)” w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. W ramach stałego i systematycznego pogłębiania specjalistycznej wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przez beneficjentów IZ RPO WO 2007-2013 organizuje dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu cykl szkoleń warsztatowych dot. wniosków o płatność RPO WO 2007-2013, których program będzie uwzględniał elementy ćwiczeń i warsztatów.
2. W trakcie realizacji cyklu informacyjnego RPO WO 2007-2013 pt. „Opolskie Euro-możliwości” w I połowie 2010r. w TVP Opole, Radiu Opole i Radiu Plus, położono nacisk na uproszczenie języka komunikowania, unikanie terminologii technicznej.

Uwzględniając przyjętą tabelę wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. *Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. W zakresie promocji polityk horyzontalnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013, uwzględniono aspekt polityk horyzontalnych w realizacji w/w działań tj. uwzględniono w/w polityki w działaniach medialnych m.in. w audycjach w Radiu Plus pt.: „Być kobietą - Opolanka, Polka, Europejka. Opolanka korzysta z odnowy biologicznej”, gdzie zaprezentowano przedsiębiorcze kobiety, które uzyskały dofinansowanie na rozwój firm z branży ochrony zdrowia oraz medycyny estetycznej oraz „Mrowisko - Rozwój infrastruktury informatycznej

i nowoczesnych technologii IT na opolskich uczelniach”, w której pokazano jak młodzież studencka korzysta z projektów informatycznych dofinansowanych w ramach programu. Ponadto, uwzględniano w SOPZ w ramach procedur zamówień publicznych zapisy dot. szczególnego uwzględnienia elementów polityk horyzontalnych w przygotowaniu koncepcji działań informacyjnych i promocyjnych, jak również dokonano zakupów tzw. gadżetów ekologicznych.

5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczego planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

Tak Nie Nie dotyczy

5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

Wprowadzenie zmian w *Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2011 w ramach RPO WO 2007-2013* wynikało głównie z bieżącej analizy postępów w działaniach informacyjno – promocyjnych, analizy informacji zwrotnej od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu oraz czasu trwania procedur formalno-prawnych po stronie podmiotów realizujących działania informacyjne i promocyjne RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z bieżącą analizą zaplanowano głównie:

- zmodyfikowanie harmonogramu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych (dostosowanie terminów realizacji poszczególnych działań do innych realizowanych przedsięwzięć),
- zmodyfikowanie formy i narzędzi wykorzystanych w realizacji poszczególnych działań (rozszerzenie zakresu prowadzonej przez IP II stopnia kampanii reklamowej),
- wprowadzenie dodatkowych działań promocyjnych („Gala podsumowująca wyniki konkursu o Krajową Rezerwę Wykonania w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL w województwie opolskim”),
- podjęcie współpracy przy realizacji nowych akcji informacyjnych i promocyjnych np. działania związane z przewodnictwem Polski w UE np. „Święta z prezydencją”.

5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

1. Analiza informacji zwrotnych od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013.
2. Aktualizacja bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WO 2007-2013 wynikających bezpośrednio z etapu i poziomu realizacji programu.
3. Wprowadzenie nowych działań informacyjnych i promocyjnych, związanych z sukcesem województwa opolskiego w konkursie MRR o Krajową Rezerwę Wykonania oraz działań związanych z promocją programu w kontekście Polskiego Przewodnictwa w UE.
4. Analiza bieżącego stanu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 i identyfikacja elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji ww. działań np.: procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych.

5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczego planu działań lub Planu komunikacji?

Tak Nie

5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Szczegółowa analiza systemu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym pozwoliła na zidentyfikowanie elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji ww. działań. Istotne zagrożenie stanowi niewystarczające dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do specyfiki działań informacyjnych i promocyjnych.

6. Informacje dodatkowe**I. Informacja nt. aktualizacji Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013.**

W listopadzie 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczny plan działań). 29 grudnia 2010 r. IZ zaktualizowała w/w dokument uchwałą nr 147/2010, przyjmując 2 wersję Roczno planu działań.

II. Cele i uwarunkowania realizacji działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 w 2010 r.

Zgodnie z koncepcją polityki komunikacyjnej w okresie sprawozdawczym działania informacyjne i promocyjne dostosowane zostały do zaawansowanego poziomu wdrażania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w związku z sytuacją gospodarczą, realizacja działań prowadzona była w sposób na tyle elastyczny, aby uwzględnić wymagania bieżącej sytuacji. Na tym etapie nadal ważne było budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania ogółu społeczności regionalnej i lokalnej dla instytucji wdrażających ww. Program, jednak punkt ciężkości prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przesunął się w kierunku dostarczenia informacji bardziej szczegółowej, działalności szkoleniowo-warsztatowej, a także ciągle podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników instytucji wdrażających, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec dużej ilości nowych regulacji prawnych oraz wątpliwości interpretacyjnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Prowadzone w okresie sprawozdawczym działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane były przy wykorzystaniu narzędzi określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu odpowiedniego elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych.

III. Współpraca i koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpośrednio odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i koordynację działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 ściśle współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przygotowywane przez IP II stopnia każdorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 współpracowała przy realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, m.in.:

- Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu,
- Fundacją Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,
- Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu,
- Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej,
- Stowarzyszeniem ARTSFERA w Opolu,
- Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”,

oraz organizacjami branżowymi i inkubatorami przedsiębiorczości działającymi w regionie, m.in.:

- Opolską Izbą Gospodarczą,
- Izbą Gospodarczą „Śląsk”,
- Izbą Rzemieślniczą w Opolu.

IV. Dodatkowe działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 publikowała ogłoszenia o naborach wniosków w prasie regionalnej, jak również współpracowała z mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Fakty Gospodarcze, Forbes) w opracowaniu materiałów informacyjnych.

Oprócz opisanych w poprzednich punktach sprawozdania działań informacyjno-promocyjnych, IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała w okresie sprawozdawczym spotkania dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu, jak również uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 występowali w roli prelegentów lub konsultantów, w tym m.in.:

- 1) XVII posiedzenie KMRPO WO 2007-2013- Opole, 14 lutego 2011 r.;*
- 2) XVIII posiedzenie KMRPO WO 2007-2013- Opole, 7 marca 2011 r.;*
- 3) Wizyta studyjna beneficjentów RPO WO 2007-2013 do Wrocławskiego Parku Technologicznego - Wrocław, 23 marca 2011 r.;*
- 4) Konferencja „Polska prezydencja w UE – szanse czy zagrożenia?” – Opole, 7-8 kwietnia 2011 r.;*
- 5) XIX posiedzenie KMRPO WO 2007-2013- Opole, 9 maja 2011 r.;*
- 6) Wyjazd studyjny do Brukseli dla beneficjentów RPO WO 2007-2013- 22/25 maja 2011 r.;*
- 7) XX posiedzenie KMRPO WO 2007-2013- Opole, 10 czerwca 2011 r.;*
- 8) Konferencja „Uwarunkowania polityki rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy” – Otmuchów, 13-14 czerwca 2011 r.*

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dystrybuowała materiały informacyjne i promocyjne do Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach województwa opolskiego oraz przekazywała w/w materiały do partnerów społecznych i gospodarczych.

Z kolei IP II stopnia RPO WO 2007-2013 realizowała zadania informacyjne polegające na uczestniczeniu w indywidualnych konsultacjach z potencjalnymi inwestorami pragnącymi zainwestować na terenie naszego województwa. Beneficjenci odwiedzający Centrum Obsługi Inwestora działające przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (IP II) byli m.in. zainteresowani możliwościami dofinansowania za pomocą środków unijnych planowanych przez nich inwestycji. Informacji tego typu udzielał im pracownik Działu Informacji Europejskiej (DIE). Konsultacje miały miejsce kilka razy w miesiącu.
